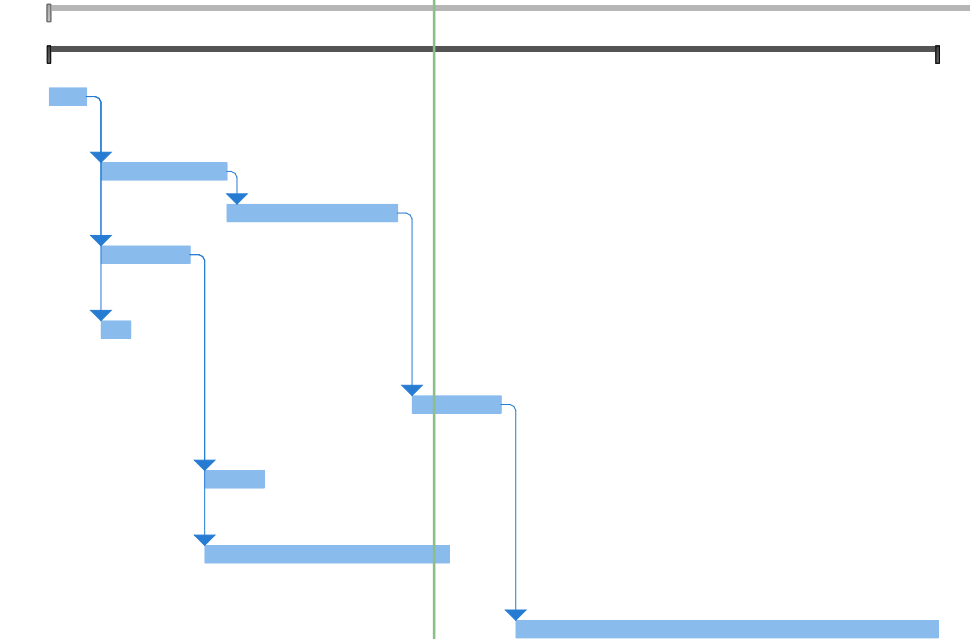


CN Europlan GmbH - Bauingenieure - Tragwerksplanung - Beratende Ingenieure VBI																																																																	
Nr.		Vorgangsmc	Task Name	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcen	Balken ausblend	Vorgangskalender																																																							
											Jul '26	29	06	13	20	27	Aug '26	03	10	17	24	Sep '26	31	07	14	21	28	Okt '26	05	12	19	26	Nov '26	02																															
0			512DE_BW055_RAHMENTERMINPLAN	269,44 d	06.07.2026	09.07.2027				Nein Ohne																																																							
1			PLANUNGSPHASE	86 d	06.07.2026	02.11.2026				Nein Ohne																																																							
2			Genehmigungsstatik - Arbeits- und Schutzgerüst	5 d	06.07.2026	10.07.2026				Nein Ohne																																																							
3			Positionsplan - Arbeits- und Schutzgerüst	13 d	13.07.2026	29.07.2026	2			Nein Ohne																																																							
4			Positionsplan - Brückeninstandsetzung	17 d	30.07.2026	21.08.2026	3			Nein Ohne																																																							
5			Prüfung und Freigabe der Genehmigungsstatik für das Arbeits- und Schutzgerüst	10 d	13.07.2026	24.07.2026	2			Nein Ohne																																																							
6			Leistungsverzeichniss - Arbeits- und Schutzgerüst	4 d	13.07.2026	16.07.2026	2			Nein Ohne																																																							
7			Prüfung und Freigabe der Genehmigungsstatik für die Instandsetzungsarbeiten	10 d	24.08.2026	04.09.2026	4			Nein Ohne																																																							
8			Leistungsverzeichniss - Instandsetzungsarbeiten	6 d	27.07.2026	03.08.2026	5			Nein Ohne																																																							
9			Ausschreibung und Vergabe - Arbeits- und Schutzgerüst	25 d	27.07.2026	28.08.2026	5			Nein Ohne																																																							
10			Ausschreibung und Vergabe - Brückeninstandsetzung	41 d	07.09.2026	02.11.2026	7			Nein Ohne																																																							
11			AUSFÜHRUNGSPHASE	139,44 d	04.01.2027	09.07.2027				Nein Ohne																																																							
12			Personenverkehr - Montage des ASG - Sperrpausen 21.02.2027-28.02.2027 - 7 Schichten jeweils ca. 23:00 Uhr – 05:00 Uhr	43,16 d	04.01.2027	28.02.2027				Nein Ohne																																																							
21			Güterverkehr - Montage des ASG - Sperrpausen 12.02.2027 von ca. 23:00 Uhr - 15.02.2027 bis ca. 05:00 Uhr (durchgehend)	27,53 d	14.01.2027	15.02.2027				Nein Ohne																																																							
27			Personenverkehr - Arbeiten an der Überbauoberseite - Maximal zulässige Ausführung vom 28.02.2027 bis 29.05.2027	56,63 d	18.02.2027	10.05.2027				Nein Ohne																																																							
49			Güterverkehr - Arbeiten an der Überbauoberseite -Maximal zulässige Ausführung vom 15.02.2027 bis 20.05.2027	62,72 d	16.02.2027	14.05.2027				Nein Ohne																																																							
61			Personenverkehr - Demontage des AGS - Sperrpausen 30.05.2027-06.06.2027 - 7 Schichten jeweils ca. 23:00 Uhr – 05:00 Uhr	5,38 d	28.05.2027	07.06.2027				Nein Ohne																																																							
66			Güterverkehr - Demontage des AGS - Sperrpausen 21.05.2027 von ca. 23:00 Uhr - 24.05.2027 bis ca. 05:00 Uhr (durchgehend)	8,13 d	20.05.2027	25.05.2027				Nein Ohne																																																							
71			Personenverkehr - Arbeiten an der Überbauunterseite und am Unterbau - Sperrpausen 02.07.2027-08.07.2027 - 6 Schichten jeweils ca. 21:00 Uhr – 05:00 Uhr	3,69 d	02.07.2027	08.07.2027				Nein Ohne																																																							
113			Güterverkehr - Arbeiten an der Überbauunterseite und am Unterbau - Sperrpausen 02.07.2027 von ca. 21:00 Uhr -09.07.2027 bis ca. 05:00 Uhr (durchgehend)	3,94 d	02.07.2027	09.07.2027				Nein Ohne																																																							
Bauvorhaben: Straßenbrücke im Oestricher Holt BW 55																																																																	
1 von 10																																																																	
Rahmenterminplan R6, HH den 27.08.2026																																																																	


CN Europlan GmbH - Bauingenieure - Tragwerksplanung - Beratende Ingenieure VBI																										
Nr.		Vorgangsmc	Task Name	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcen	Balken ausblenden	Vorgangskalender																
											11	18	25	Feb '27		Mrz '27		Apr '27			Mai '27					
											01	08	15	22	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17
0			512DE_BW055_RAHMENTERMINPLAN	269,44 d	06.07.2026	09.07.2027				Nein Ohne																
1			PLANUNGSPHASE	86 d	06.07.2026	02.11.2026				Nein Ohne																
11			AUSFÜHRUNGSPHASE	139,44 d	04.01.2027	09.07.2027				Nein Ohne																
12			Personenverkehr - Montage des ASG - Sperrpausen 21.02.2027-28.02.2027 - 7 Schichten jeweils ca. 23:00 Uhr – 05:00 Uhr	43,16 d	04.01.2027	28.02.2027				Nein Ohne																
21			Güterverkehr - Montage des ASG - Sperrpausen 12.02.2027 von ca. 23:00 Uhr - 15.02.2027 bis ca. 05:00 Uhr (durchgehend)	27,53 d	14.01.2027	15.02.2027				Nein Ohne																
22			Abstimmung mit DB	10 d	14.01.2027	27.01.2027	10			Nein Ohne																
23			Anlieferung Gerüstmaterial	2 d	10.02.2027	11.02.2027	10			Nein Ohne																
24			Montage des Arbeits-und Schutzgerüstes - seitens der DB bestätigt	42 Std.	12.02.2027	14.02.2027	23			Nein Ohne																
25			Kontrolle der lichten Höhe und des DB-Lichtraumprofils	1 Std.	15.02.2027	15.02.2027	24			Nein Ohne																
26			Abnahme des Arbeits- und Schutzgerüstes	1 Std.	15.02.2027	15.02.2027	24			Nein Ohne																
27			Personenverkehr - Arbeiten an der Überbauoberseite - Maximal zulässige Ausführung vom 28.02.2027 bis 29.05.2027	56,63 d	18.02.2027	10.05.2027				Nein Ohne																
28			Rückbau der Böschungstreppe	1 d	18.02.2027	18.02.2027	50			Nein Ohne																
29			Aushubarbeiten im Bereich der Hinterfüllung am Widerlager	1 d	18.02.2027	18.02.2027	50			Nein Ohne																
30			Sanierungsarbeiten im Bereich der Hinterfüllung am Widerlager	3 d	19.02.2027	25.02.2027	29			Nein Ohne																
31			Herstellung der Böschungstreppe	3 d	19.02.2027	25.02.2027	28			Nein Ohne																
32			Instandsetzung Entwässerung Widerlager Achse E	2 d	18.02.2027	19.02.2027	50			Nein Ohne																
33			Rückbau der Geländer	2 d	28.02.2027	02.03.2027	20			Nein Ohne																
34			Rückbau der Fahrbahnübergangskonstruktion	3 d	02.03.2027	05.03.2027	33			Nein Ohne																
35			Rückbau des Fahrbahnbelags	2 d	05.03.2027	09.03.2027	34			Nein Ohne																
36			Rückbau der Abdichtung	2 d	09.03.2027	11.03.2027	35			Nein Ohne																
37			Rückbau der Brückenkappen	7 d	11.03.2027	22.03.2027	36			Nein Ohne																
38			Freilegen der Schadensbereiche an den Kragarmen in Achse E	2 d	22.03.2027	24.03.2027	37			Nein Ohne																
39			Instandsetzung der Kragarme in Achse E	3 d	24.03.2027	29.03.2027	38			Nein Ohne																
40			Instandsetzung der Topflager	2 d	29.03.2027	31.03.2027	39			Nein Ohne																
41			Herstellung der Fahrbahnübergangskonstruktion	5 d	29.03.2027	05.04.2027	39			Nein Ohne																
42			Abdichtung im Kappenbereich	3 d	05.04.2027	08.04.2027	41			Nein Ohne																
43			Herstellung der neuen Brückenkappen	7 d	08.04.2027	19.04.2027	42			Nein Ohne																
44			Abdichtung im Fahrbahnbereich	3 d	19.04.2027	22.04.2027	43			Nein Ohne																
45			Herstellung des Fahrbahnbelags	7 d	22.04.2027	03.05.2027	44			Nein Ohne																
46			Montage Fahrzeug-Rückhaltesystem	2 d	03.05.2027	05.05.2027	45			Nein Ohne																
47			Montage der Geländer	2 d	05.05.2027	07.05.2027	46			Nein Ohne																
Bauvorhaben: Straßenbrücke im Oestricher Holt BW 55											3 von 10							Rahmenterminplan R6, HH den 27.08.2026								

CN Europlan GmbH - Bauingenieure - Tragwerksplanung - Beratende Ingenieure VBI																																
Nr.		Vorgangsmc	Task Name	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressour	Balken ausblend	Vorgangskalender																						
48			Qualitätskontrolle und Abnahme	1 d	07.05.2027	10.05.2027	47			Nein Ohne	11	18	25	Feb '27	01	08	15	22	Mrz '27	01	08	15	22	29	05	12	19	26	Mai '27	03	10	17
49			Güterverkehr - Arbeiten an der Überbauoberseite -Maximal zulässige Ausführung vom 15.02.2027 bis 20.05.2027	62,72 d	16.02.2027	14.05.2027				Nein Ohne																						
50			Baustelleneinrichtung außerhalb des Gleisbereichs	2 d	16.02.2027	17.02.2027				Nein Ohne																						
51			Aushubarbeiten im Bereich der Hinterfüllung am Widerlager	1 d	18.02.2027	18.02.2027	50			Nein Standard																						
52			Sanierungsarbeiten im Bereich der Hinterfüllung am Widerlager	3 d	19.02.2027	25.02.2027	51			Nein Standard																						
53			Sonstige Arbeiten ausserhalb der Gleise	5 d	18.02.2027	27.02.2027	50			Nein Ohne																						
54			Abdichtung im Kappenbereich	3 d	12.04.2027	14.04.2027	41			Nein Ohne																						
55			Herstellung der neuen Brückenkappen	7 d	15.04.2027	23.04.2027	54			Nein Ohne																						
56			Abdichtung im Fahrbahnbereich	3 d	26.04.2027	28.04.2027	55			Nein Ohne																						
57			Herstellung des Fahrbahnbelags	7 d	29.04.2027	07.05.2027	56			Nein Ohne																						
58			Montage Fahrzeug-Rückhaltesystem	2 d	10.05.2027	11.05.2027	57			Nein Ohne																						
59			Montage der Geländer	2 d	12.05.2027	13.05.2027	58			Nein Ohne																						
60			Qualitätskontrolle und Abnahme	1 d	14.05.2027	14.05.2027	59			Nein Ohne																						
61			Personenverkehr - Demontage des AGS - Sperrpausen 30.05.2027-06.06.2027 - 7 Schichten jeweils ca. 23:00 Uhr – 05:00 Uhr	5,38 d	28.05.2027	07.06.2027				Nein Ohne																						
66			Güterverkehr - Demontage des AGS - Sperrpausen 21.05.2027 von ca. 23:00 Uhr - 24.05.2027 bis ca. 05:00 Uhr (durchgehend)	8,13 d	20.05.2027	25.05.2027				Nein Ohne																						
71			Personenverkehr - Arbeiten an der Überbauunterseite und am Unterbau - Sperrpausen 02.07.2027-08.07.2027 - 6 Schichten jeweils ca. 21:00 Uhr – 05:00 Uhr	3,69 d	02.07.2027	08.07.2027				Nein Ohne																						
113			Güterverkehr - Arbeiten an der Überbauunterseite und am Unterbau - Sperrpausen 02.07.2027 von ca. 21:00 Uhr -09.07.2027 bis ca. 05:00 Uhr (durchgehend)	3,94 d	02.07.2027	09.07.2027				Nein Ohne																						

Bauvorhaben: Straßenbrücke im Oestricher Holt BW 55

4 von 10

Rahmenterminplan R6, HH den 27.08.2026

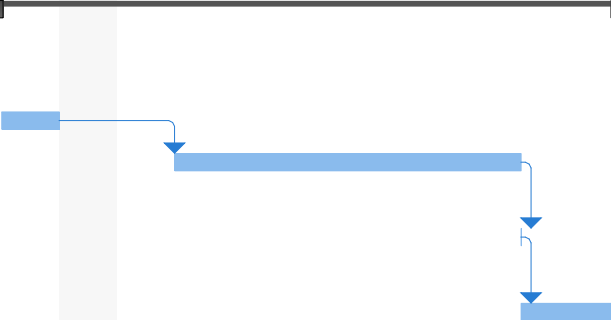CN Europlan GmbH - Bauingenieure - Tragwerksplanung - Beratende Ingenieure VBI																											
Nr.		Vorgangsmc	Task Name	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressour	Balken ausblend	Vorgangskalender																	
											ai '27				31 Mai '27				07 Jun '27								
											D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D
0			512DE_BW055_RAHMENTERMINPLAN	269,44 d	06.07.2026	09.07.2027			Nein	Ohne																	
1			PLANUNGSPHASE	86 d	06.07.2026	02.11.2026			Nein	Ohne																	
11			AUSFÜHRUNGSPHASE	139,44 d	04.01.2027	09.07.2027			Nein	Ohne																	
12			Personenverkehr - Montage des ASG - Sperrpausen 21.02.2027-28.02.2027 - 7 Schichten jeweils ca. 23:00 Uhr – 05:00 Uhr	43,16 d	04.01.2027	28.02.2027			Nein	Ohne																	
21			Güterverkehr - Montage des ASG - Sperrpausen 12.02.2027 von ca. 23:00 Uhr - 15.02.2027 bis ca. 05:00 Uhr (durchgehend)	27,53 d	14.01.2027	15.02.2027			Nein	Ohne																	
27			Personenverkehr - Arbeiten an der Überbauoberseite - Maximal zulässige Ausführung vom 28.02.2027 bis 29.05.2027	56,63 d	18.02.2027	10.05.2027			Nein	Ohne																	
49			Güterverkehr - Arbeiten an der Überbauoberseite -Maximal zulässige Ausführung vom 15.02.2027 bis 20.05.2027	62,72 d	16.02.2027	14.05.2027			Nein	Ohne																	
61			Personenverkehr - Demontage des AGS - Sperrpausen 30.05.2027-06.06.2027 - 7 Schichten jeweils ca. 23:00 Uhr – 05:00 Uhr	5,38 d	28.05.2027	07.06.2027			Nein	Ohne																	
62			Vorbereitung der Gerüstdemontage	1 d	28.05.2027	28.05.2027			Nein	Ohne																	
63			<u>Demontage des ASG - Personenbahn - seitens der DB noch nicht bestätigt</u>	26 Std.	<u>30.05.2027</u>	<u>06.06.2027</u>	62		<u>Nein</u>	<u>Ohne</u>																	
64			Abnahme und Freigabe des Regellichtraums	1 Std.	06.06.2027	<u>06.06.2027</u>	63		Nein	Ohne																	
65			Verladen und Abtransport der Gerüstbauteile	1 d	06.06.2027	07.06.2027	64		Nein	Ohne																	
66			Güterverkehr - Demontage des AGS - Sperrpausen 21.05.2027 von ca. 23:00 Uhr - 24.05.2027 bis ca. 05:00 Uhr (durchgehend)	8,13 d	20.05.2027	25.05.2027			Nein	Ohne																	
71			Personenverkehr - Arbeiten an der Überbauunterseite und am Unterbau - Sperrpausen 02.07.2027-08.07.2027 - 6 Schichten jeweils ca. 21:00 Uhr – 05:00 Uhr	3,69 d	02.07.2027	08.07.2027			Nein	Ohne																	
113			Güterverkehr - Arbeiten an der Überbauunterseite und am Unterbau - Sperrpausen 02.07.2027 von ca. 21:00 Uhr -09.07.2027 bis ca. 05:00 Uhr (durchgehend)	3,94 d	02.07.2027	09.07.2027			Nein	Ohne																	
Bauvorhaben: Straßenbrücke im Oestricher Holt BW 55																											
5 von 10																											
Rahmenterminplan R6, HH den 27.08.2026																											

CN Europlan GmbH - Bauingenieure - Tragwerksplanung - Beratende Ingenieure VBI																																			
Nr.		Vorgangsmc	Task Name	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourc	Balken ausblend	2 Jul				Sam 03 Jul				Son 04 Jul				Mon 05 Jul				Die 06 Jul				Mit 07 Jul				Don 08 Ju	
										6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	
0			512DE_BW055_RAHMENTERMINPLAN	269,44 d	06.07.2026	09.07.2027			Nein																										
1			PLANUNGSPHASE	86 d	06.07.2026	02.11.2026			Nein																										
11			AUSFÜHRUNGSPHASE	139,44 d	04.01.2027	09.07.2027			Nein																										
12			Personenverkehr - Montage des ASG - Sperrpausen 21.02.2027-28.02.2027 - 7 Schichten jeweils ca. 23:00 Uhr – 05:00 Uhr	43,16 d	04.01.2027	28.02.2027			Nein																										
21			Güterverkehr - Montage des ASG - Sperrpausen 12.02.2027 von ca. 23:00 Uhr - 15.02.2027 bis ca. 05:00 Uhr (durchgehend)	27,53 d	14.01.2027	15.02.2027			Nein																										
27			Personenverkehr - Arbeiten an der Überbauoberseite - Maximal zulässige Ausführung vom 28.02.2027 bis 29.05.2027	56,63 d	18.02.2027	10.05.2027			Nein																										
49			Güterverkehr - Arbeiten an der Überbauoberseite -Maximal zulässige Ausführung vom 15.02.2027 bis 20.05.2027	62,72 d	16.02.2027	14.05.2027			Nein																										
61			Personenverkehr - Demontage des AGS - Sperrpausen 30.05.2027-06.06.2027 - 7 Schichten jeweils ca. 23:00 Uhr – 05:00 Uhr	5,38 d	28.05.2027	07.06.2027			Nein																										
66			Güterverkehr - Demontage des AGS - Sperrpausen 21.05.2027 von ca. 23:00 Uhr - 24.05.2027 bis ca. 05:00 Uhr (durchgehend)	8,13 d	20.05.2027	25.05.2027			Nein																										
71			Personenverkehr - Arbeiten an der Überbauunterseite und am Unterbau - Sperrpausen 02.07.2027-08.07.2027 - 6 Schichten jeweils ca. 21:00 Uhr – 05:00 Uhr	3,69 d	02.07.2027	08.07.2027			Nein																										
72			Schicht 1	0,63 d	02.07.2027	03.07.2027			Nein																										
73			Schutzfolie über den Gleisen verlegen	0,5 Std.	02.07.2027	02.07.2027			Nein																										
74			Schadstellenaufnahme und Markierung	4 Std.	02.07.2027	03.07.2027	73		Nein																										
75			Abtrag geschädigter, hohlliegender und karbonatisierter Betonbereiche	3 Std.	03.07.2027	03.07.2027	73		Nein																										
76			Schließen von Hohlräumen und Kiesnestern	3 Std.	02.07.2027	03.07.2027	73		Nein																										
77			Rückbau der Schutzfolie über den Gleisen	0,5 Std.	03.07.2027	03.07.2027	76		Nein																										
78			Schicht 2	0,5 d	03.07.2027	04.07.2027	77		Nein																										
79			Schutzfolie über den Gleisen verlegen	0,5 Std.	03.07.2027	03.07.2027	77		Nein																										
80			Reinigen der freigelegten Bewehrung	3 Std.	03.07.2027	04.07.2027	79		Nein																										
81			Korrosionsschutz der freigelegten Bewehrung	3 Std.	03.07.2027	04.07.2027	79		Nein																										
82			Reprofilierung der Schadstellen mit Instandsetzungsmörtel	3 Std.	03.07.2027	04.07.2027	79		Nein																										
83			Abtrag geschädigter, hohlliegender und karbonatisierter Betonbereiche	3 Std.	03.07.2027	04.07.2027	79		Nein																										
84			Freilegen der Bewehrung	3 Std.	03.07.2027	04.07.2027			Nein																										
85			Reprofilierung der Schadstellen an Stützen und Stützenköpfen	3 Std.	03.07.2027	04.07.2027	79		Nein																										
86			Schließen von Hohlräumen und Kiesnestern	3 Std.	03.07.2027	04.07.2027	79		Nein																										

CN Europlan GmbH - Bauingenieure - Tragwerksplanung - Beratende Ingenieure VBI																			
Nr.		Vorgangsmc	Task Name	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourc	Balken ausblend										
										D	F	S	S	05 Jul '27 M	D	M	D	F	S
0			512DE_BW055_RAHMENTERMINPLAN	270,13 d	06.07.2026	09.07.2027			Nein										
1			PLANUNGSPHASE	86 d	06.07.2026	02.11.2026			Nein										
11			AUSFÜHRUNGSPHASE	140,13 d	04.01.2027	09.07.2027			Nein										
12			Personenverkehr - Montage des ASG - Sperrpausen 21.02.2027-28.02.2027 - 7 Schichten jeweils ca. 23:00 Uhr – 05:00 Uhr	43,16 d	04.01.2027	28.02.2027			Nein										
21			Güterverkehr - Montage des ASG - Sperrpausen 12.02.2027 von ca. 23:00 Uhr - 15.02.2027 bis ca. 05:00 Uhr (durchgehend)	27,53 d	14.01.2027	15.02.2027			Nein										
27			Personenverkehr - Arbeiten an der Überbauoberseite - Maximal zulässige Ausführung vom 28.02.2027 bis 29.05.2027	56,63 d	18.02.2027	10.05.2027			Nein										
49			Güterverkehr - Arbeiten an der Überbauoberseite -Maximal zulässige Ausführung vom 15.02.2027 bis 20.05.2027	62,72 d	16.02.2027	14.05.2027			Nein										
61			Personenverkehr - Demontage des AGS - Sperrpausen 30.05.2027-06.06.2027 - 7 Schichten jeweils ca. 23:00 Uhr – 05:00 Uhr	5,38 d	28.05.2027	07.06.2027			Nein										
66			Güterverkehr - Demontage des AGS - Sperrpausen 21.05.2027 von ca. 23:00 Uhr - 24.05.2027 bis ca. 05:00 Uhr (durchgehend)	8,13 d	20.05.2027	25.05.2027			Nein										
71			Personenverkehr - Arbeiten an der Überbauunterseite und am Unterbau - Sperrpausen 02.07.2027-08.07.2027 - 6 Schichten jeweils ca. 21:00 Uhr – 05:00 Uhr	3,69 d	02.07.2027	08.07.2027			Nein										
113			Güterverkehr - Arbeiten an der Überbauunterseite und am Unterbau - Sperrpausen 02.07.2027 von ca. 21:00 Uhr -09.07.2027 bis ca. 05:00 Uhr (durchgehend)	4,63 d	02.07.2027	09.07.2027			Nein										
114			Schutzfolie über den Gleisen verlegen	0,5 Std.	02.07.2027	02.07.2027			Nein										
115			Schadstellenaufnahme und Markierung	10 Std.	02.07.2027	04.07.2027	114		Nein										
116	 		Abtrag geschädigter, hohl liegender und karbonatisierter Betonbereiche	6 Std.	04.07.2027	05.07.2027	115		Nein										
117	 		Freilegen der Bewehrung	6 Std.	05.07.2027	05.07.2027	116		Nein										
118	 		Reinigen der freigelegten Bewehrung	6 Std.	05.07.2027	05.07.2027	117		Nein										
119	 		Korrosionsschutz der freigelegten Bewehrung	6 Std.	05.07.2027	05.07.2027	118		Nein										
120	 		Reprofilierung der Schadstellen mit Instandsetzungsmörtel	10 Std.	05.07.2027	06.07.2027	119		Nein										
121	 		Überarbeitung von Kiesnestern	10 Std.	04.07.2027	05.07.2027	115		Nein										
122	 		Überarbeitung von Altspachtelungen	10 Std.	04.07.2027	05.07.2027	115		Nein										
123	 		Überarbeitung unzureichender früherer Instandsetzungsstellen	10 Std.	04.07.2027	05.07.2027	115		Nein										
124	 		Reprofilierung der Schadstellen an Stützen und Stützenköpfen	3 d	05.07.2027	06.07.2027	123		Nein										
125	 		Schließen von Hohlräumen und Kiesnestern	6 d	02.07.2027	04.07.2027	114		Nein										
126	 		Instandsetzung bestehender Umschnürungen und Altinstandsetzungen	6 d	04.07.2027	06.07.2027	125		Nein										

Nr.		Vorgangsmc	Task Name	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourc	Balken ausblend														
127			Sanierung von Netzkissen und Abplatzungen	3 d	06.07.2027	07.07.2027	126		Nein														
128			Montage der Stahlmanschette um den Pfeiler	4 Std.	07.07.2027	08.07.2027	127		Nein														
129			Vorbereitung der Betonoberflächen für OS-System	1 d	07.07.2027	08.07.2027	127		Nein														
130			Herstellung des Oberflächenschutzsystems (OS-System)	3 d	04.07.2027	05.07.2027	125		Nein														
131			Überprüfung und Erneuerung der Entwässerungseinrichtungen und Abläufe	2 d	04.07.2027	05.07.2027	125		Nein														
132			Anpassung der Randanschlüsse und Berührungsschutzbereiche	2 d	08.07.2027	08.07.2027	129		Nein														
133			Maßnahmen an Nebenbauteilen gemäß Ausführungsplanung	2 d	08.07.2027	09.07.2027	132		Nein														
134			Qualitätskontrolle und Abnahme	2 Std.	04.07.2027	05.07.2027	125		Nein														
135			Rückbau der Schutzfolie über den Gleisen	0,5 Std.	09.07.2027	09.07.2027	133		Nein														
