


Nr.	Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Zuständig
1	1	LEISTUNGSPHASEN				
2	2	LPH 1&2 (abgeschlossen)	105 Tage	Mit 02.10.24	Die 25.02.25	
7	7	LPH 2 – Teilwiederholung (abgeschlossen)	79 Tage	Don 06.03.25	Die 24.06.25	
8	8	Beauftragung LPH 3 (erfolgt)	0 Tage	Mit 09.07.25	Mit 09.07.25	AG
9	9	LPH 3 Entwurfsplanung	113 Tage	Mit 25.08.25	Fre 28.11.25	
10	10	1. Erstellen der Plangrundlage	16 Tage	Mit 25.06.25	Mit 16.07.25	
11	11	2. Integrative Planung	80 Tage	Don 17.07.25	Mit 05.11.25	Alle
12	12	Design Freeze	0 Tage	Mit 05.11.25	Mit 05.11.25	ALLE/AG
13	13	3. Abschluss kongruente Planung	18 Tage	Mit 05.11.25	Fre 28.11.25	Alle
14	14	Ende LPH 3 (kongruente Planung)	0 Tage	Fre 28.11.25	Fre 28.11.25	Alle
15	15	Prüfung Freigabe LPH3	10 Tage	Mon 01.12.25	Fre 12.12.25	AG
16	16	schriftl. Freigabe LPH3	0 Tage	Fre 12.12.25	Fre 12.12.25	AG
17	17	LPH 4 Genehmigungsplanung	131 Tage	Fre 01.08.25	Fre 30.01.26	
18	18	Beauftragung LPH 4 – 9 (erfolgt)	0 Tage	Fre 01.08.25	Fre 01.08.25	AG
19	19	Genehmigungsplanung Interim (abgeschlossen)	32 Tage	Fre 01.08.25	Mon 15.09.25	
20	20	Einreichung Bauantrag Interim (abgeschlossen)	0 Tage	Mon 15.09.25	Mon 15.09.25	AG
21	21	Genehmigungsplanung Neubau & Denkmal	45 Tage	Mon 01.12.25	Fre 30.01.26	
22	22	Einreichung Bauanträge Neubau & Denkmal	0 Tage	Fre 30.01.26	Fre 30.01.26	AG
23	23	Beginn Genehmigungsstatik	0 Tage	Mon 15.12.25	Mon 15.12.25	
24	24	Genehmigungsstatik	41 Tage	Mon 15.12.25	Mon 09.02.26	
25	25	Prüfung Genehmigungsstatik	30 Tage	Mon 16.02.26	Fre 27.03.26	noch zu verg.
26	26	Genehmigungszeiträume	235 Tage	Mon 08.09.25	Fre 31.07.26	
27	27	Prüfung Interim (2 –3 Monate)	45 Tage	Mon 22.09.25	Fre 21.11.25	Kreis WAF
28	28	Baugenehmigung Interim (frühestens)	0 Tage	Fre 21.11.25	Fre 21.11.25	Kreis WAF
29	29	Abbruchanzeige (2 Monate)	43 Tage	Mit 01.04.26	Fre 29.05.26	Kreis WAF
30	30	Eingangsbestätigung Abbruchanzeige	0 Tage	Mon 01.06.26	Mon 01.06.26	Kreis WAF
31	31	Frist vor Abbruchbeginn (4 Wochen)	22 Tage	Mon 01.06.26	Die 30.06.26	
32	32	Prüfung Neubau (6 Monate)	130 Tage	Mon 02.02.26	Fre 31.07.26	Kreis WAF
33	33	Baugenehmigung Neubau	0 Tage	Fre 31.07.26	Fre 31.07.26	Kreis WAF
34	34	Denkmalrechtliche Erlaubnis (6 Monate)	130 Tage	Mon 02.02.26	Fre 31.07.26	Kreis WAF
35	35	Denkmalrechtliche Erlaubnis	0 Tage	Fre 31.07.26	Fre 31.07.26	Kreis WAF
36	36	LPH 5 Ausführungsplanung	412 Tage	Mon 02.02.26	Die 31.08.27	
37	37	WP1 – Erstellen der Planungsgrundlagen	10 Tage	Mon 02.02.26	Fre 13.02.26	
38	38	1. Plansatz Architektur	0 Tage	Mon 16.02.26	Mon 16.02.26	
39	39	WP2– Rohbauplanung (inkl. Fassade)	131 Tage	Mon 16.02.26	Mon 17.08.26	
40	40	1. Plansatz TGA (S+D Neubau) BP, EG, 1.OG	10 Tage	Mon 16.02.26	Fre 27.02.26	
41	41	Zuarbeit S+D–Planung NB (BP, EG, 1. OG)	0 Tage	Mon 02.03.26	Mon 02.03.26	
42	42	Integration S+D Architektur	10 Tage	Mon 02.03.26	Fre 13.03.26	
43	43	2. Plansatz Architektur	0 Tage	Fre 13.03.26	Fre 13.03.26	
44	44	Schal– und Bewehrungsplanung Bodenplatte	45 Tage	Mon 30.03.26	Fre 29.05.26	
45	45	Zuarbeit RB–LV Statik/TGA	0 Tage	Fre 29.05.26	Fre 29.05.26	
46	46	WP3 – Ausbauplanung	261 Tage	Die 01.09.26	Die 31.08.27	
47	47	LPH 6 Vorbereitung der Vergabe	857 Tage	Mit 01.10.25	Don 06.04.28	
48	48	LV Paket – Klassencontainer	33 Tage	Mit 01.10.25	Fre 14.11.25	
49	49	2. Abbruch	23 Tage	Mon 01.12.25	Don 01.01.26	
50	50	LV – Abbrucharbeiten (Pavillons)	20 Tage	Mon 01.12.25	Fre 26.12.25	
51	51	LV – Sanierung WDVS Sporthalle	20 Tage	Mon 01.12.25	Fre 26.12.25	
52	52	3. Ausschreibungen Neubau	0 Tage	Fre 29.05.26	Fre 29.05.26	
53	53	Zuarbeit RB–LV Statik/TGA	0 Tage	Fre 29.05.26	Fre 29.05.26	
54	54	LV – Bauhauptgewerk	55 Tage	Mon 16.03.26	Fre 29.05.26	
55	55	4. Ausschreibungen Bestand	65 Tage	Mit 01.12.27	Die 29.02.28	
56	56	LV – Bauhauptgewerk	65 Tage	Mit 01.12.27	Die 29.02.28	
57	57	LPH 7 Mitwirken bei der Vergabe	762 Tage	Mit 01.10.25	Don 31.08.28	
58	58	1. Vergabe Interim (3 Monate)	65 Tage	Mon 17.11.25	Fre 13.02.26	
59	59	2. Vergabe Abbruch (3 Monate)	61 Tage	Fre 02.01.26	Fre 27.03.26	
60	60	3.Vergabe Neubau – Hauptgewerk (3 Monate)	64 Tage	Mon 01.06.26	Don 27.08.26	
61	61	4.Vergabe Bestand – Hauptgewerk (3 Monate)	66 Tage	Mit 01.03.28	Mit 31.05.28	
62	62	LPH 8 Objektüberwachung	1269 Tage	Mon 22.12.25	Don 31.10.30	
63	63	Winterferien 2025/26	12 Tage	Mon 22.12.25	Die 06.01.26	
64	64	Freimachen Baufelder	12 Tage	Mon 22.12.25	Die 06.01.26	Stadt Telgte
65	65	Umbau Gasleitung (?)	20 Tage	Mon 02.02.26	Fre 27.02.26	AG
66	66	Ende Zeitfenster Baumfällungen	0 Tage	Mit 07.01.26	Mit 07.01.26	Stadt Telgte
67	67	Osterferien 2026	11 Tage	Mon 30.03.26	Sam 11.04.26	
68	68	Planung und Produktion Container (10 Wo.)	54 Tage	Mon 16.02.26	Don 30.04.26	AN
69	69	Erschließung Container	24 Tage	Mon 30.03.26	Don 30.04.26	
70	70	Erschl. Container, fertig	0 Tage	Don 30.04.26	Don 30.04.26	
71	71	Ersatzklassen	55 Tage	Mon 04.05.26	Fre 17.07.26	
72	72	Feuerwehrpläne (20 Wo. Vorlauf)	0 Tage	Sam 31.01.26	Sam 31.01.26	
73	73	Anlieferung Container (1 Wo.)	5 Tage	Mon 04.05.26	Fre 08.05.26	AN
74	74	Errichtung Klassencontainer (6 Wo.)	30 Tage	Mon 11.05.26	Fre 19.06.26	AN
75	75	Umzug Schule	20 Tage	Mon 22.06.26	Fre 17.07.26	Schule
76	76	Rückbau Container SPH (?) vor Baubeginn!	80 Tage	Mon 13.07.26	Fre 30.10.26	AN
77	77	Sommerferien Schuljahr 2026/27	32 Tage	Mon 20.07.26	Die 01.09.26	
78	78	Abbruch: Planung & Vorlauf (3 Monate)	63 Tage	Mit 01.04.26	Fre 26.06.26	AN
79	79	Abbruch Gebäude & Erdleitungen, neu	32 Tage	Mon 20.07.26	Die 01.09.26	
80	80	Sommerferien Schuljahr 2026/27	32 Tage	Mon 20.07.26	Die 01.09.26	
81	81	Beginn Abbrucharbeiten	0 Tage	Mon 20.07.26	Mon 20.07.26	AN
82	82	Abbruch Pavillons, Teilabb. Laubengang	10 Tage	Mon 20.07.26	Fre 31.07.26	AN
83	83	Verlegen der Erdleitungen	20 Tage	Mon 03.08.26	Fre 28.08.26	AN
84	84	Neubau: Planung & Vorlauf (2 Monate)	43 Tage	Die 01.09.26	Don 29.10.26	AN
85	85	Sommerferien Schuljahr 2026/27	32 Tage	Mon 20.07.26	Die 01.09.26	
86	86	Neubau (24 Monate)	545 Tage	Mon 02.11.26	Fre 01.12.28	AN
87	87	Möglicher Baugebinn	0 Tage	Mon 02.11.26	Mon 02.11.26	AN
88	88	Sommerferien Schuljahr 2027/28	32 Tage	Mon 19.07.27	Die 31.08.27	
89	89	Sommerferien Schuljahr 2028/29	32 Tage	Mon 10.07.28	Die 22.08.28	
90	90	Fertigstellung Neubau	0 Tage	Fre 01.12.28	Fre 01.12.28	AN
91	91	Umzug Schule	27 Tage	Fre 01.12.28	Son 07.01.29	Schule
92	92	Bestand: Planung & Vorlauf (3 Monate)	60 Tage	Mon 02.10.28	Fre 22.12.28	AN
93	93	Umbau Bestand (18 Monate)	408 Tage	Mon 08.01.29	Mit 31.07.30	AN
94	94	Mögl. Baubeginn Bestand	0 Tage	Mon 08.01.29	Mon 08.01.29	AN
95	95	Sommerferien Schuljahr 2029/30	32 Tage	Mon 02.07.29	Die 14.08.29	
96	96	Fertigstellung Umbau Bestand	0 Tage	Mit 31.07.30	Mit 31.07.30	AN
97	97	Sommerferien Schuljahr 2030/31 (prüfen!)	32 Tage	Mon 15.07.30	Die 27.08.30	
98	98	Umzug Schule	19 Tage	Don 01.08.30	Die 27.08.30	Schule

Stand: Mit 15.10.25

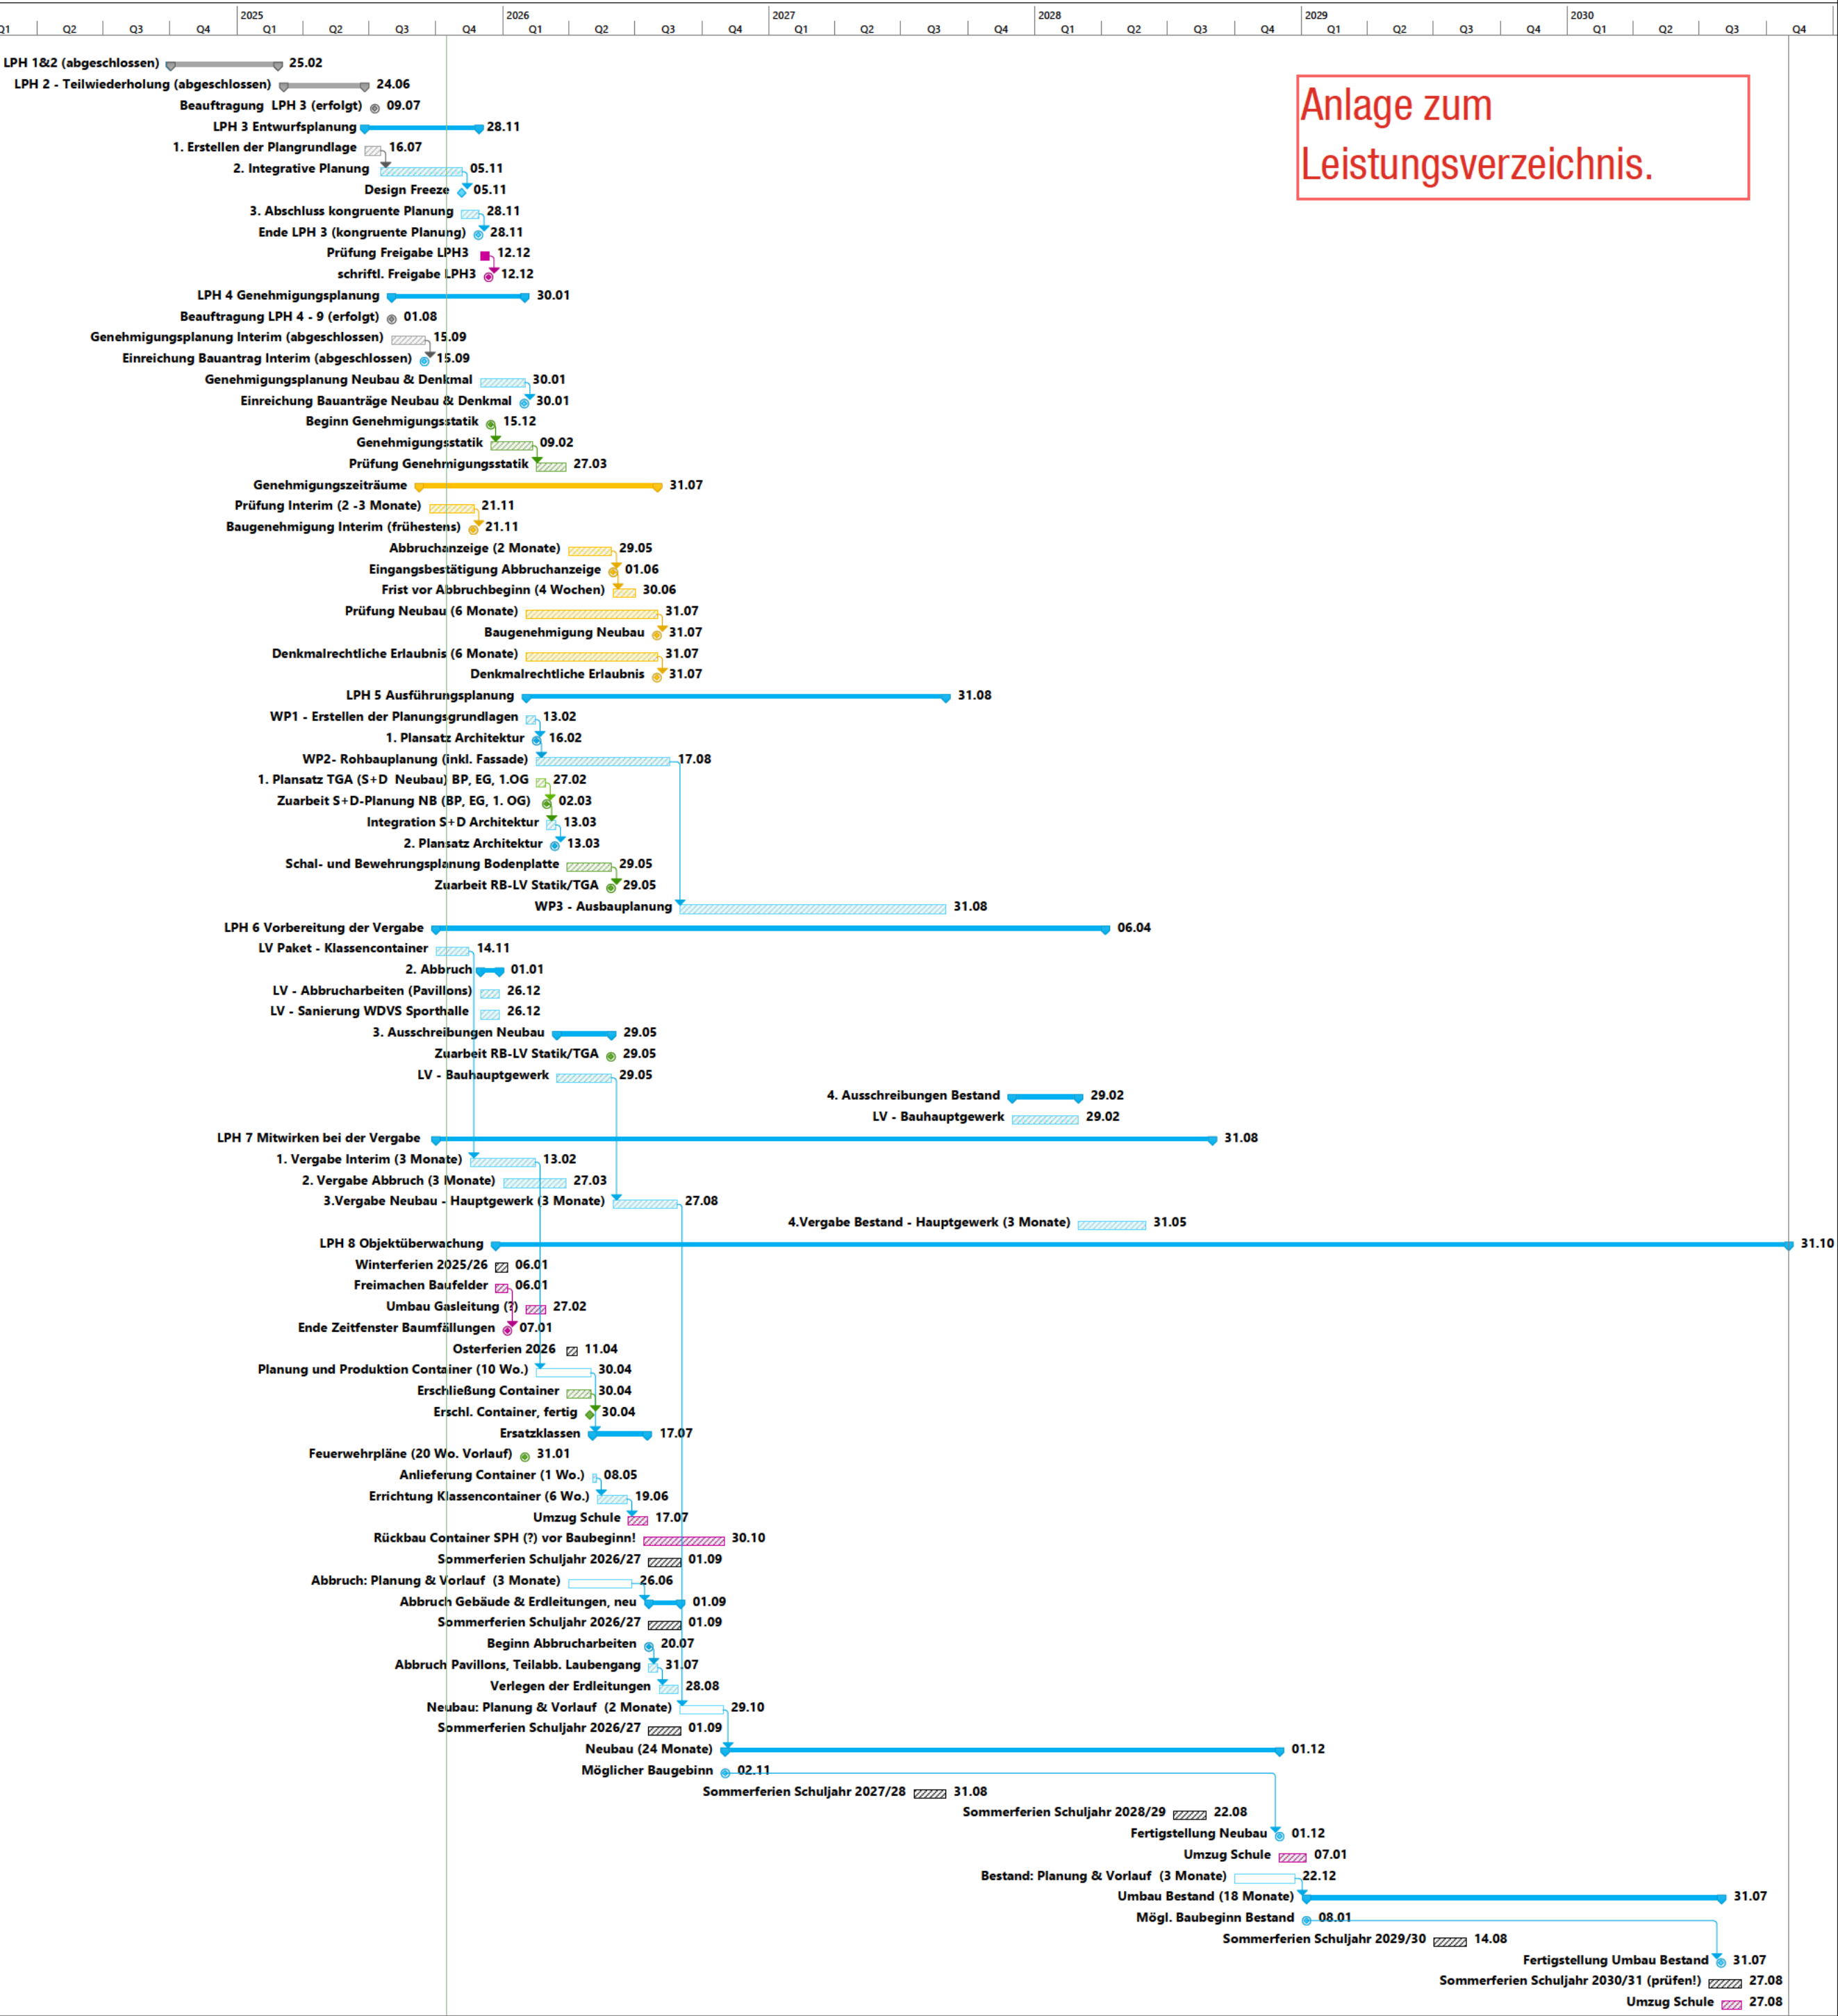

Anlage zum  
Leistungsverzeichnis.
