




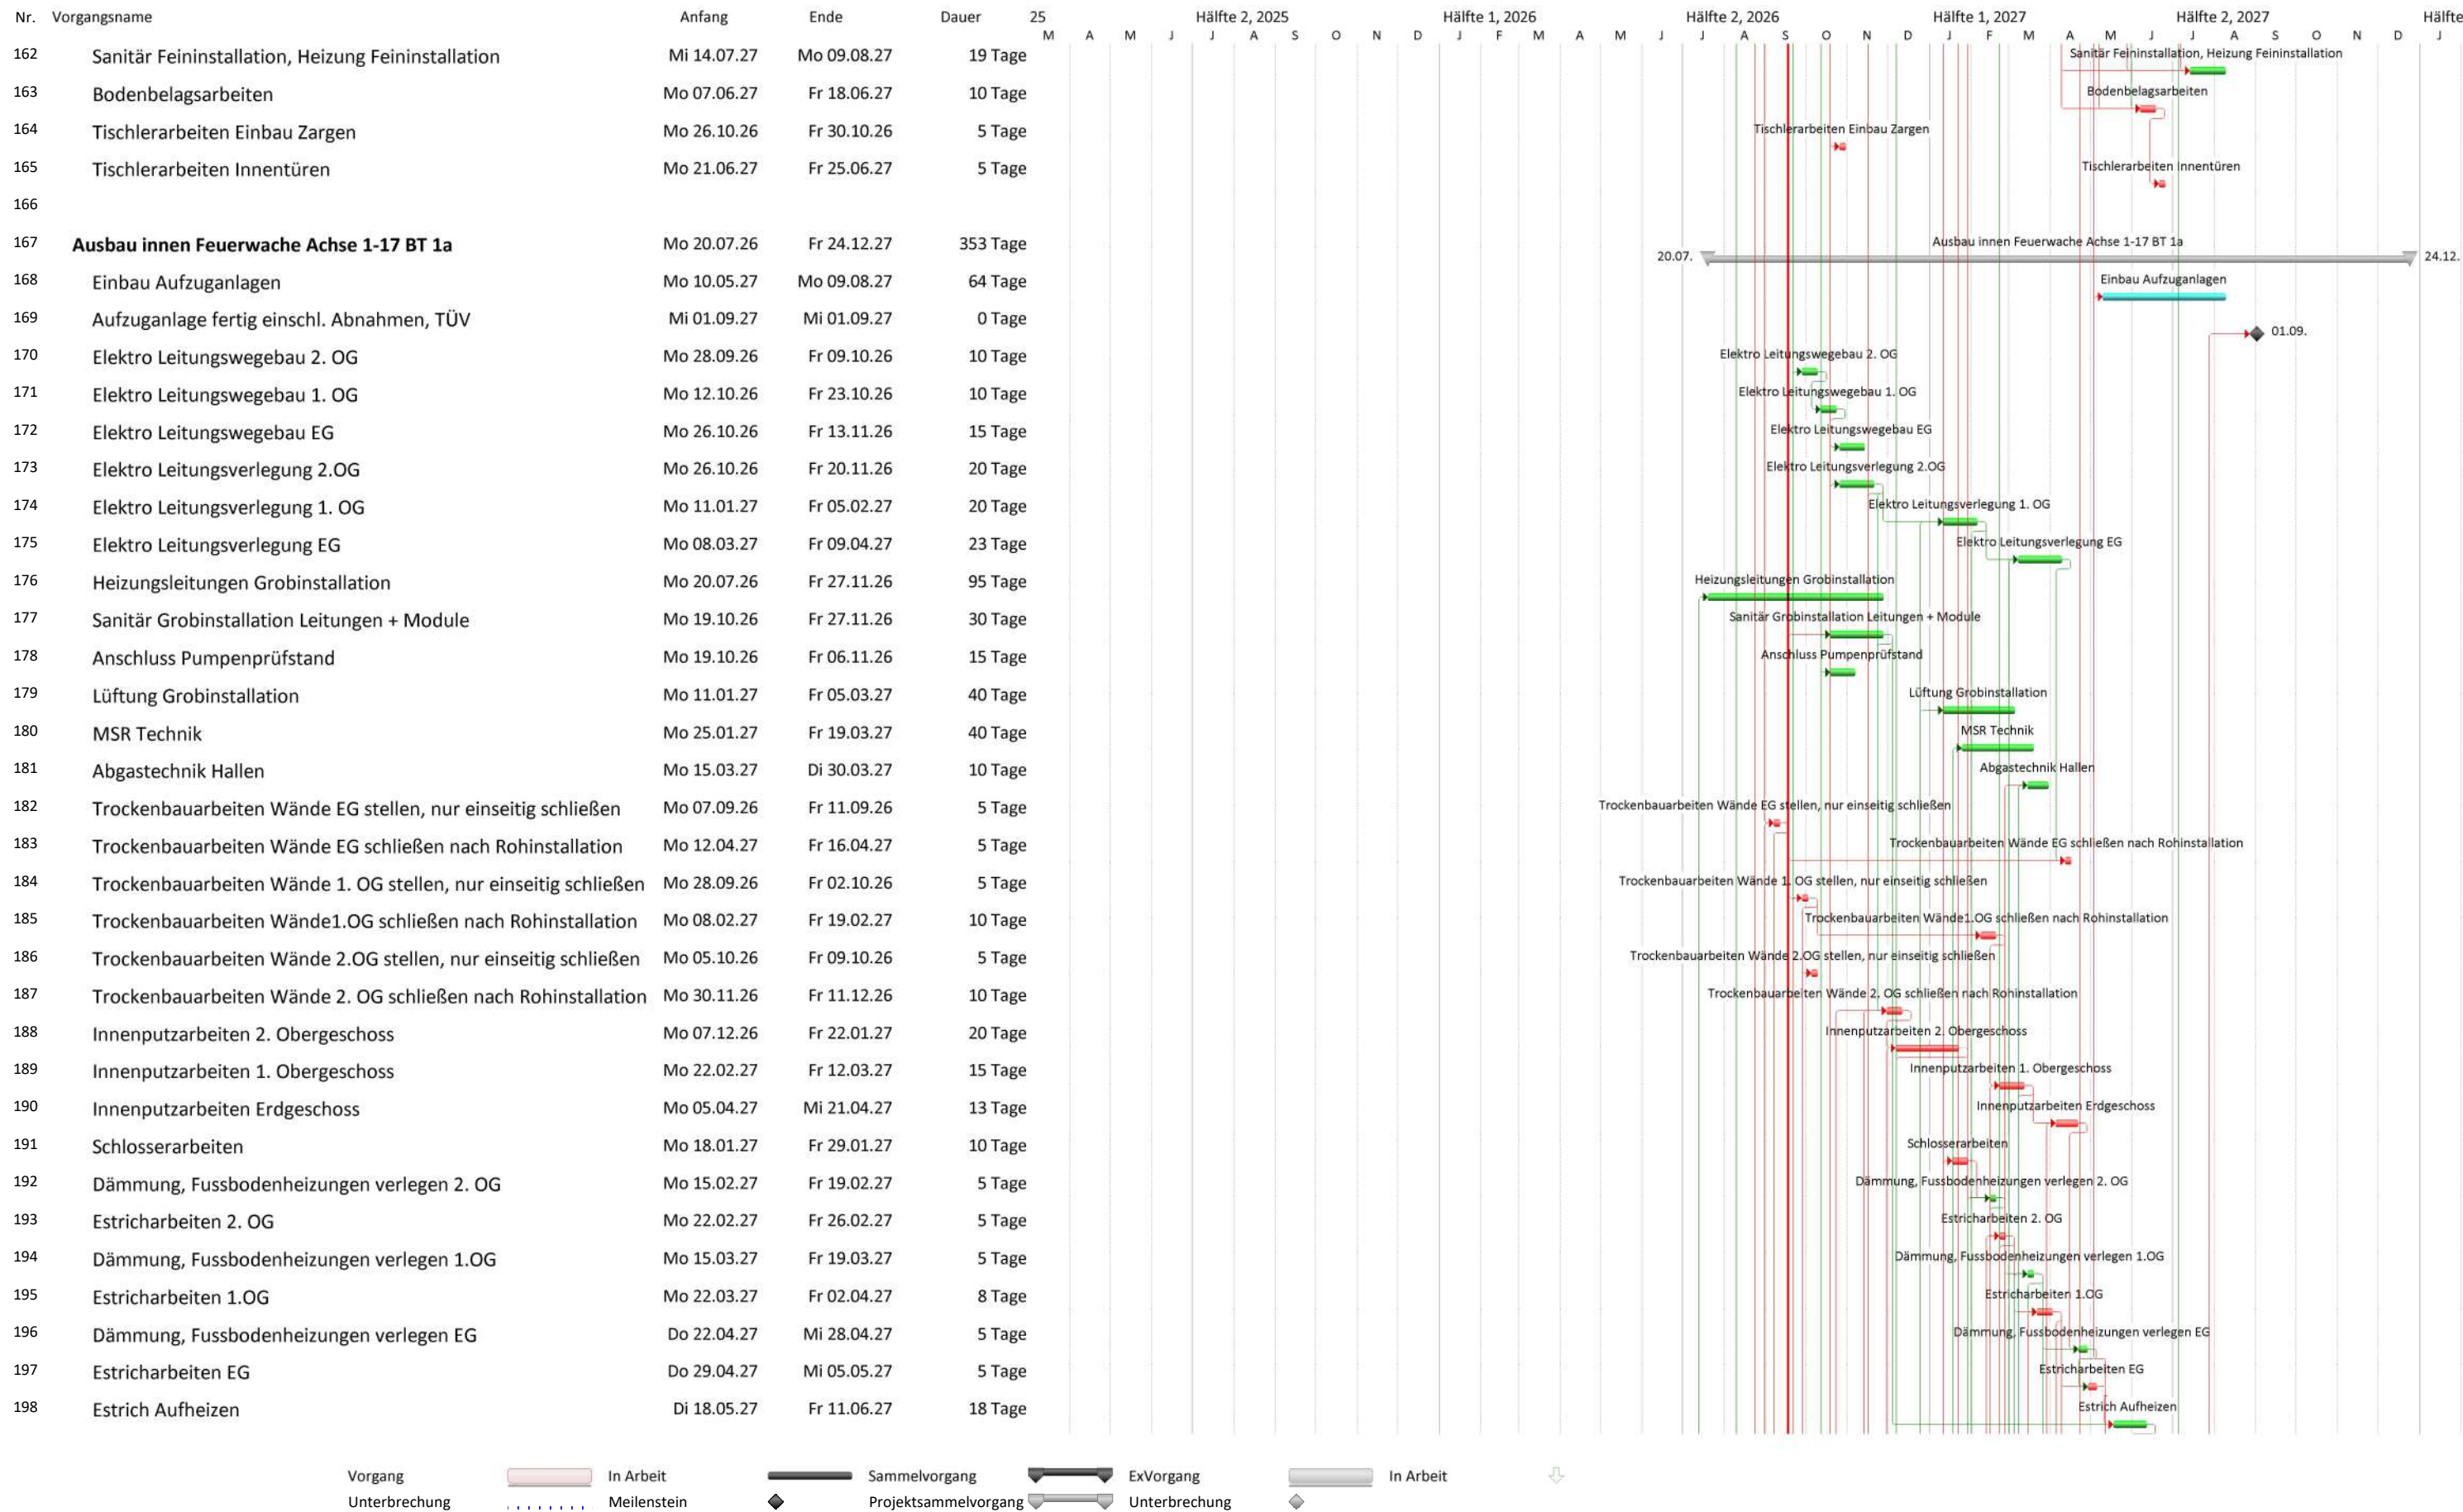

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Dauer	25	Hälfte 2, 2025												Hälfte 1, 2026												Hälfte 2, 2026												Hälfte 1, 2027												Hälfte 2, 2027												Hälfte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
199	Rinnen Fahrzeughallen montieren	Mo 01.02.27	Fr 05.02.27	5 Tage																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Dauer
236	Heizungsanlage Grobinstallation	Mo 20.07.26	Fr 04.12.26	100 Tage
237	Sanitär Grobinstallation Leitungen + Module	Di 18.08.26	Fr 16.10.26	44 Tage
238	Lüftung Grobinstallation	Mo 24.08.26	Fr 18.12.26	85 Tage
239	MSR Technik	Mo 19.10.26	Fr 22.01.27	55 Tage
240	Abgastechnik Hallen	Mo 01.03.27	Fr 12.03.27	10 Tage
241	Trockenbauarbeiten Wände EG stellen, nur einseitig schließen	Mo 31.08.26	Fr 04.09.26	5 Tage
242	Trockenbauarbeiten Wände EG schließen nach Rohinstallation	Mo 08.03.27	Fr 12.03.27	5 Tage
243	Trockenbauarbeiten Wände 1. OG stellen, nur einseitig schließen	Mo 14.09.26	Fr 25.09.26	10 Tage
244	Trockenbauarbeiten Wände 1.OG schließen nach Rohinstallatio	Mo 11.01.27	Fr 22.01.27	10 Tage
245	Trockenbauarbeiten Wände 2.OG stellen, nur einseitig schließen	Mo 05.10.26	Fr 16.10.26	10 Tage
246	Trockenbauarbeiten Wände 2. OG schließen nach Rohinstallati	Mo 26.10.26	Fr 06.11.26	10 Tage
247	Innenputzarbeiten 2. Obergeschoss	Mo 09.11.26	Fr 04.12.26	20 Tage
248	Innenputzarbeiten 1. Obergeschoss	Mo 25.01.27	Fr 19.02.27	20 Tage
249	Innenputzarbeiten Erdgeschoss	Mo 15.03.27	Fr 02.04.27	13 Tage
250	Doppelboden in sämtlichen Geschossen	Mo 05.04.27	Fr 23.04.27	15 Tage
251	Schlosserarbeiten	Mo 07.12.26	Fr 15.01.27	15 Tage
252	Dämmung, Fussbodenheizungen verlegen 2. OG	Mo 18.01.27	Fr 22.01.27	5 Tage
253	Estricharbeiten 2. OG	Mo 25.01.27	Fr 05.02.27	10 Tage
254	Dämmung, Fussbodenheizungen verlegen 1.OG	Mo 22.02.27	Fr 26.02.27	5 Tage
255	Estricharbeiten 1.OG	Mo 01.03.27	Fr 12.03.27	10 Tage
256	Dämmung, Fussbodenheizungen verlegen EG	Mo 05.04.27	Fr 09.04.27	5 Tage
257	Estricharbeiten EG	Mo 12.04.27	Fr 23.04.27	10 Tage
258	Estrich Aufheizen	Mo 26.04.27	Fr 21.05.27	17 Tage
259	Rinnen Fahrzeughallen montieren	Mo 11.01.27	Fr 15.01.27	5 Tage
260	Fliesenarbeiten Böden im Rüttelverfahren Erdgeschoss	Mo 18.01.27	Fr 05.02.27	15 Tage
261	Fliesenarbeiten Wände Erdgeschoss Hallen	Mo 15.03.27	Di 30.03.27	10 Tage
262	Fliesenarbeiten 2. Obergeschoss	Mo 24.05.27	Fr 04.06.27	9 Tage
263	Fliesenarbeiten 1. Obergeschoss, Erdgeschoss	Mo 07.06.27	Fr 02.07.27	20 Tage
264	Malerarbeiten Decken schwarz streichen Räume mit Deckensegel	Mi 31.03.27	Fr 16.04.27	13 Tage
265	Malerarbeiten Decke und Wand 2. Obergeschoss	Mo 19.04.27	Mi 05.05.27	13 Tage
266	Malerarbeiten Decke und Wand 1. Obergeschoss	Di 01.06.27	Fr 25.06.27	19 Tage
267	Malerarbeiten Decke und Wand Erdgeschoss	Do 22.07.27	Fr 06.08.27	12 Tage
268	Trockenbauarbeiten UK Decken, Randfries 2. Obergeschoss	Mo 22.02.27	Fr 12.03.27	15 Tage
269	Trockenbauarbeiten UK Decken, Randfries 1. Obergeschoss	Mi 31.03.27	Fr 23.04.27	18 Tage
270	Trockenbau UK Decken Decken, Randfries Erdgeschoss	Mi 12.05.27	Fr 28.05.27	11 Tage
271	Trockenbauarbeiten Decken, Akustik 2. Obergeschoss	Mo 10.05.27	Fr 04.06.27	18 Tage
272	Trockenbauarbeiten Decken, Akustik 1. Obergeschoss	Mo 28.06.27	Fr 30.07.27	25 Tage

Vorgang

Unterbrechung

In Arbeit

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

ExVorgang

Unterbrechung

In Arbeit

Hälfte 2, 2025

Hälfte 1, 2026

Hälfte 2, 2026

Hälfte 1, 2027

Hälfte 2, 2027

Hälfte

