


Anlage LV



- Montage Dachabdichtung, Dachablauf und Attikakrone (AN Dach)**
1. Dampfsperre aufbringen
 2. Einsetzen des Dachablaufs und Dampfsperre anarbeiten
 3. horizontale Dämmung setzen
 4. horizontale Dachabdichtung verlegen und verwahren
 5. Dachablauf fachgerecht eindichten und Dachabdichtung verwahren/sichern
 6. Montage Fassadendämmung und Montage Vorsatzschale
 7. Attikakrone (Dämmung, OSB-Platte/Holzbohle und Abdichtung herstellen)
 8. Montage Attikaverklebung inkl. UK (AN VHF Metall)
 9. Durchführung und Montage Regenfallrohr gem. Detail-Beschreibung

Anpassung Verzug Regenfallrohr aufgrund von Aufhängung: BFT

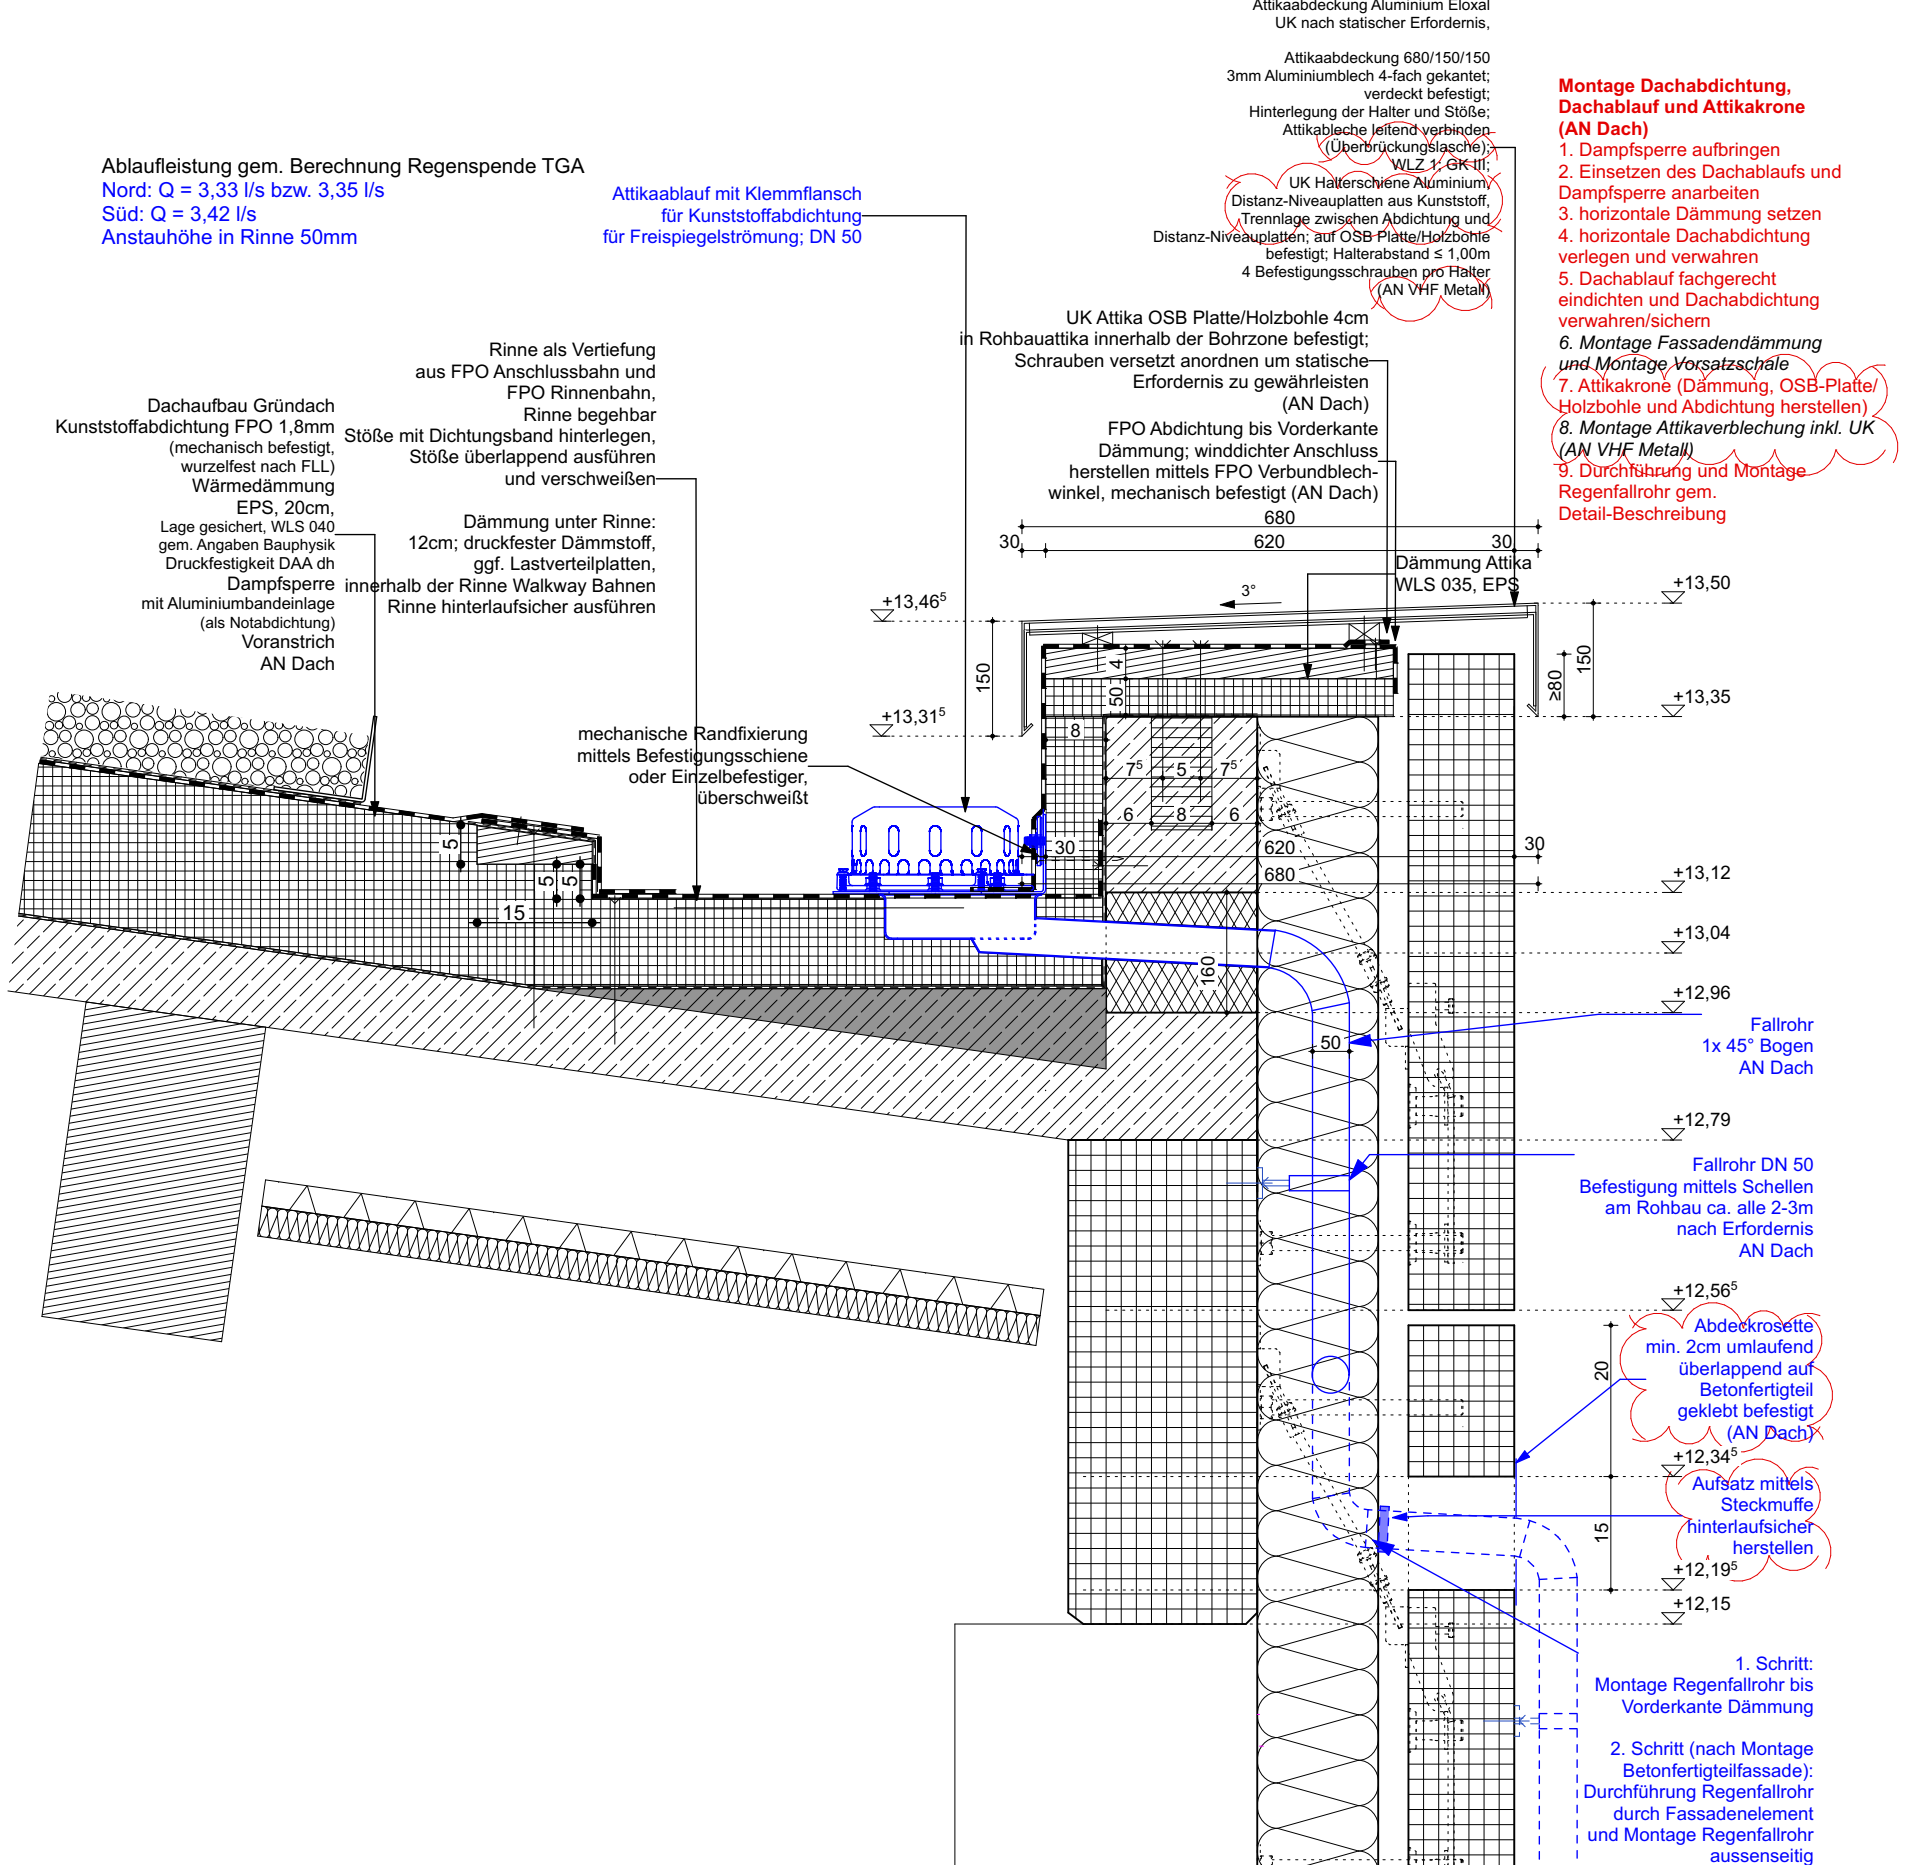
