Nr.	Vor	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		1. BAUABSCHNITT			
2		H/L/S Baustellenvorbereitung	5 Tage	Mon 17.08.26	Fre 21.08.26
3		H/L/S Kernbohrungen 2OG	3 Tage	Mon 24.08.26	Mit 26.08.26
4		H/L/S Installation 2OG	5 Tage	Don 27.08.26	Mit 02.09.26
5		H/L/S Abdrücken, dämmen 2OG	1 Tag	Don 03.09.26	Don 03.09.26
6		H/L/S Installation Sanitärobjekte und Heizkörper 2OG	3 Tage	Mon 14.09.26	Mit 16.09.26
7		H/L/S Kernbohrungen 1OG	3 Tage	Don 27.08.26	Mon 31.08.26
8		H/L/S Installation 1OG	16 Tage	Don 03.09.26	Don 24.09.26
9		H/L/S Abdrücken, dämmen 1OG	2 Tage	Fre 04.09.26	Mon 07.09.26
10		H/L/S Installation Sanitärobjekte 1OG	5 Tage	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26
11		H/L/S Installation Heizkörper 1OG	5 Tage	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26
12		H/L/S Kernbohrungen EG	3 Tage	Die 01.09.26	Don 03.09.26
13		H/L/S Installation EG	15 Tage	Fre 25.09.26	Don 15.10.26
14		H/L/S Abdrücken, dämmen EG	2 Tage	Die 08.09.26	Mit 09.09.26
15		H/L/S Installation Sanitärobjekte EG	5 Tage	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26
16		H/L/S Installation Heizkörper EG	5 Tage	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26
17		H/L/S Kernbohrungen UG	3 Tage	Fre 04.09.26	Die 08.09.26
18		H/L/S Installation UG	15 Tage	Fre 16.10.26	Don 05.11.26
19		H/L/S Abdrücken, dämmen UG	5 Tage	Don 10.09.26	Mit 16.09.26
20		H/L/S Installation Sanitärobjekte UG	5 Tage	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26
21		H/L/S Installation Heizkörper UG	5 Tage	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26
22		Inbetriebnahme Heizung	5 Tage	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26
23					
24		1.BAUABSCHNITT / UMZUG Ostern	10 Tage	Mon 22.03.27	Fre 02.04.27
25		OSTERFERIEN 2027	10 Tage	Mon 22.03.27	Fre 02.04.27
26		UMZUG in 1.BA	10 Tage	Mon 22.03.27	Fre 02.04.27
27					
28					
29		BAUBEGINN 2. Bauabschnitt			
30		Schadstoffsanierung	35 Tage	Mon 05.04.27	Fre 21.05.27
31		RB: Abbruch-Durchbrüche	30 Tage	Mon 24.05.27	Fre 02.07.27
32		Fenster: Fluchtfenster im DG	5 Tage	Mon 05.07.27	Fre 09.07.27
33		Elektro-Installation	35 Tage	Mon 05.07.27	Fre 20.08.27
34		H/L/S-Installation	40 Tage	Mon 05.07.27	Fre 27.08.27
35		Trockenbau: Wände, Abkoffern	15 Tage	Mon 23.08.27	Fre 10.09.27
36		SOMMERFERIEN	32 Tage	Mon 19.07.27	Die 31.08.27
37		Maler	25 Tage	Mon 23.08.27	Fre 24.09.27
38		Fliesen	15 Tage	Mon 13.09.27	Fre 01.10.27
39		HLS:Heizkörpermontage, Sanitärobjekte	20 Tage	Mon 27.09.27	Fre 22.10.27
40		Trockenbau: Akustikdecken	30 Tage	Mon 27.09.27	Fre 05.11.27
41		Elektro-Feininstallation	15 Tage	Mon 25.10.27	Fre 12.11.27
42		Parkett: überarbeiten	15 Tage	Mon 08.11.27	Fre 26.11.27
43		Bodenleger	10 Tage	Mon 29.11.27	Fre 10.12.27
44		Einbauschränke, Garderoben, Lernhäuser	20 Tage	Mon 10.01.28	Fre 04.02.28
45		Vorhänge	10 Tage	Mon 10.01.28	Fre 21.01.28
46		Abschlussreinigung	5 Tage	Mon 24.01.28	Fre 28.01.28
47		OSTERFERIEN	10 Tage	Mon 10.04.28	Fre 21.04.28
48		Umzug 2.BA	10 Tage	Mon 10.04.28	Fre 21.04.28
49		Demontage Containeranlage	10 Tage	Mon 10.04.28	Fre 21.04.28

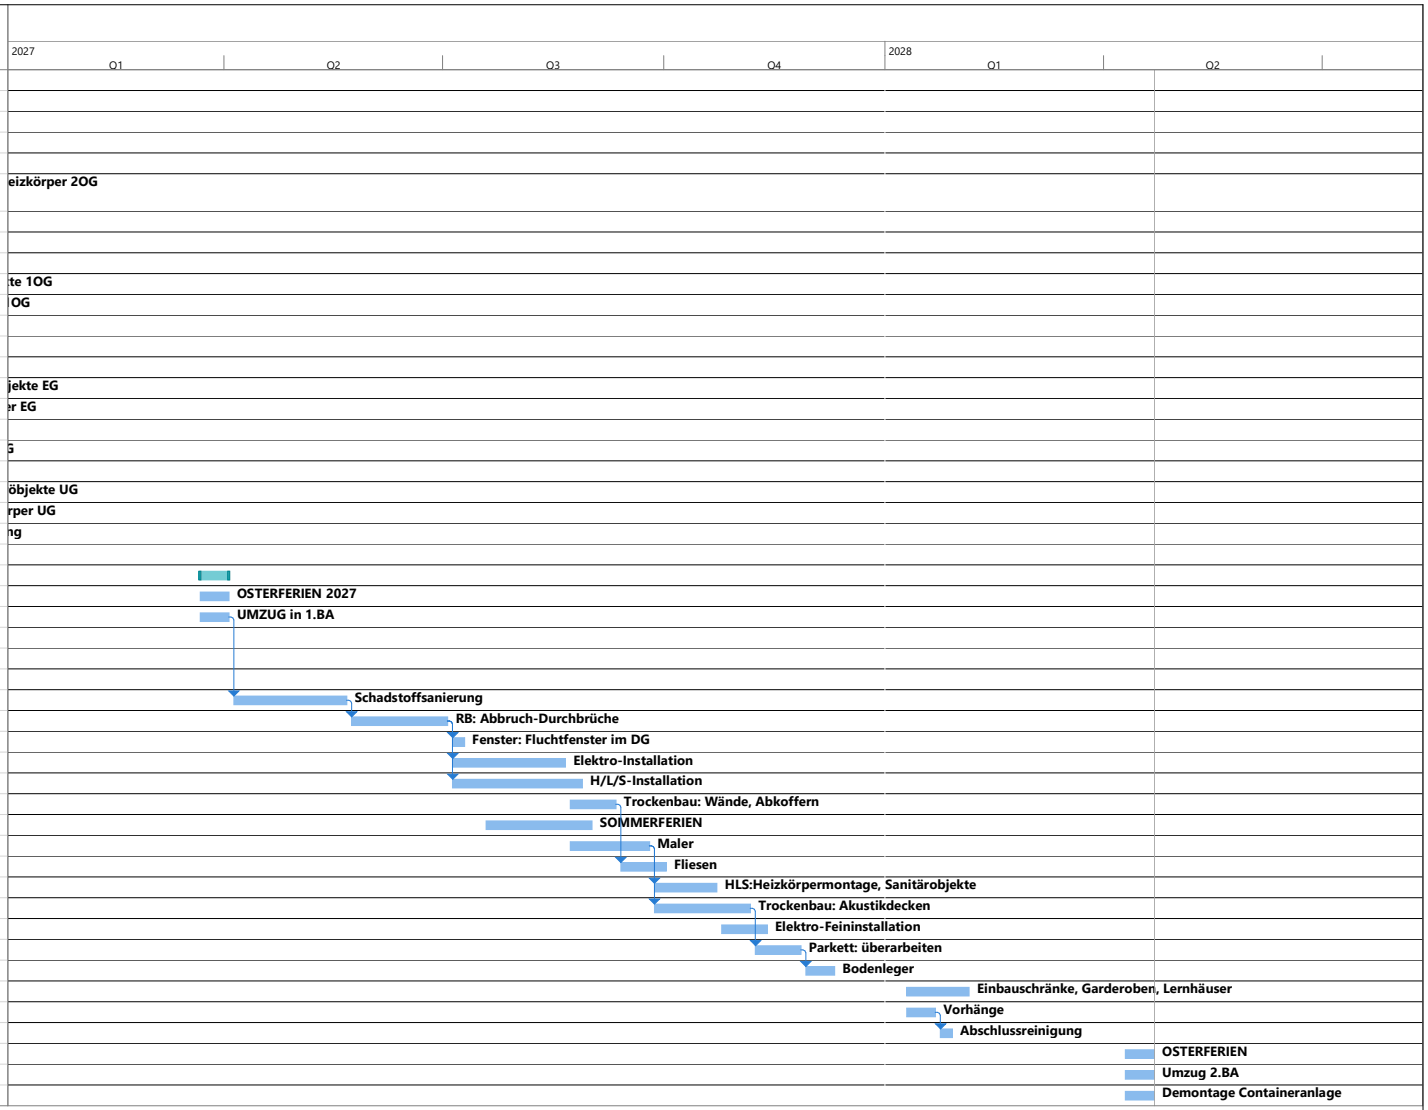

Projekt: 260516_Bauzeitenplan
Datum: Fre 29.05.26

Vorgang	Sammelvorgang	Inaktiver Meilenstein	Nur Dauer	Nur Anfang	Externer Meilenstein	Manueller Fortschritt	
Unterbrechung	Projektsammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelrollup	Nur Ende	Stichtag		
Meilenstein	Inaktiver Vorgang	Manueller Vorgang	Manueller Sammelvorgang	Externe Vorgänge	In Arbeit		
