| Nr | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende | Vorgänge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. BAUABSCHNITT | | | | |
| 2 | H/L/S Baustellenvorbereitung | 5 Tage | Mon 17.08.26 | Fre 21.08.26 | |
| 3 | H/L/S Kernbohrungen 2OG | 3 Tage | Mon 24.08.26 | Mit 26.08.26 | 2 |
| 4 | H/L/S Installation 2OG | 5 Tage | Don 27.08.26 | Mit 02.09.26 | 3 |
| 5 | H/L/S Abdrücken, dämmen 2OG | 1 Tag | Don 03.09.26 | Don 03.09.26 | 4 |
| 6 | H/L/S Installation Sanitäröbjekte und Heizkörper 2OG | 3 Tage | Mon 14.09.26 | Mit 16.09.26 | |
| 7 | H/L/S Kernbohrungen 1OG | 3 Tage | Don 27.08.26 | Mon 31.08.26 | 3 |
| 8 | H/L/S Installation 1OG | 16 Tage | Don 03.09.26 | Don 24.09.26 | 4 |
| 9 | H/L/S Abdrücken, dämmen 1OG | 2 Tage | Fre 04.09.26 | Mon 07.09.26 | 5 |
| 10 | H/L/S Installation Sanitäröbjekte 1OG | 5 Tage | Mon 05.10.26 | Fre 09.10.26 | |
| 11 | H/L/S Installation Heizkörper 1OG | 5 Tage | Mon 05.10.26 | Fre 09.10.26 | |
| 12 | H/L/S Kernbohrungen EG | 3 Tage | Die 01.09.26 | Don 03.09.26 | 7 |
| 13 | H/L/S Installation EG | 15 Tage | Fre 25.09.26 | Don 15.10.26 | 8 |
| 14 | H/L/S Abdrücken, dämmen EG | 2 Tage | Die 08.09.26 | Mit 09.09.26 | 9 |
| 15 | H/L/S Installation Sanitäröbjekte EG | 5 Tage | Mon 12.10.26 | Fre 16.10.26 | 10 |
| 16 | H/L/S Installation Heizkörper EG | 5 Tage | Mon 12.10.26 | Fre 16.10.26 | |
| 17 | H/L/S Kernbohrungen UG | 3 Tage | Fre 04.09.26 | Die 08.09.26 | 12 |
| 18 | H/L/S Installation UG | 15 Tage | Fre 16.10.26 | Don 05.11.26 | 13 |
| 19 | H/L/S Abdrücken, dämmen UG | 5 Tage | Don 10.09.26 | Mit 16.09.26 | 14 |
| 20 | H/L/S Installation Sanitäröbjekte UG | 5 Tage | Mon 19.10.26 | Fre 23.10.26 | 15 |
| 21 | H/L/S Installation Heizkörper UG | 5 Tage | Mon 19.10.26 | Fre 23.10.26 | 16 |
| 22 | Inbetriebnahme Heizung | 5 Tage | Mon 26.10.26 | Fre 30.10.26 | 21 |
| 23 | | | | | |
| 24 | 1.BAUABSCHNITT / UMZUG Ostern | 10 Tage | Mon 22.03.27 | Fre 02.04.27 | |
| 25 | OSTERFERIEN 2027 | 10 Tage | Mon 22.03.27 | Fre 02.04.27 | |
| 26 | UMZUG in 1.BA | 10 Tage | Mon 22.03.27 | Fre 02.04.27 | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | BAUBEGINN 2. Bauabschnitt | | | | |
| 30 | Schadstoffsanierung | 35 Tage | Mon 05.04.27 | Fre 21.05.27 | 26 |
| 31 | RB: Abbruch-Durchbrüche | 30 Tage | Mon 24.05.27 | Fre 02.07.27 | 30 |
| 32 | Fenster: Fluchtfenster im DG | 5 Tage | Mon 05.07.27 | Fre 09.07.27 | 31 |
| 33 | Elektro-Installation | 35 Tage | Mon 05.07.27 | Fre 20.08.27 | 31 |
| 34 | H/L/S-Installation | 40 Tage | Mon 05.07.27 | Fre 27.08.27 | 31 |
| 35 | Trockenbau: Wände, Abkoffern | 15 Tage | Mon 23.08.27 | Fre 10.09.27 | |
| 36 | SOMMERFERIEN | 32 Tage | Mon 19.07.27 | Die 31.08.27 | |
| 37 | Maler | 25 Tage | Mon 23.08.27 | Fre 24.09.27 | |
| 38 | Fliesen | 15 Tage | Mon 13.09.27 | Fre 01.10.27 | 35 |
| 39 | HLS:Heizkörpermontage, Sanitärobjekte | 20 Tage | Mon 27.09.27 | Fre 22.10.27 | 37 |
| 40 | Trockenbau: Akustikdecken | 30 Tage | Mon 27.09.27 | Fre 05.11.27 | 37 |
| 41 | Elektro-Feininstallation | 15 Tage | Mon 25.10.27 | Fre 12.11.27 | |
| 42 | Parkett: überarbeiten | 15 Tage | Mon 08.11.27 | Fre 26.11.27 | 40 |
| 43 | Bodenleger | 10 Tage | Mon 29.11.27 | Fre 10.12.27 | 42 |
| 44 | Einbauschränke, Garderoben, Lernhäuser | 20 Tage | Mon 10.01.28 | Fre 04.02.28 | |
| 45 | Vorhänge | 10 Tage | Mon 10.01.28 | Fre 21.01.28 | |
| 46 | Abschlussreinigung | 5 Tage | Mon 24.01.28 | Fre 28.01.28 | 45 |
| 47 | OSTERFERIEN | 10 Tage | Mon 10.04.28 | Fre 21.04.28 | |
| 48 | Umzug 2.BA | 10 Tage | Mon 10.04.28 | Fre 21.04.28 | |
| 49 | Demontage Containeranlage | 10 Tage | Mon 10.04.28 | Fre 21.04.28 | |




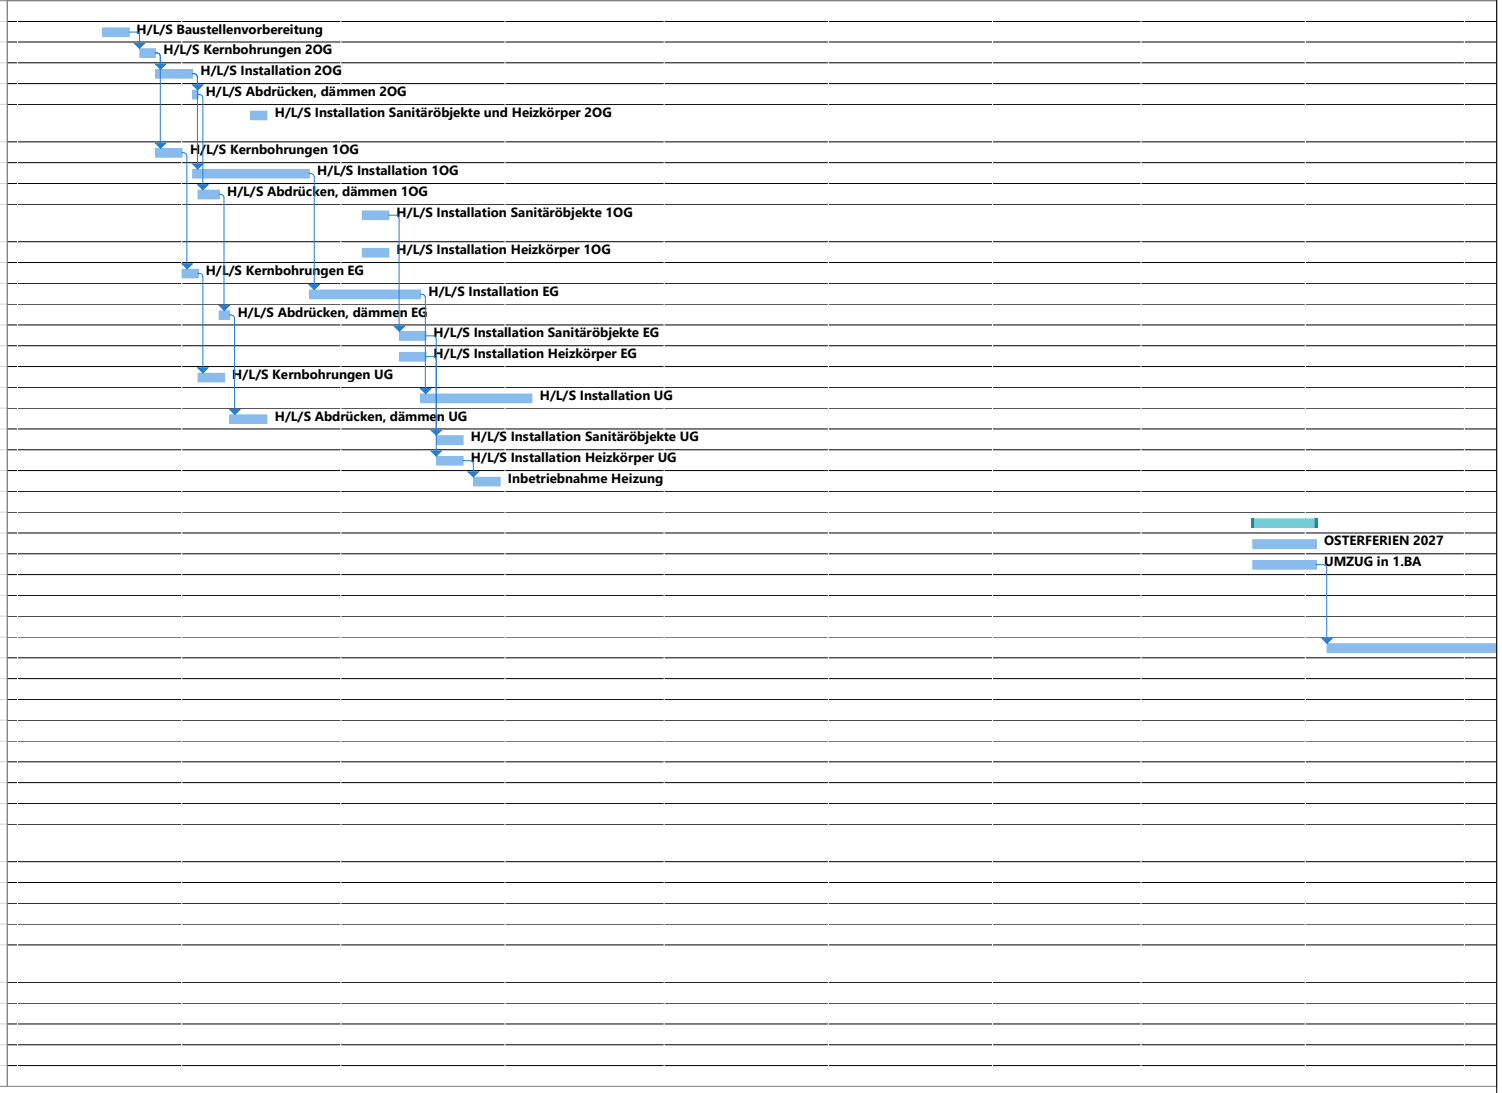


Projekt: 260516_Bauzeitenplan
Datum: Fre 29.05.26

Vorgang | Sammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Nur Dauer | Nur Anfang | Externer Meilenstein | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Projektsammelvorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Ende | Stichtag
Meilenstein | Inaktiver Vorgang | Manueller Vorgang | Manueller Sammelvorgang | Externe Vorgänge | In Arbeit
