
LPH 8 – Bauzeitenplan: Umbau und Erweiterung der Marienschule in Telgte

VORABZUG

Nr.	Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Zuständig
1	1	**Bauzeit (24 Monate)**	**545 Tage**	**Mon 02.11.26**	**Fre 01.12.28**	
2	2	**Rohbau**	**160 Tage**	**Mon 02.11.26**	**Fre 11.06.27**	
3	3	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mon 02.11.26	Fre 06.11.26	
4	4	Erdarbeiten	10 Tage	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26	
5	5	Schotter, GL, SKS, Dämmungen	30 Tage	Mon 23.11.26	Fre 01.01.27	
6	6	Aufzugsunterfahrt und Fundamente	15 Tage	Mon 04.01.27	Fre 22.01.27	
7	7	Bodenplatte	15 Tage	Mon 25.01.27	Fre 12.02.27	
8	8	Blitzschutz	5 Tage	Mon 25.01.27	Fre 29.01.27	
9	9	Stahlbetonwände & Stützen EG	15 Tage	Mon 15.02.27	Fre 05.03.27	
10	10	Abdichten, Dämmen, Anfüllen (Bodenplatte)	10 Tage	Mon 15.02.27	Fre 26.02.27	
11	11	Decke über EG	15 Tage	Mon 08.03.27	Fre 26.03.27	
12	12	Stahlbetonwände und Stützen 1.OG	15 Tage	Mon 29.03.27	Fre 16.04.27	
13	13	Fertigteiltreppe	10 Tage	Mon 29.03.27	Fre 09.04.27	
14	14	Decke über 1. OG	15 Tage	Mon 19.04.27	Fre 07.05.27	
15	15	Attika, Dachbauteile	10 Tage	Mon 10.05.27	Fre 21.05.27	
16	16	Ausschal– und Restarbeiten	15 Tage	Mon 24.05.27	Fre 11.06.27	
17	17	**Gerüstbau**	**60 Tage**	**Mon 08.03.27**	**Fre 28.05.27**	
18	18	Gerüst EG, rückverankert	2 Tage	Mon 08.03.27	Die 09.03.27	
19	19	Gerüst 1. OG, rückverankert	2 Tage	Mon 19.04.27	Die 20.04.27	
20	20	Umbau Gerüst, freistehend	5 Tage	Mon 24.05.27	Fre 28.05.27	
21	21	**Stahlbau**	**75 Tage**	**Mon 24.05.27**	**Fre 03.09.27**	
22	22	Unterkonstruktion RLT Dach	10 Tage	Mon 24.05.27	Fre 04.06.27	
23	23	Vordach Nord	10 Tage	Mon 24.05.27	Fre 04.06.27	
24	24	Außentreppen	10 Tage	Mon 23.08.27	Fre 03.09.27	
25	25	Unterkonstruktion Fassade Außentreppen	10 Tage	Mon 23.08.27	Fre 03.09.27	
26	26	**Dachdecker**	**70 Tage**	**Mon 07.06.27**	**Fre 10.09.27**	
27	27	Sohle abkleben	10 Tage	Mon 07.06.27	Fre 18.06.27	
28	28	Sockel abdichten	10 Tage	Mon 07.06.27	Fre 18.06.27	
29	29	Dach (Notabdichtung)	10 Tage	Mon 07.06.27	Fre 18.06.27	
30	30	Vordach abdichten	2 Tage	Mon 07.06.27	Die 08.06.27	
31	31	Oberlicht/Rauchabzug, Dachausstieg	10 Tage	Mon 21.06.27	Fre 02.07.27	
32	32	Dachabläufe eindichten	5 Tage	Mon 05.07.27	Fre 09.07.27	
33	33	Dämmarbeiten	5 Tage	Mon 12.07.27	Fre 16.07.27	
34	34	Absturzsicherung (Geländer)	5 Tage	Mon 19.07.27	Fre 23.07.27	
35	35	Unterkonstruktion PV	5 Tage	Mon 26.07.27	Fre 30.07.27	
36	36	Aufbau Gründach	15 Tage	Mon 02.08.27	Fre 20.08.27	
37	37	Attikaabdeckung	15 Tage	Mon 23.08.27	Fre 10.09.27	
38	38	**Holzbau, Holzrahmenbau**	**90 Tage**	**Mon 31.05.27**	**Fre 01.10.27**	
39	39	Holzrahmenbau EG	20 Tage	Mon 31.05.27	Fre 25.06.27	
40	40	Holzrahmenbau OG, Attika	20 Tage	Mon 28.06.27	Fre 23.07.27	
41	41	Blechsockel, Dämmung	15 Tage	Fre 06.08.27	Don 26.08.27	
42	42	Montage Vorhangfassade Außentreppen	5 Tage	Mon 06.09.27	Fre 10.09.27	
43	43	Montage VHF allgemein	20 Tage	Mon 06.09.27	Fre 01.10.27	
44	44	**Fenster**	**30 Tage**	**Mon 26.07.27**	**Fre 03.09.27**	
45	45	Erdgeschoss	15 Tage	Mon 26.07.27	Fre 13.08.27	
46	46	Obergeschoss	15 Tage	Mon 16.08.27	Fre 03.09.27	
47	47	**Pfostenriegelfassaden**	**30 Tage**	**Mon 26.07.27**	**Fre 03.09.27**	
48	48	Erdgeschoss	15 Tage	Mon 26.07.27	Fre 13.08.27	
49	49	Obergeschoss	15 Tage	Mon 16.08.27	Fre 03.09.27	
50	50	Gebäude dicht	0 Tage	Fre 01.10.27	Fre 01.10.27	
51	51	**Trockenbau Ständerwerk**	**40 Tage**	**Mon 04.10.27**	**Fre 26.11.27**	
55	55	**Innentüren (Bodeneinstand, BRS)**	**20 Tage**	**Mon 01.11.27**	**Fre 26.11.27**	
58	58	**Tischler (UK Clusterwände)**	**20 Tage**	**Mon 01.11.27**	**Fre 26.11.27**	
61	61	**Estrich**	**55 Tage**	**Mon 29.11.27**	**Fre 11.02.28**	
65	65	**Mobile Trennwand**	**15 Tage**	**Mon 21.02.28**	**Fre 10.03.28**	
68	68	**Innenausbau Tischler**	**60 Tage**	**Mon 06.03.28**	**Fre 26.05.28**	
73	73	**Metallbau**	**10 Tage**	**Mon 06.03.28**	**Fre 17.03.28**	
76	76	**Kautschuk**	**30 Tage**	**Mon 20.03.28**	**Fre 28.04.28**	
81	81	**Fliesen**	**30 Tage**	**Mon 24.04.28**	**Fre 02.06.28**	
85	85	**Betonwerkstein**	**30 Tage**	**Mon 05.06.28**	**Fre 14.07.28**	
88	88	**Trockenbau Abhangdecken**	**35 Tage**	**Mon 17.07.28**	**Fre 01.09.28**	
91	91	**Maler**	**20 Tage**	**Mon 04.09.28**	**Fre 29.09.28**	
94	94	**Leit– und Orientierungssysteme**	**20 Tage**	**Mon 02.10.28**	**Fre 27.10.28**	
97	97	**Schließanlage**	**20 Tage**	**Mon 16.10.28**	**Fre 10.11.28**	
100	100	**Bauendreinigung**	**15 Tage**	**Mon 13.11.28**	**Fre 01.12.28**	
103	103	Fertigstellung	0 Tage	Fre 01.12.28	Fre 01.12.28	

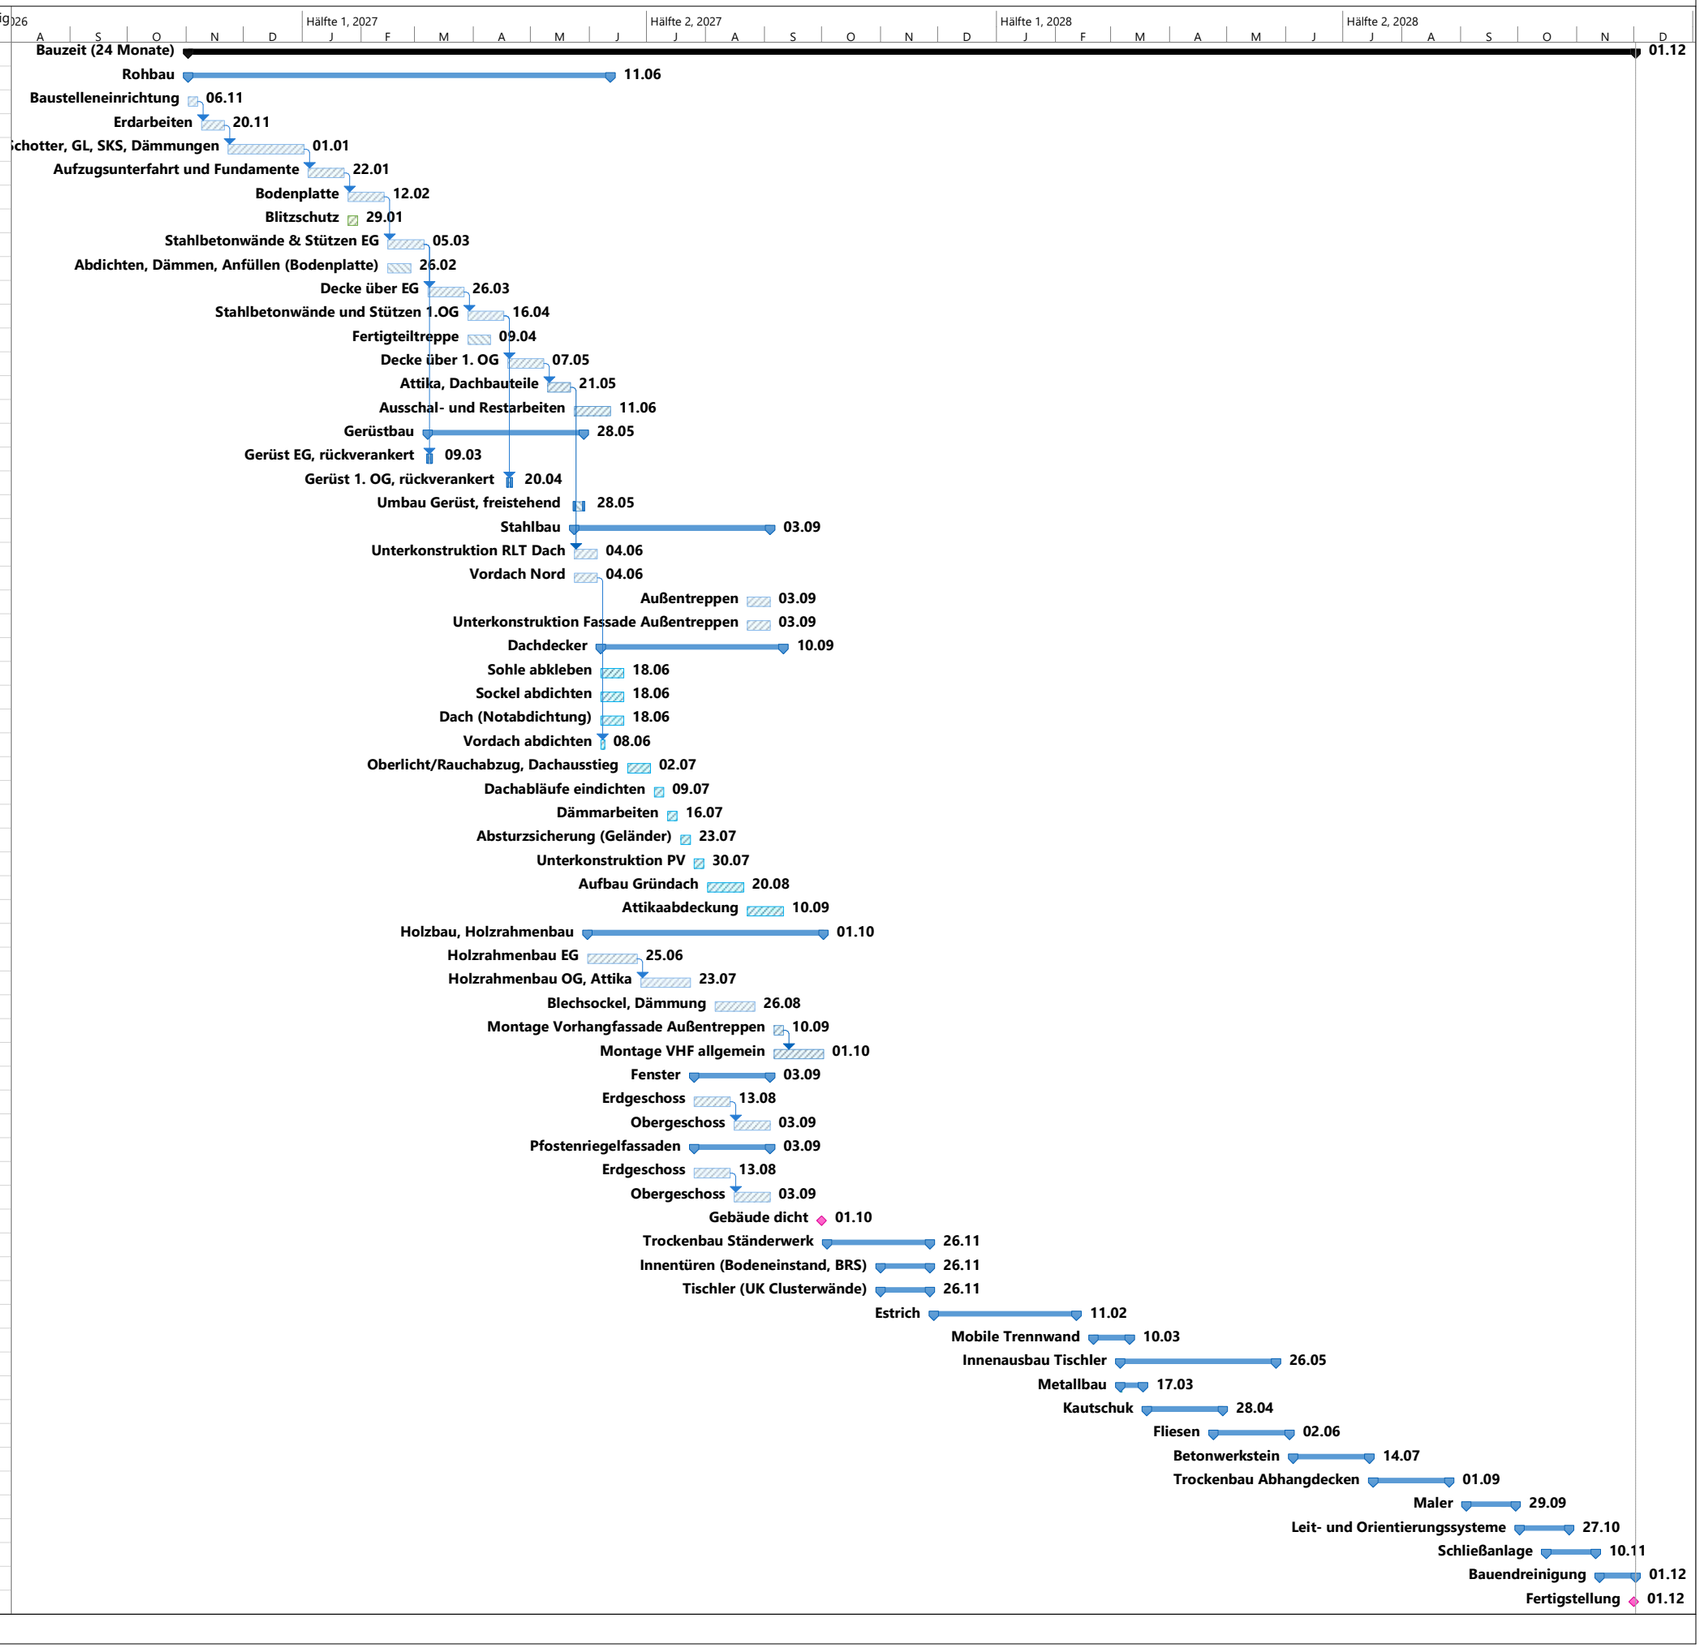

Stand: Mit 24.06.26
