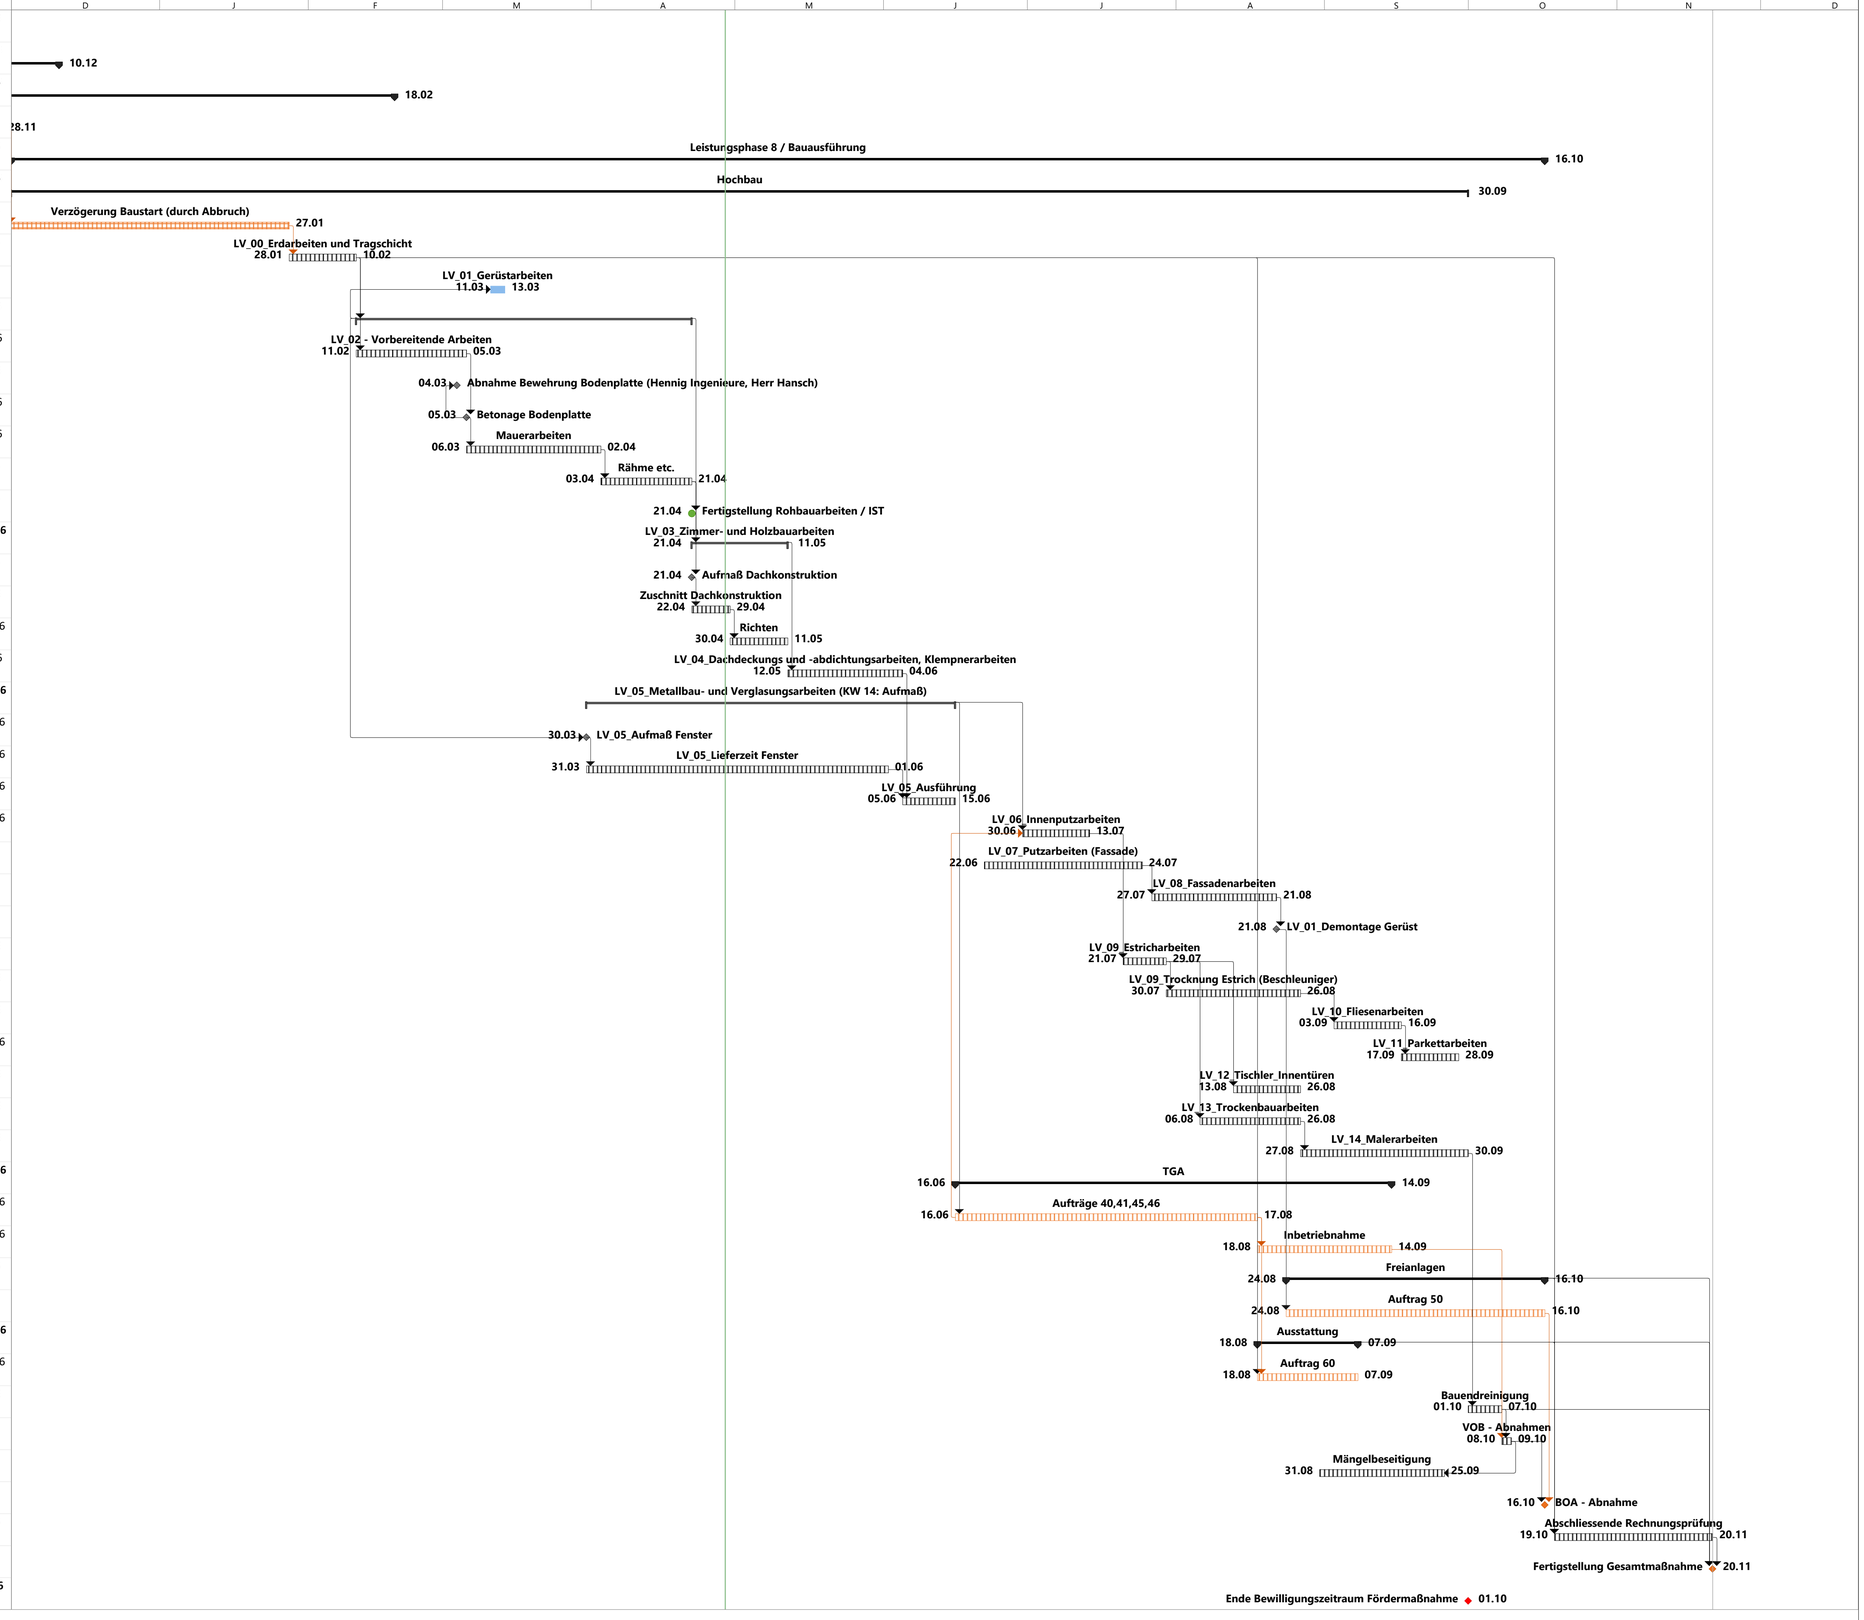Nr.	Vorgangsmodus	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		**Leistungsphase 5 / Ausführungsplanung**	**110 Tage**	**Mit 26.02.25**	**Die 29.07.25**
7		**Leistungsphase 6 / Vorbereitung Vergabe**	**146 Tage**	**Mit 21.05.25**	**Mit 10.12.25**
14		**Leistungsphase 7 / Mitwirkung Vergabe**	**158 Tage**	**Mon 14.07.25**	**Mit 18.02.26**
55		**Verzögerung Abbruch**	65 Tage	Mon 01.09.25	Fre 28.11.25
56		**Leistungsphase 8 / Bauausführung**	**230 Tage**	**Mon 01.12.25**	**Fre 16.10.26**
57		**Hochbau**	**218 Tage**	**Mon 01.12.25**	**Mit 30.09.26**
58		Verzögerung Baustart (durch Abbruch)	42 Tage	Mon 01.12.25	Die 27.01.26
59		LV_00_Erdarbeiten und Tragschicht	10 Tage	Mit 28.01.26	Die 10.02.26
60		LV_01_Gerüstarbeiten	3 Tage	Mit 11.03.26	Fre 13.03.26
61		**LV_02_Rohbauarbeiten**	**50 Tage**	**Mit 11.02.26**	**Die 21.04.26**
62		LV_02 - Vorbereitende Arbeiten	17 Tage	Mit 11.02.26	Don 05.03.26
63		Abnahme Bewehrung Bodenplatte (Hennig Ingenieure, Herr Hansch)	0 Tage	Mit 04.03.26	Mit 04.03.26
64		Betonage Bodenplatte	0 Tage	Don 05.03.26	Don 05.03.26
65		Mauerarbeiten	20 Tage	Fre 06.03.26	Don 02.04.26
66		Rähme etc.	13 Tage	Fre 03.04.26	Die 21.04.26
67		Fertigstellung Rohbauarbeiten / IST	0 Tage	Die 21.04.26	Die 21.04.26
68		**LV_03_Zimmer- und Holzbauarbeiten**	**14 Tage**	**Die 21.04.26**	**Mon 11.05.26**
69		Aufmaß Dachkonstruktion	0 Tage	Die 21.04.26	Die 21.04.26
70		Zuschnitt Dachkonstruktion	6 Tage	Mit 22.04.26	Mit 29.04.26
71		Richten	8 Tage	Don 30.04.26	Mon 11.05.26
72		LV_04_Dachdeckungs und -abdichtungsarbeiten, Klempnerarbeiten	18 Tage	Die 12.05.26	Don 04.06.26
73		**LV_05_Metallbau- und Verglasungsarbeiten (KW 14: Aufmaß)**	**55 Tage**	**Mon 30.03.26**	**Mon 15.06.26**
74		LV_05_Aufmaß Fenster	0 Tage	Mon 30.03.26	Mon 30.03.26
75		LV_05_Lieferzeit Fenster	45 Tage	Die 31.03.26	Mon 01.06.26
76		LV_05_Ausführung	7 Tage	Fre 05.06.26	Mon 15.06.26
77		LV_06_Innenputzarbeiten	10 Tage	Die 30.06.26	Mon 13.07.26
78		LV_07_Putzarbeiten (Fassade)	25 Tage	Mon 22.06.26	Fre 24.07.26
79		LV_08_Fassadenarbeiten	20 Tage	Mon 27.07.26	Fre 21.08.26
80		LV_01_Demontage Gerüst	0 Tage	Fre 21.08.26	Fre 21.08.26
81		LV_09_Estricharbeiten	7 Tage	Die 21.07.26	Mit 29.07.26
82		LV_09_Trocknung Estrich (Beschleuniger)	20 Tage	Don 30.07.26	Mit 26.08.26
83		LV_10_Fliesenarbeiten	10 Tage	Don 03.09.26	Mit 16.09.26
84		LV_11_Parkettarbeiten	8 Tage	Don 17.09.26	Mon 28.09.26
85		LV_12_Tischler_Innentüren	10 Tage	Don 13.08.26	Mit 26.08.26
86		LV_13_Trockenbauarbeiten	15 Tage	Don 06.08.26	Mit 26.08.26
87		LV_14_Malerarbeiten	25 Tage	Don 27.08.26	Mit 30.09.26
88		**TGA**	**65 Tage**	**Die 16.06.26**	**Mon 14.09.26**
89		Aufträge 40,41,45,46	45 Tage	Die 16.06.26	Mon 17.08.26
90		Inbetriebnahme	20 Tage	Die 18.08.26	Mon 14.09.26
91		**Freianlagen**	**40 Tage**	**Mon 24.08.26**	**Fre 16.10.26**
92		Auftrag 50	40 Tage	Mon 24.08.26	Fre 16.10.26
93		**Ausstattung**	**15 Tage**	**Die 18.08.26**	**Mon 07.09.26**
94		Auftrag 60	15 Tage	Die 18.08.26	Mon 07.09.26
95		**Bauendreinigung**	5 Tage	Don 01.10.26	Mit 07.10.26
96		**VOB - Abnahmen**	2 Tage	Don 08.10.26	Fre 09.10.26
97		**Mängelbeseitigung**	20 Tage	Mon 31.08.26	Fre 25.09.26
98		**BOA - Abnahme**	0 Tage	Fre 16.10.26	Fre 16.10.26
99		**Abschliessende Rechnungsprüfung**	**25 Tage**	**Mon 19.10.26**	**Fre 20.11.26**
100		**Fertigstellung Gesamtmaßnahme**	0 Tage	Fre 20.11.26	Fre 20.11.26
101		**Ende Bewilligungszeitraum Fördermaßnahme**	**0 Tage**	**Don 01.10.26**	**Don 01.10.26**
