S15205_Erweiterung Feuerwache Emsdetten

Bauzeitenplan Stand 20.11.2026

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Dauer	Vorgänger	Nachfolger
1	**Bauzeit**	Mon 03.01.22	Mit 01.09.27	1416 Tage?		
2	**Vorbereitende Arbeiten Tiefbau**	**Mon 15.07.24**	**Fre 06.09.24**	**40 Tage**		
6	**Vorbereitende Arbeiten Hochbau**	**Mon 02.09.24**				
12	**Ausführung Hochbau**	**Mon 03.01.22**				
13	**Gerüstarbeiten**	Mon 16.06.25	Fre 08.01.27	383 Tage		
14	Aufbau Gerüst EG	Mon 16.06.25	Mon 23.06.25	5 Tage		
15	Aufbau Gerüst 1. OG	Mon 06.10.25	Don 09.10.25	4 Tage	43;68	
16	Aufbau Gerüst 1. OG über Dachterasse EG	Don 09.10.25	Fre 10.10.25	2 Tage	44AA+3 Tage	
17	Aufbau Gerüst 2. OG	Mon 09.03.26	Fre 13.03.26	5 Tage	45	
18	Demontage Gerüst	Mon 04.01.27	Fre 08.01.27	5 Tage	90AA+18 Tage	135EA+5 Tage
19	**Blitzschutzarbeiten**	Mon 24.03.25	Die 27.05.25	40 Tage		
20	Blitzschutz und Erdungsanlage 1. Lage unter Sauberkeitsschicht	Mon 24.03.25	Die 27.05.25	40 Tage	32AA;31AA	
21	Blitzschutz und Erdungsanlage 2. Lage in der Sohle und Streifenfundamenten	Mon 24.03.25	Die 27.05.25	40 Tage	32AA;31AA	
22	**Rohbauarbeiten**	**Mon 16.12.24**	**Fre 23.10.26**	**446 Tage**		
23	**Vorbereitung und Abbruch**	Mon 16.12.24	Mit 05.02.25	27,5 Tage		
24	Baustelleneinrichtung	Mon 16.12.24	Fre 20.12.24	5 Tage		
25	Sicherungsmaßnahmen, Baustraße	Mon 16.12.24	Die 17.12.24	2 Tage		
26	Abbruch Treppe, Vordach	Mon 16.12.24	Fre 20.12.24	5 Tage		28
27	**Gründung**	Mon 13.01.25	Die 06.05.25	75 Tage		
40	Sockelabdichtung	Mon 21.07.25	Fre 25.07.25	5 Tage	42	
41	**Wände und Decken Rohbau**	Die 03.06.25	Fre 23.10.26	343 Tage		
53	Umbau Bestand Fahrzeughalle	Mon 11.05.26	Mit 03.06.26	16 Tage	48;70	54
54	Umbau Bestand 1.OG	Mon 08.06.26	Fre 26.06.26	15 Tage	53	
55	**Dackdeckerarbeiten**	Mon 08.06.26	Fre 27.11.26	125 Tage		
67	**Metallbauarbeiten vorbereitende Arbeiten**	Mon 30.06.25	Fre 08.05.26	209 Tage		
68	Stahlträger Gerüst einbauen	Mon 30.06.25	Fre 11.07.25	10 Tage		15
69	Fenster im Bestand demontieren	Mon 13.04.26	Fre 24.04.26	10 Tage		70
70	4 Stahlstützen einkürzen D/2 und D/8-9	Mon 27.04.26	Fre 08.05.26	9 Tage	69	53
71	**Metallbauarbeiten Fenster und Türen**	Mon 05.01.26	Fre 23.04.27	324 Tage		
72	Technische Klärung	Mon 05.01.26	Fre 16.01.26	10 Tage		74;76
73	Aufmaß	Mit 01.04.26	Don 02.04.26	2 Tage	46	74EA-5 Tage;77
74	Werkplanung	Fre 27.03.26	Mon 20.04.26	15 Tage	73EA-5 Tage;72	75
75	Prüfung Werkplanung	Die 21.04.26	Mon 27.04.26	5 Tage	74	77EA+5 Tage
76	Materialbestellung	Mon 19.01.26	Fre 20.02.26	25 Tage	72	77
77	Fertigung	Mit 06.05.26	Fre 12.06.26	25 Tage	76;73;75EA+5 Tage	78AA+26 Tage;79AA+10 Tage
78	Fenster, Außentüren Alu	Die 16.06.26	Fre 10.07.26	19 Tage	77AA+26 Tage	49AA+10 Tage;56EA-5 Tage;5
79	Pfosten-Riegel-Fassade Treppenhaus	Don 21.05.26	Don 18.06.26	19 Tage	77AA+10 Tage	49AA+10 Tage;56EA-5 Tage;5
80	Stahlblechtüren T30, T90 etc.	Mon 11.01.27	Fre 29.01.27	15 Tage	77;78;105	
81	Innentürelemente Alu	Mon 11.01.27	Fre 05.02.27	20 Tage	108EA-10 Tage;98	
82	Innentürelemente Alu TH	Mon 19.04.27	Fre 23.04.27	5 Tage	106EA+7 Tage	
83	**Toranlage Werkstatt**	Mon 05.04.27	Die 13.04.27	7 Tage	98	112EA+3 Tage
84	**Stahlbau- und Schlosserarbeiten**	Mon 08.03.27	Don 25.03.27	14 Tage		
85	Treppengeländer Treppenhaus	Mon 08.03.27	Don 25.03.27	14 Tage	101EA+38 Tage	106
86	**Fassadenbau**	Mon 08.03.27	Fre 16.04.27	28 Tage	78;51;52	87
87	**Stahlbau, Außentreppe**	Mon 19.04.27	Fre 21.05.27	23 Tage	86	
88	**Technische Gebäudeausrüstung**	Mon 11.05.26	Mit 12.05.27	249 Tage		
89	Blitzschutz-Ableitungen in Kerndämmung	Mon 11.05.26	Mon 18.05.26	1 W	48	49
90	Blitzschutzarbeiten Dach	Mon 30.11.26	Mit 24.02.27	11 W	66	18AA+18 Tage
91	Vorinstallation SAN RLT ELT HEI	Mon 03.08.26	Mit 10.02.27	26 W	78;56	
92	Installation Fußbodenheizung	Mon 23.11.26	Mit 06.01.27	26 Tage	103AA-2 Tage	
93	Endmontage TGA inkl. PV-Anlage	Mon 01.03.27	Mit 12.05.27	10 W	119EA-5 Tage;120EA-5 Tage;1	
94	**Ausbau**	Mon 27.07.26	Fre 27.08.27	272 Tage		
95	**Innenputzarbeiten**	Mon 31.08.26	Fre 11.12.26	75 Tage		
96	Vorbereitung/Putzbestellung	Mon 31.08.26	Fre 04.09.26	5 Tage		97
97	Innenputz 1. OG Raum "Kühlraum"	Mon 07.09.26	Die 08.09.26	2 Tage	96	98
98	Innenputz EG	Mit 09.09.26	Don 24.09.26	12 Tage	97	112AA+13 Tage;83;81;99
99	Innenputz 2.OG	Fre 25.09.26	Die 13.10.26	13 Tage	98	100
100	Innenputz 1.OG Rest	Mit 14.10.26	Fre 30.10.26	13 Tage	99	101
101	Innenputz Treppenhaus	Mon 23.11.26	Fre 11.12.26	15 Tage	100	85EA+38 Tage
102	**Estricharbeiten**	Mit 25.11.26	Mit 07.04.27	86 Tage		
103	Estricharbeiten 2.OG	Mit 25.11.26	Fre 04.12.26	8 Tage		124EA+49 Tage;119EA+28 Ta
104	Estricharbeiten 1.OG	Fre 27.11.26	Don 10.12.26	10 Tage	103EA-6 Tage	111EA+18 Tage;125EA+40 Ta
105	Estricharbeiten EG	Fre 04.12.26	Fre 08.01.27	19 Tage	104EA-5 Tage	121EA+22 Tage;80;106
106	Estricharbeiten Treppenhaus	Die 30.03.27	Mit 07.04.27	7 Tage	105;85	122EA+25 Tage;117EA+7 Tag
107	**Trockenbauarbeiten**	Mon 27.07.26	Don 25.03.27	166 Tage		
108	GK-Wände und Vorwandmontage 2.OG	Mon 27.07.26	Fre 21.08.26	20 Tage		81EA-10 Tage;109AA+5 Tage
109	GK-Wände und Vorwandmontage 1.OG	Mon 03.08.26	Don 10.09.26	29 Tage	108AA+5 Tage	111;110AA+5 Tage
110	GK-Wände und Vorwandmontage EG	Mon 10.08.26	Fre 25.09.26	35 Tage	109AA+5 Tage	
111	Abhangdecken 1.OG	Mon 15.02.27	Don 25.03.27	29 Tage	109;104EA+18 Tage;128EA-5 T	129;131EA+20 Tage;125
112	**Rüttelklinker**	Mon 19.04.27	Fre 23.04.27	1 W	83EA+3 Tage;98AA+13 Tage	
113	**Aufzug**	Mon 30.11.26	Fre 14.05.27	109 Tage		
114	Werkplanung Aufzug	Mon 30.11.26	Mit 23.12.26	18 Tage		115
115	Prüfung Werkplanung	Mon 04.01.27	Fre 15.01.27	10 Tage	114	116
116	Bestellung und Werksproduktion	Mon 18.01.27	Fre 09.04.27	57 Tage	115	117
117	Montage	Mon 19.04.27	Fre 14.05.27	19 Tage	116;106EA+7 Tage	122
118	**Fliesenarbeiten**	Mon 01.02.27	Fre 04.06.27	84 Tage		
119	Fliesenarbeiten 2.OG	Mon 01.02.27	Fre 12.02.27	9 Tage	103EA+28 Tage	93EA-5 Tage;124EA+10 Tage
120	Fliesenarbeiten 1.OG	Die 09.02.27	Fre 05.03.27	19 Tage	104EA+23 Tage	93EA-5 Tage;125EA+9 Tage
121	Fliesenarbeiten EG	Mon 15.02.27	Fre 12.03.27	20 Tage	105EA+22 Tage	93EA-15 Tage;131
122	Fliesenarbeiten Treppenhaus	Die 18.05.27	Fre 04.06.27	13 Tage	117;106EA+25 Tage	136
123	**Bodenbelagsarbeiten**	Mon 08.03.27	Fre 16.04.27	28 Tage		
124	Bodenbelagsarbeiten 2.OG	Mon 08.03.27	Don 25.03.27	14 Tage	103EA+49 Tage;126AA+19 Ta	125
125	Bodenbelagsarbeiten 1.OG	Die 30.03.27	Fre 16.04.27	14 Tage	104EA+40 Tage;126AA;124;12	129EA+10 Tage
126	**Malerarbeiten**	**Die 09.02.27**	**Fre 18.06.27**	**89 Tage**	103EA+38 Tage	130;124AA+19 Tage;125AA;1
127	**Mobile Trennwandanlage**	Mon 01.02.27	Fre 04.06.27	84 Tage		
128	UK Mobiltrennwand in Abhangdecke	Mon 01.02.27	Fre 19.02.27	14 Tage	104EA+29 Tage	132;111EA-5 Tage
129	Montage Mobiltrennwände	Mon 03.05.27	Fre 04.06.27	22 Tage	111;125EA+10 Tage	132
130	**Innentüren**	Mon 21.06.27	Fre 09.07.27	15 Tage	126	132
131	**WC-Trennwände**	Mon 07.06.27	Fre 18.06.27	10 Tage	111EA+20 Tage;121;126EA-10	132
132	**Schliessanlage**	Mon 12.07.27	Die 20.07.27	7 Tage	129;128;130;131;126	133
133	**Bauschlussreinigung**	Mit 21.07.27	Fre 30.07.27	8 Tage	132	134
134	Einbaumöbel, Küche etc. bauseits	Mon 02.08.27	Fre 27.08.27	4 W	133	
135	**Außenanlagen**	Mon 15.03.27	Fre 16.07.27	85 Tage	18EA+5 Tage	137EA+4 Tage
136	**Mangelbeseitigung und Abnahmen**	Mon 07.06.27	Fre 27.08.27	60 Tage	122	137EA+3 Tage
137	**Übergabe und Inbetriebnahme**	**Mit 01.09.27**	**Mit 01.09.27**	**0 W**	136EA+3 Tage;135EA+4 Tage	

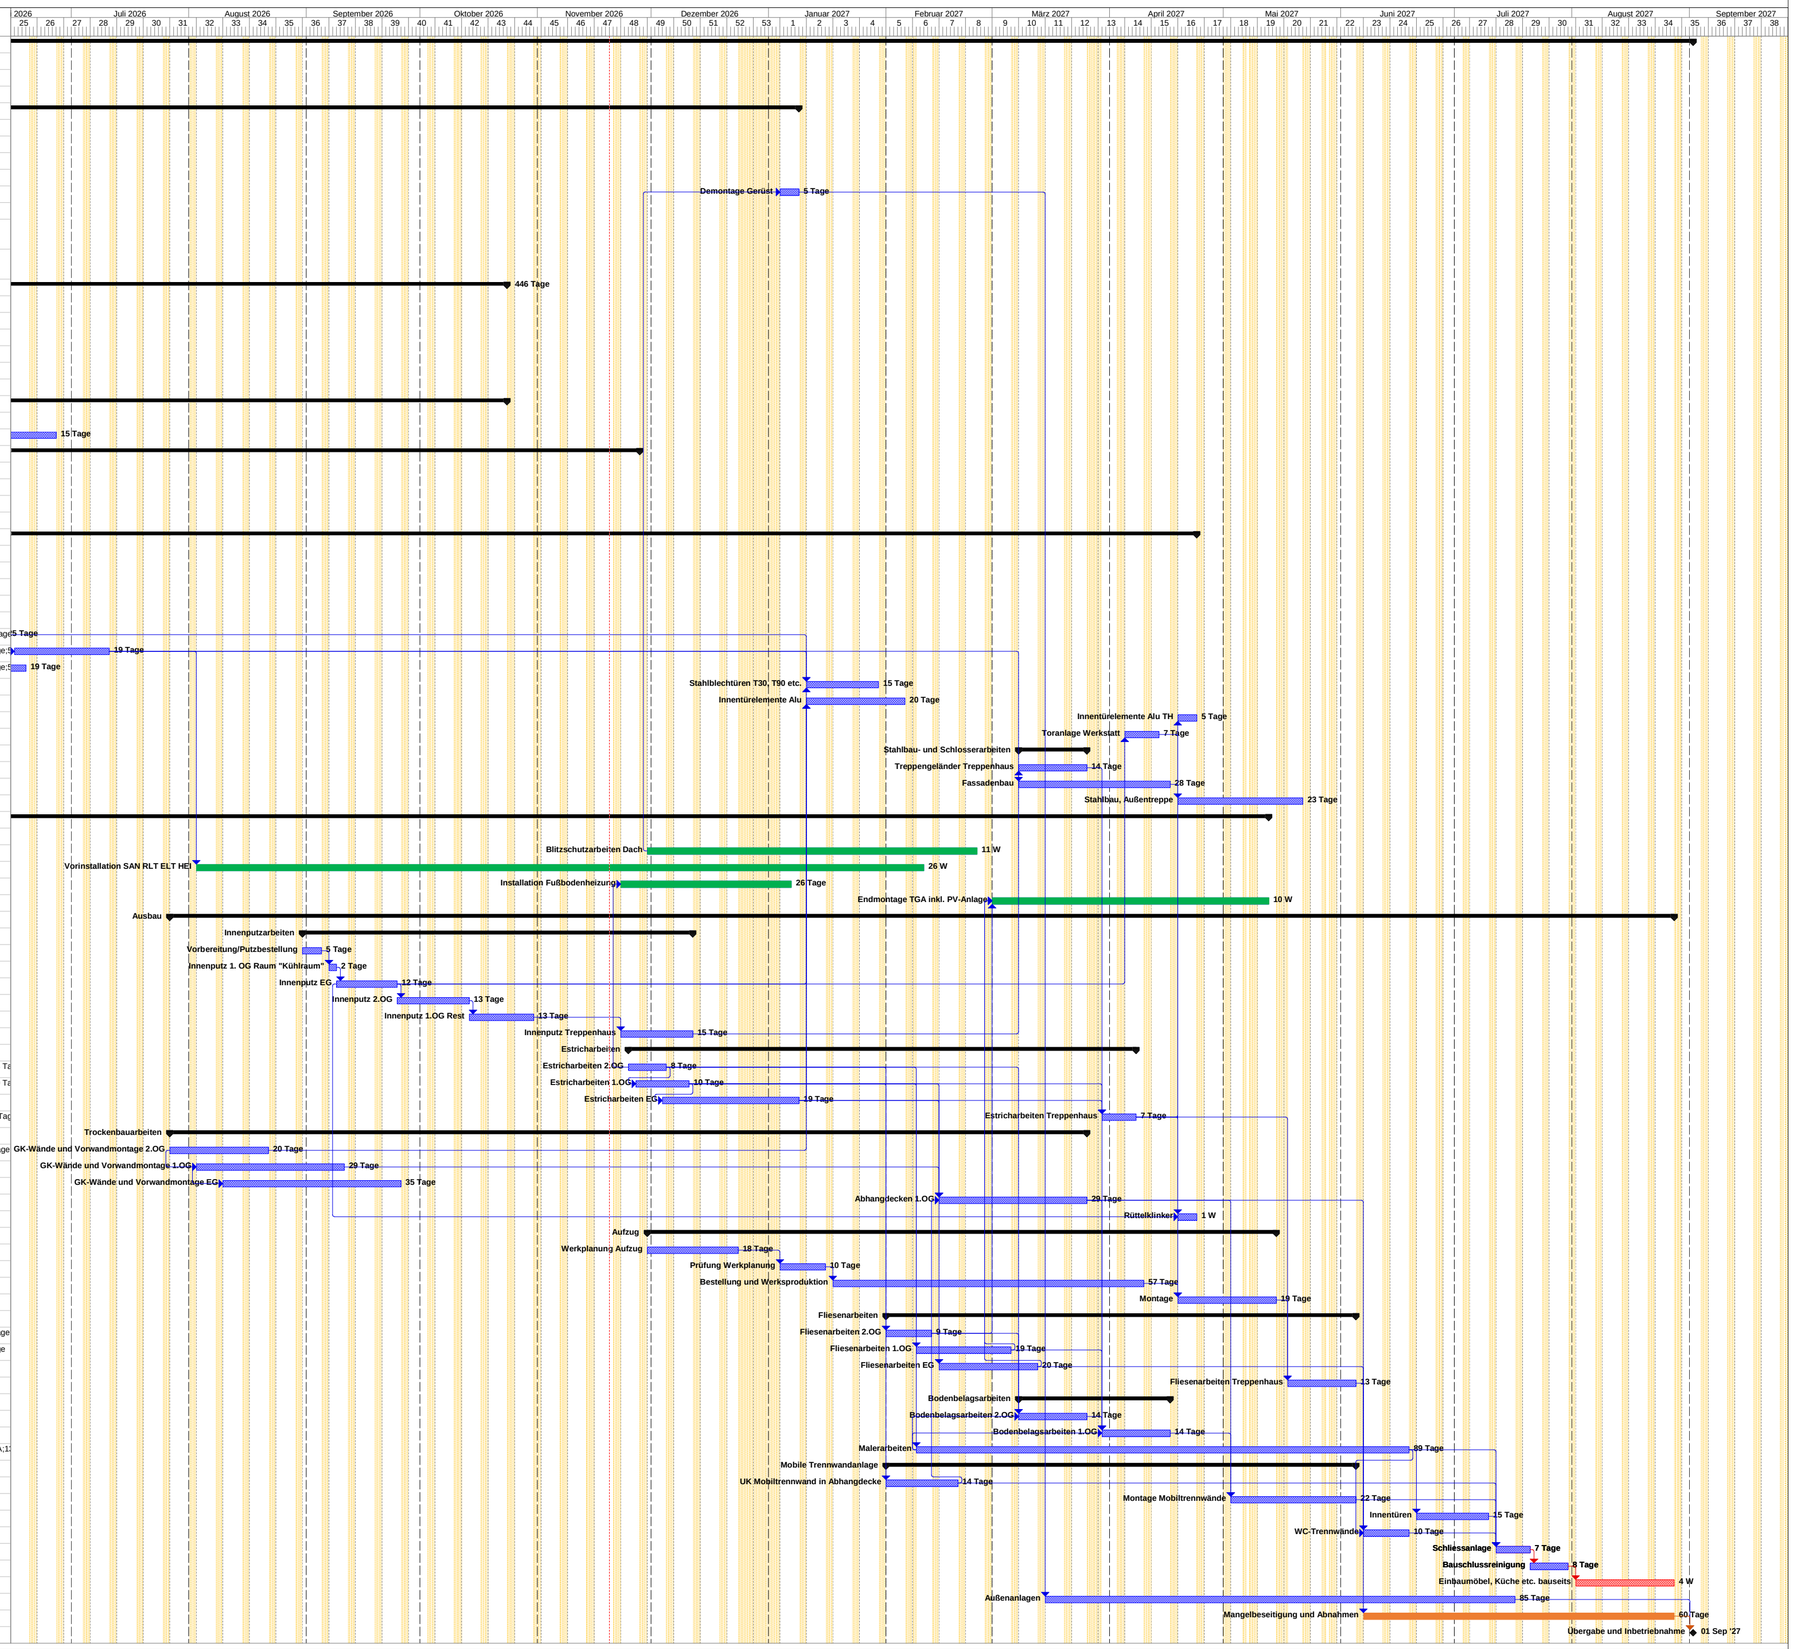

LP 1-7: Planer | LP 8: Ausführung | LP 4: Genehmigungsphase | LP 8: Ausführung | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | LP 8 TGA GEWERK

\\storage-server\s\52h\S15205_Erweiterung_des_Schwarz-Weiß-Bereichs_Feuerwache_Stadt_Emsdetten\06_Projekt\03_Termine\02_Bauzeitenplan\261120_S15205_Bauzeitenplan.mpp
