
# S15205_Erweiterung Feuerwache Emsdetten

# Bauzeitenplan Stand 30.10.2026 - Gewerk Mobile Trennwandanlage

| Nr. | Vorgangsname | Anfang | Ende | Dauer | Vorgänger | Nachfolger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Bauzeit** | Mon 03.01.22 | Mit 01.09.27 | 1416 Tage? | | |
| 2 | **Vorbereitende Arbeiten Tiefbau** | **Mon 15.07.24** | **Fre 06.09.24** | **40 Tage** | | |
| 6 | **Vorbereitende Arbeiten Hochbau** | **Mon 02.09.24** | | | | |
| 12 | **Ausführung Hochbau** | **Mon 03.01.22** | | | | |
| 13 | **Gerüstarbeiten** | Mon 16.06.25 | Fre 08.01.27 | 383 Tage | | |
| 14 | Aufbau Gerüst EG | Mon 16.06.25 | Mon 23.06.25 | 5 Tage | | |
| 15 | Aufbau Gerüst 1. OG | Mon 06.10.25 | Don 09.10.25 | 4 Tage | 43;68 | |
| 16 | Aufbau Gerüst 1. OG über Dachterasse EG | Don 09.10.25 | Fre 10.10.25 | 2 Tage | 44AA+3 Tage | |
| 17 | Aufbau Gerüst 2. OG | Mon 09.03.26 | Fre 13.03.26 | 5 Tage | 45 | |
| 18 | Demontage Gerüst | Mon 04.01.27 | Fre 08.01.27 | 5 Tage | 89AA+18 Tage | 134EA+5 Tage;85 |
| 19 | **Blitzschutzarbeiten** | Mon 24.03.25 | Die 27.05.25 | 40 Tage | | |
| 20 | Blitzschutz und Erdungsanlage 1. Lage unter Sauberkeitsschicht | Mon 24.03.25 | Die 27.05.25 | 40 Tage | 32AA;31AA | |
| 21 | Blitzschutz und Erdungsanlage 2. Lage in der Sohle und Streifenfundamenten | Mon 24.03.25 | Die 27.05.25 | 40 Tage | 32AA;31AA | |
| 22 | **Rohbauarbeiten** | **Mon 16.12.24** | **Fre 23.10.26** | **446 Tage** | | |
| 23 | **Vorbereitung und Abbruch** | Mon 16.12.24 | Mit 05.02.25 | 27,5 Tage | | |
| 24 | Baustelleneinrichtung | Mon 16.12.24 | Fre 20.12.24 | 5 Tage | | |
| 25 | Sicherungsmaßnahmen, Baustraße | Mon 16.12.24 | Die 17.12.24 | 2 Tage | | |
| 26 | Abbruch Treppe, Vordach | Mon 16.12.24 | Fre 20.12.24 | 5 Tage | | 28 |
| 27 | **Gründung** | Mon 13.01.25 | Die 06.05.25 | 75 Tage | | |
| 40 | Sockelabdichtung | Mon 21.07.25 | Fre 25.07.25 | 5 Tage | 42 | |
| 41 | **Wände und Decken Rohbau** | Die 03.06.25 | Fre 23.10.26 | 343 Tage | | |
| 53 | Umbau Bestand Fahrzeughalle | Mon 11.05.26 | Mit 03.06.26 | 16 Tage | 48;70 | 54 |
| 54 | Umbau Bestand 1.OG | Mon 08.06.26 | Fre 26.06.26 | 15 Tage | 53 | |
| 55 | **Dackdeckerarbeiten** | Mon 08.06.26 | Fre 27.11.26 | 125 Tage | | |
| 67 | **Metallbauarbeiten vorbereitende Arbeiten** | Mon 30.06.25 | Fre 08.05.26 | 209 Tage | | |
| 68 | Stahlträger Gerüst einbauen | Mon 30.06.25 | Fre 11.07.25 | 10 Tage | | 15 |
| 69 | Fenster im Bestand demontieren | Mon 13.04.26 | Fre 24.04.26 | 10 Tage | | 70 |
| 70 | 4 Stahlstützen einkürzen D/2 und D/8-9 | Mon 27.04.26 | Fre 08.05.26 | 9 Tage | 69 | 53 |
| 71 | **Metallbauarbeiten Fenster und Türen** | Mon 05.01.26 | Fre 18.12.26 | 244 Tage | | |
| 82 | **Toranlage Werkstatt** | Mon 01.03.27 | Fre 05.03.27 | 5 Tage | 97 | 110EA+5 Tage |
| 83 | **Stahlbau- und Schlosserarbeiten** | Mon 25.01.27 | Die 13.04.27 | 54 Tage | | |
| 84 | Treppengeländer Treppenhaus | Mon 25.01.27 | Mon 15.02.27 | 15 Tage | 100EA+38 Tage | |
| 85 | Stahlbau, Außentreppe | Mon 08.03.27 | Die 13.04.27 | 25 Tage | 18 | |
| 86 | **Fassadenbau** | Die 09.02.27 | Fre 19.03.27 | 29 Tage | 78;51;52 | |
| 87 | **Technische Gebäudeausrüstung** | Mon 11.05.26 | Mit 12.05.27 | 249 Tage | | |
| 88 | Blitzschutz-Ableitungen in Kerndämmung | Mon 11.05.26 | Mon 18.05.26 | 1 W | 48 | 49 |
| 89 | Blitzschutzarbeiten Dach | Mon 30.11.26 | Mit 24.02.27 | 11 W | 66 | 18AA+18 Tage |
| 90 | Vorinstallation SAN RLT ELT HEI | Mon 03.08.26 | Mit 10.02.27 | 26 W | 78;56 | |
| 91 | Installation Fußbodenheizung | Mon 26.10.26 | Mit 23.12.26 | 43 Tage | 102AA-5 Tage | |
| 92 | Endmontage TGA inkl. PV-Anlage | Mon 15.03.27 | Mit 12.05.27 | 8 W | 117EA-10 Tage;118EA-10 Tage | |
| 93 | **Ausbau** | Mon 27.07.26 | Fre 13.08.27 | 262 Tage | | |
| 94 | **Innenputzarbeiten** | Mon 31.08.26 | Fre 20.11.26 | 60 Tage | | |
| 95 | Vorbereitung/Putzbestellung | Mon 31.08.26 | Fre 04.09.26 | 5 Tage | | 96 |
| 96 | Innenputz 1. OG Raum "Kühlraum" | Mon 07.09.26 | Die 08.09.26 | 2 Tage | 95 | 97 |
| 97 | Innenputz EG | Mit 09.09.26 | Don 24.09.26 | 12 Tage | 96 | 110AA+13 Tage;82 |
| 98 | Innenputz 2.OG | Fre 25.09.26 | Die 13.10.26 | 13 Tage | 97 | 99;80AA-5 Tage |
| 99 | Innenputz 1.OG Rest | Mit 14.10.26 | Fre 30.10.26 | 13 Tage | 98 | 100 |
| 100 | Innenputz Treppenhaus | Mon 02.11.26 | Fre 20.11.26 | 15 Tage | 99 | 84EA+38 Tage |
| 101 | **Estricharbeiten** | Mon 02.11.26 | Die 12.01.27 | 45 Tage | | |
| 102 | Estricharbeiten 2.OG | Mon 02.11.26 | Fre 20.11.26 | 15 Tage | | 123EA+52 Tage;11 |
| 103 | Estricharbeiten 1.OG | Mon 16.11.26 | Fre 11.12.26 | 20 Tage | 102EA-5 Tage | 109EA+18 Tage;12 |
| 104 | Estricharbeiten EG | Mon 07.12.26 | Die 12.01.27 | 20 Tage | 103EA-5 Tage | 119EA+22 Tage;12 |
| 105 | **Trockenbauarbeiten** | Mon 27.07.26 | Don 25.03.27 | 166 Tage | | |
| 106 | GK-Wände und Vorwandmontage 2.OG | Mon 27.07.26 | Fre 21.08.26 | 20 Tage | | 81EA-10 Tage;107 |
| 107 | GK-Wände und Vorwandmontage 1.OG | Mon 03.08.26 | Don 10.09.26 | 29 Tage | 106AA+5 Tage | 109;108AA+5 Tage |
| 108 | GK-Wände und Vorwandmontage EG | Mon 10.08.26 | Fre 25.09.26 | 35 Tage | 107AA+5 Tage | |
| 109 | Abhangdecken 1.OG | Mon 15.02.27 | Don 25.03.27 | 29 Tage | 107;103EA+18 Tage;127EA-5 | 128;130EA+20 Tag |
| 110 | **Rüttelklinker** | Mon 15.03.27 | Fre 19.03.27 | 1 W | 82EA+5 Tage;97AA+13 Tage | |
| 111 | **Aufzug** | Mon 09.11.26 | Mon 05.04.27 | 96 Tage | | |
| 112 | Werkplanung Aufzug | Mon 09.11.26 | Fre 27.11.26 | 15 Tage | | 113 |
| 113 | Prüfung Werkplanung | Mon 30.11.26 | Fre 04.12.26 | 5 Tage | 112 | 114 |
| 114 | Bestellung und Werksproduktion | Mon 07.12.26 | Fre 05.03.27 | 57 Tage | 113 | 115 |
| 115 | Montage | Mon 08.03.27 | Mon 05.04.27 | 19 Tage | 104EA+15 Tage;114 | 121 |
| 116 | **Fliesenarbeiten** | Mon 11.01.27 | Fre 23.04.27 | 72 Tage | | |
| 117 | Fliesenarbeiten 2.OG | Mon 11.01.27 | Fre 22.01.27 | 10 Tage | 102EA+28 Tage | 92EA-10 Tage;123 |
| 118 | Fliesenarbeiten 1.OG | Mon 25.01.27 | Fre 19.02.27 | 19 Tage | 103EA+23 Tage | 92EA-10 Tage;124 |
| 119 | Fliesenarbeiten EG | Mon 15.02.27 | Fre 12.03.27 | 20 Tage | 104EA+22 Tage | 92EA-15 Tage;130; |
| 120 | Fliesenarbeiten Treppenläufe und Podeste | Mon 15.03.27 | Die 06.04.27 | 15 Tage | 119 | 92EA-15 Tage;130 |
| 121 | Fliesenarbeiten Treppenhaus | Die 06.04.27 | Fre 23.04.27 | 14 Tage | 102;104EA+30 Tage;115 | |
| 122 | **Bodenbelagsarbeiten** | Mit 17.02.27 | Fre 23.04.27 | 46 Tage | | |
| 123 | Bodenbelagsarbeiten 2.OG | Mit 17.02.27 | Die 09.03.27 | 15 Tage | 102EA+52 Tage;125AA+21 Ta | 124 |
| 124 | Bodenbelagsarbeiten 1.OG | Die 30.03.27 | Fre 23.04.27 | 19 Tage | 103EA+40 Tage;125AA;123;11 | 128EA+5 Tage |
| 125 | **Malerarbeiten** | **Mon 18.01.27** | **Fre 28.05.27** | **89 Tage** | 102EA+33 Tage | 129EA+2 Tage;123 |
| 126 | **Mobile Trennwandanlage** | Mon 01.02.27 | Fre 04.06.27 | 84 Tage | | |
| 127 | UK Mobiltrennwand in Abhangdecke | Mon 01.02.27 | Fre 19.02.27 | 14 Tage | 103EA+28 Tage | 131;109EA-5 Tage |
| 128 | Montage Mobiltrennwände | Mon 03.05.27 | Fre 04.06.27 | 22 Tage | 109;124EA+5 Tage | 131 |
| 129 | **Innentüren** | Mit 02.06.27 | Fre 25.06.27 | 18 Tage | 125EA+2 Tage | 131 |
| 130 | **WC-Trennwände** | Don 13.05.27 | Fre 28.05.27 | 10 Tage | 109EA+20 Tage;119;125EA-10 | 131 |
| 131 | **Schliessanlage** | Mon 28.06.27 | Die 06.07.27 | 7 Tage | 128;127;129;130;125 | 132 |
| 132 | **Bauschlussreinigung** | Mit 07.07.27 | Fre 16.07.27 | 8 Tage | 131 | 133 |
| 133 | Einbaumöbel, Küche etc. bauseits | Mon 19.07.27 | Fre 13.08.27 | 4 W | 132 | |
| 134 | **Außenanlagen** | Mon 25.01.27 | Fre 16.07.27 | 119 Tage | 18EA+5 Tage | 136EA+4 Tage |
| 135 | **Mangelbeseitigung und Abnahmen** | Mon 31.05.27 | Fre 27.08.27 | 65 Tage | 125 | 136EA+3 Tage |
| 136 | **Übergabe und Inbetriebnahme** | **Mit 01.09.27** | **Mit 01.09.27** | **0 W** | 135EA+3 Tage;134EA+4 Tage | |




LP 1-7: Planer | LP 8: Ausführung | LP 4: Genehmigungsphase | LP 8: Ausführung | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | LP 8 TGA GEWERK

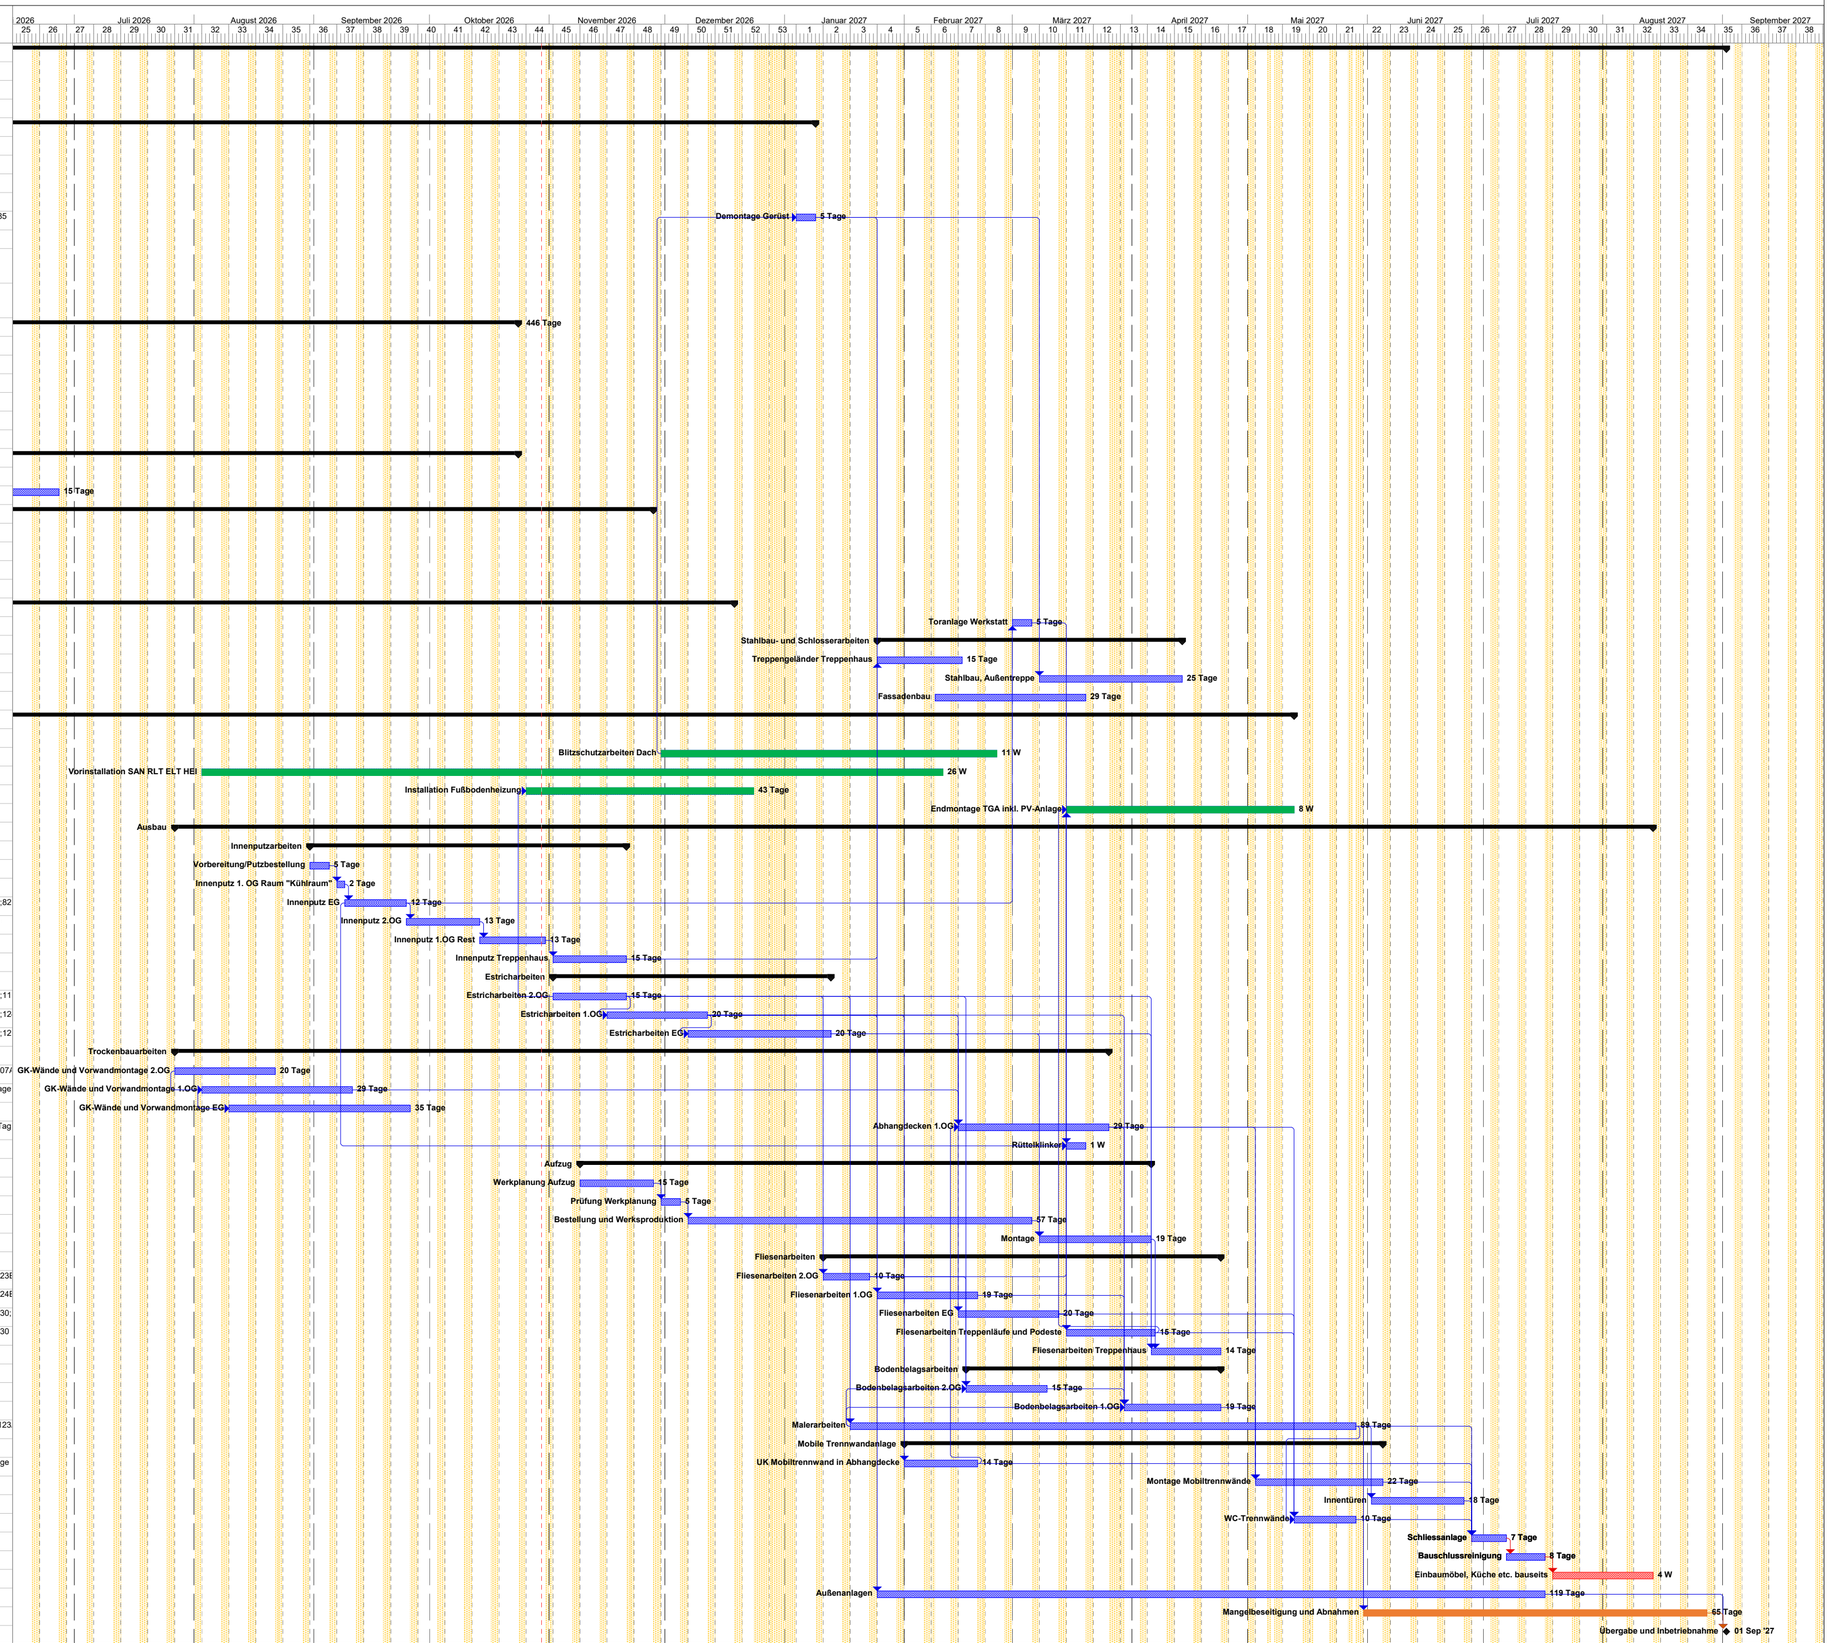

\\Storage-server\s\52h\S15205_Erweiterung_des_Schwarz-Weiß-Bereichs_Feuerwache_Stadt_Emsdetten\06_Projekt\03_Termine\02_Bauzeitenplan\261030_S15205_Bauzeitenplan_Mobile_Trennwand.mpp
