Projekt: Sanierung und Erweiterung der Kardinal-von-Galen-Schule und Errichtung einer Zweifeldsporthalle, Stadt Emsdetten
Projektnr.: 22021

Rahmenterminplan

bauwerkwettringen
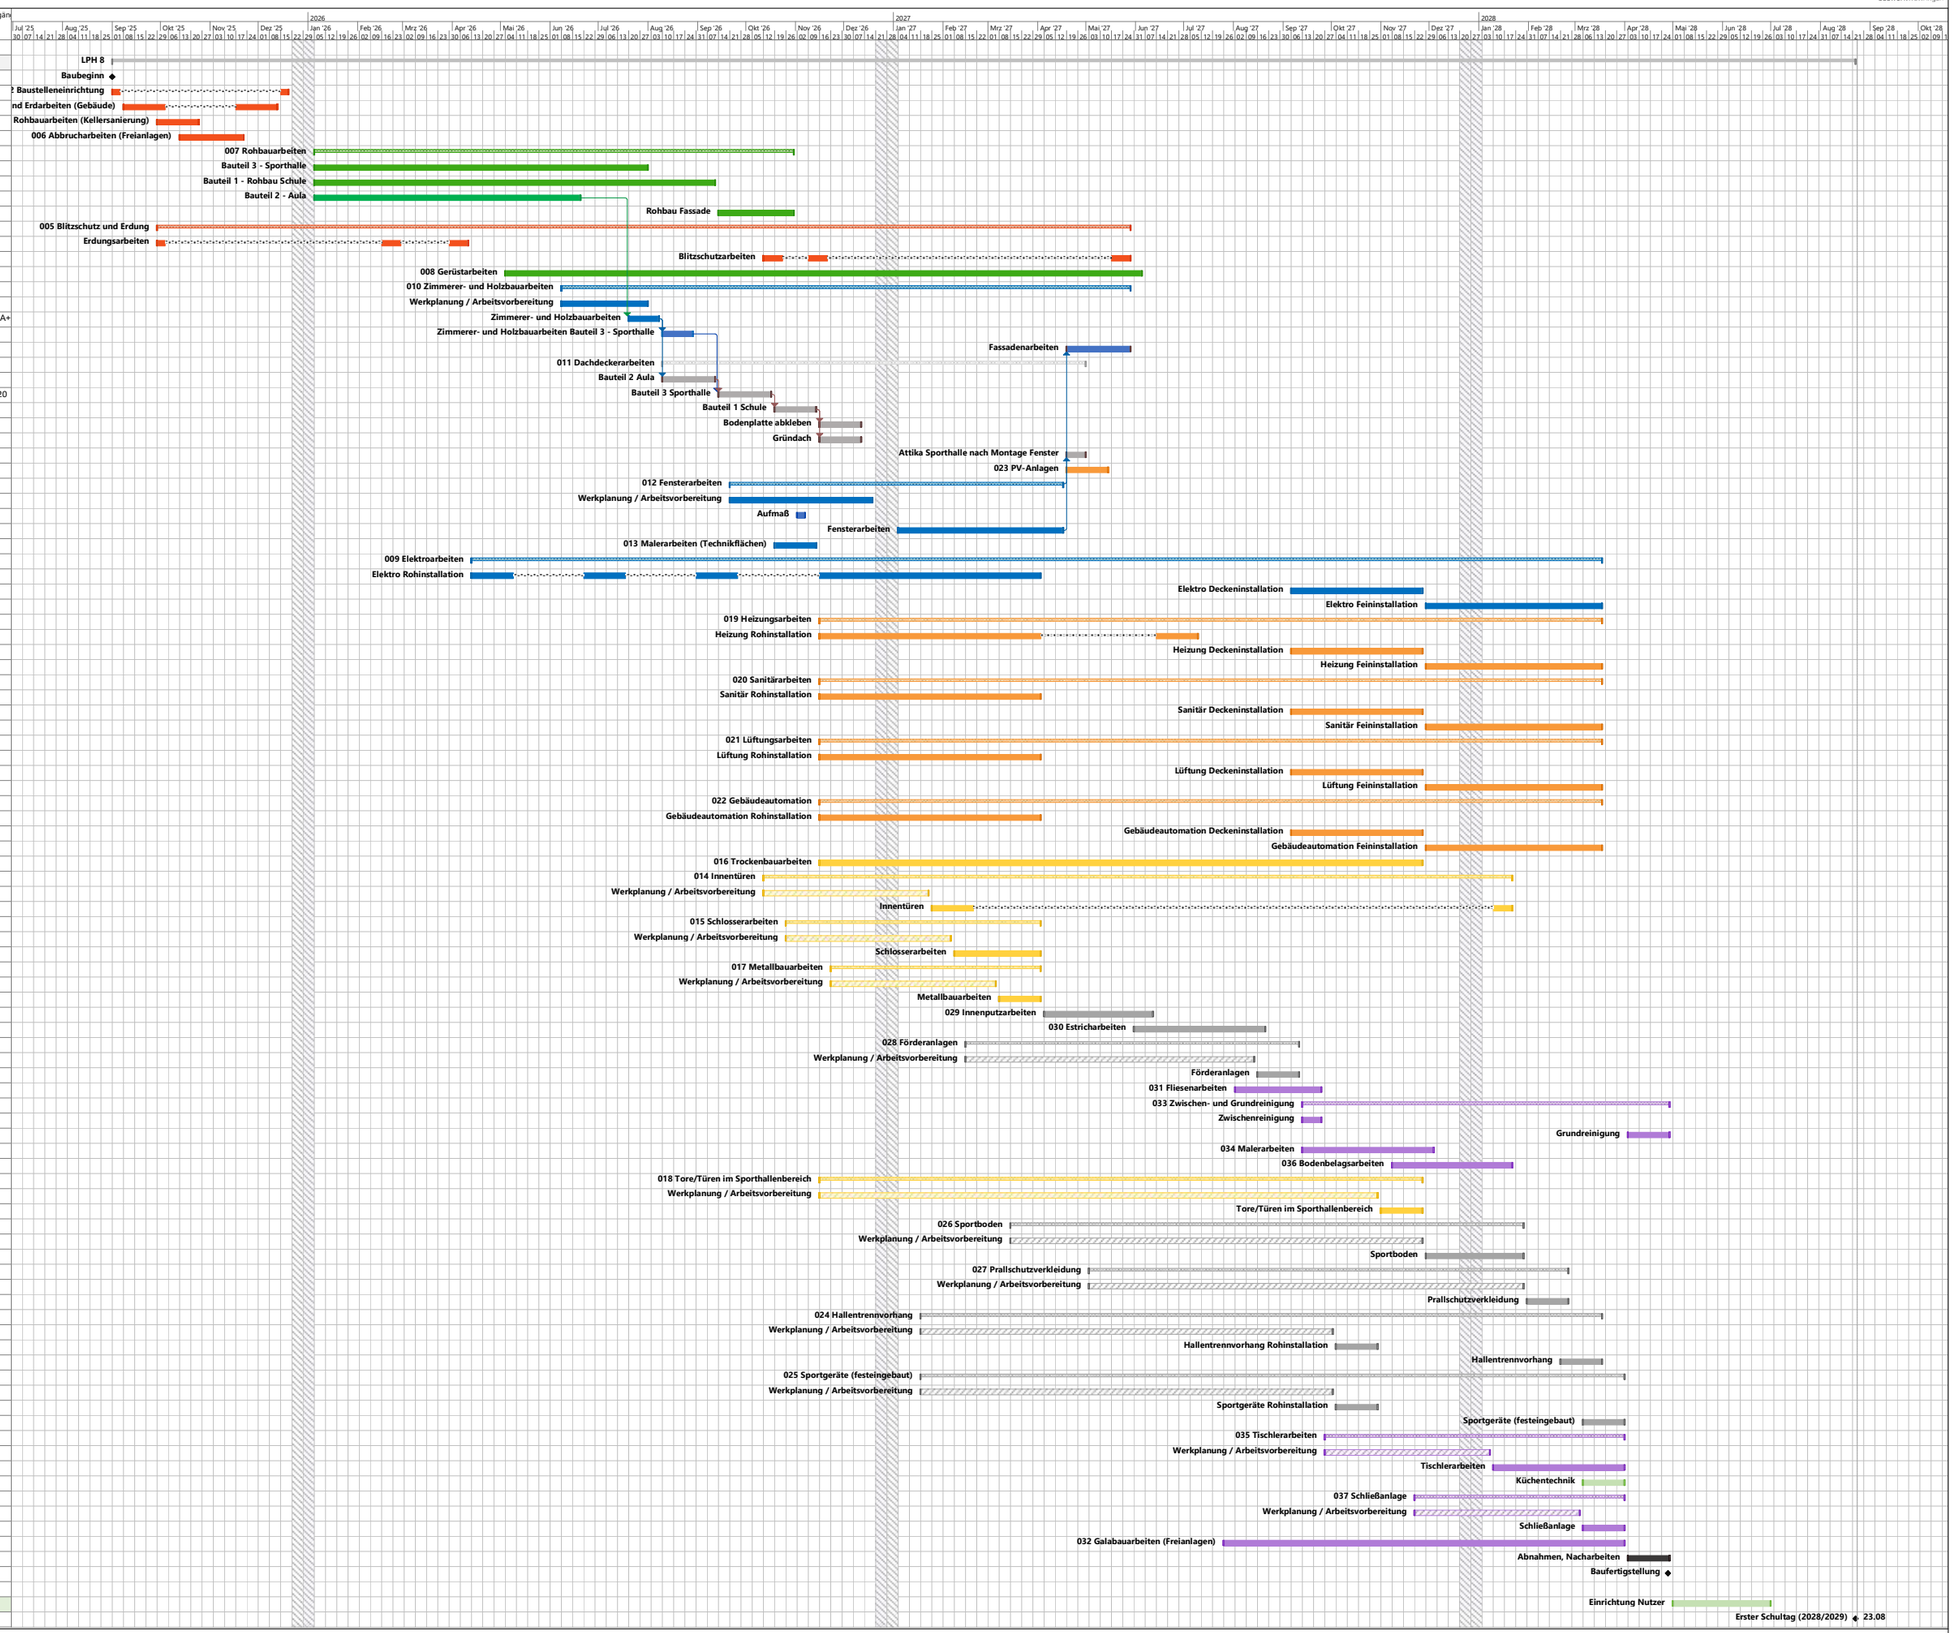
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgän
1					
2	**Leistungsphase 8**	**747 Tage**	**Mon 01.09.25**	**Mit 23.08.28**	
3	Baubeginn	0 Tage	Mon 01.09.25	Mon 01.09.25	
4	**002 Baustelleneinrichtung**	10 Tage	Mon 01.09.25	Fre 19.12.25	
5	**003 Abbruch- und Erdarbeiten (Gebäude)**	40 Tage	Mon 08.09.25	Fre 12.12.25	
6	**004 Rohbauarbeiten (Kellersanierung)**	20 Tage	Mon 29.09.25	Fre 24.10.25	
7	**006 Abbrucharbeiten (Freianlagen)**	30 Tage	Mon 13.10.25	Fre 21.11.25	
8	**007 Rohbauarbeiten**	215 Tage	Mon 05.01.26	Fre 30.10.26	
9	Bauteil 3 - Sporthalle	150 Tage	Mon 05.01.26	Fre 31.07.26	
10	Bauteil 1 - Rohbau Schule	180 Tage	Mon 05.01.26	Fre 11.09.26	
11	Bauteil 2 - Aula	120 Tage	Mon 05.01.26	Fre 19.06.26	
12	Rohbau Fassade	35 Tage	Mon 14.09.26	Fre 30.10.26	
13	**005 Blitzschutz und Erdung**	415 Tage	Mon 29.09.25	Fre 28.05.27	
14	Erdungsarbeiten	25 Tage	Mon 29.09.25	Fre 10.04.26	
15	Blitzschutzarbeiten	30 Tage	Mon 12.10.26	Fre 28.05.27	
16	**008 Gerüstarbeiten**	275 Tage	Mon 04.05.26	Fre 04.06.27	
17	**010 Zimmerer- und Holzbauarbeiten**	245 Tage	Mon 08.06.26	Fre 28.05.27	
18	Werkplanung / Arbeitsvorbereitung	40 Tage	Mon 08.06.26	Fre 31.07.26	
19	Zimmerer- und Holzbauarbeiten Bauteil 2 - Aula	15 Tage	Mon 20.07.26	Fre 07.08.26	11EA+
20	Zimmerer- und Holzbauarbeiten Bauteil 3 - Sporthalle	15 Tage	Mon 10.08.26	Fre 28.08.26	19
21	Fassadenarbeiten	30 Tage	Mon 19.04.27	Fre 28.05.27	30
22	**011 Dachdeckerarbeiten**	180 Tage	Mon 10.08.26	Fre 30.04.27	
23	Bauteil 2 Aula	25 Tage	Mon 10.08.26	Fre 11.09.26	19
24	Bauteil 3 Sporthalle	25 Tage	Mon 14.09.26	Fre 16.10.26	23;20
25	Bauteil 1 Schule	20 Tage	Mon 19.10.26	Fre 13.11.26	24
26	Bodenplatte abkleben	20 Tage	Mon 16.11.26	Fre 11.12.26	25
27	Gründach	20 Tage	Mon 16.11.26	Fre 11.12.26	25
28	Attika Sporthalle nach Montage Fenster	10 Tage	Mon 19.04.27	Fre 30.04.27	33
29	**023 PV-Anlagen**	20 Tage	Mon 19.04.27	Fre 14.05.27	
30	**012 Fensterarbeiten**	140 Tage	Mon 21.09.26	Fre 16.04.27	
31	Werkplanung / Arbeitsvorbereitung	65 Tage	Mon 21.09.26	Fre 18.12.26	
32	Fensteraufmaß	5 Tage	Mon 02.11.26	Fre 06.11.26	
33	Fensterarbeiten	75 Tage	Mon 04.01.27	Fre 16.04.27	
34	**013 Malerarbeiten (Technikflächen)**	20 Tage	Mon 19.10.26	Fre 13.11.26	
35	**009 Elektroarbeiten**	485 Tage	Mon 13.04.26	Fre 17.03.28	
36	Elektro Rohinstallation	150 Tage	Mon 13.04.26	Fre 02.04.27	
37	Elektro Deckeninstallation	60 Tage	Mon 06.09.27	Fre 26.11.27	
38	Elektro Feininstallation	70 Tage	Mon 29.11.27	Fre 17.03.28	
39	**019 Heizungsarbeiten**	330 Tage	Mon 16.11.26	Fre 17.03.28	
40	Heizung Rohinstallation	110 Tage	Mon 16.11.26	Fre 09.07.27	
41	Heizung Deckeninstallation	60 Tage	Mon 06.09.27	Fre 26.11.27	
42	Heizung Feininstallation	70 Tage	Mon 29.11.27	Fre 17.03.28	
43	**020 Sanitärarbeiten**	330 Tage	Mon 16.11.26	Fre 17.03.28	
44	Sanitär Rohinstallation	90 Tage	Mon 16.11.26	Fre 02.04.27	
45	Sanitär Deckeninstallation	60 Tage	Mon 06.09.27	Fre 26.11.27	
46	Sanitär Feininstallation	70 Tage	Mon 29.11.27	Fre 17.03.28	
47	**021 Lüftungsarbeiten**	330 Tage	Mon 16.11.26	Fre 17.03.28	
48	Lüftung Rohinstallation	90 Tage	Mon 16.11.26	Fre 02.04.27	
49	Lüftung Deckeninstallation	60 Tage	Mon 06.09.27	Fre 26.11.27	
50	Lüftung Feininstallation	70 Tage	Mon 29.11.27	Fre 17.03.28	
51	**022 Gebäudeautomation**	330 Tage	Mon 16.11.26	Fre 17.03.28	
52	Gebäudeautomation Rohinstallation	90 Tage	Mon 16.11.26	Fre 02.04.27	
53	Gebäudeautomation Deckeninstallation	60 Tage	Mon 06.09.27	Fre 26.11.27	
54	Gebäudeautomation Feininstallation	70 Tage	Mon 29.11.27	Fre 17.03.28	
55	**016 Trockenbauarbeiten**	260 Tage	Mon 16.11.26	Fre 26.11.27	
56	**014 Innentüren**	315 Tage	Mon 12.10.26	Fre 21.01.28	
57	Werkplanung / Arbeitsvorbereitung	65 Tage	Mon 12.10.26	Fre 22.01.27	
58	Innentüren	30 Tage	Mon 25.01.27	Fre 21.01.28	
59	**015 Schlosserarbeiten**	105 Tage	Mon 26.10.26	Fre 02.04.27	
60	Werkplanung / Arbeitsvorbereitung	65 Tage	Mon 26.10.26	Fre 05.02.27	
61	Schlosserarbeiten	40 Tage	Mon 08.02.27	Fre 02.04.27	
62	**017 Metallbauarbeiten**	85 Tage	Mon 23.11.26	Fre 02.04.27	
63	Werkplanung / Arbeitsvorbereitung	65 Tage	Mon 23.11.26	Fre 05.03.27	
64	Metallbauarbeiten	20 Tage	Mon 08.03.27	Fre 02.04.27	
65	**029 Innenputzarbeiten**	50 Tage	Mon 05.04.27	Fre 11.06.27	
66	**030 Estricharbeiten**	60 Tage	Mon 31.05.27	Fre 20.08.27	
67	**028 Förderanlagen**	150 Tage	Mon 15.02.27	Fre 10.09.27	
68	Werkplanung / Arbeitsvorbereitung	130 Tage	Mon 15.02.27	Fre 13.08.27	
69	Förderanlagen	20 Tage	Mon 16.08.27	Fre 10.09.27	
70	**031 Fliesenarbeiten**	40 Tage	Mon 02.08.27	Fre 24.09.27	
71	**033 Zwischen- und Grundreinigung**	155 Tage	Mon 13.09.27	Fre 28.04.28	
72	Zwischenreinigung	10 Tage	Mon 13.09.27	Fre 24.09.27	
73	Grundreinigung	20 Tage	Mon 03.04.28	Fre 28.04.28	
74	**034 Malerarbeiten**	60 Tage	Mon 13.09.27	Fre 03.12.27	
75	**036 Bodenbelagsarbeiten**	45 Tage	Mon 08.11.27	Fre 21.01.28	
76	**018 Tore/Türen im Sporthallenbereich**	260 Tage	Mon 16.11.26	Fre 26.11.27	
77	Werkplanung / Arbeitsvorbereitung	240 Tage	Mon 16.11.26	Fre 29.10.27	
78	Tore/Türen im Sporthallenbereich	20 Tage	Mon 01.11.27	Fre 26.11.27	
79	**026 Sportboden**	220 Tage	Mon 15.03.27	Fre 28.01.28	
80	Werkplanung / Arbeitsvorbereitung	185 Tage	Mon 15.03.27	Fre 26.11.27	
81	Sportboden	35 Tage	Mon 29.11.27	Fre 28.01.28	
82	**027 Prallschutzverkleidung**	205 Tage	Mon 03.05.27	Fre 25.02.28	
83	Werkplanung / Arbeitsvorbereitung	185 Tage	Mon 03.05.27	Fre 28.01.28	
84	Prallschutzverkleidung	20 Tage	Mon 31.01.28	Fre 25.02.28	
85	**024 Hallentrennvorhang**	295 Tage	Mon 18.01.27	Fre 17.03.28	
86	Werkplanung / Arbeitsvorbereitung	185 Tage	Mon 18.01.27	Fre 01.10.27	
87	Hallentrennvorhang Rohinstallation	20 Tage	Mon 04.10.27	Fre 29.10.27	
88	Hallentrennvorhang	20 Tage	Mon 21.02.28	Fre 17.03.28	
89	**025 Sportgeräte (festeingebaut)**	305 Tage	Mon 18.01.27	Fre 31.03.28	
90	Werkplanung / Arbeitsvorbereitung	185 Tage	Mon 18.01.27	Fre 01.10.27	
91	Sportgeräte Rohinstallation	20 Tage	Mon 04.10.27	Fre 29.10.27	
92	Sportgeräte (festeingebaut)	20 Tage	Mon 06.03.28	Fre 31.03.28	
93	**035 Tischlerarbeiten**	125 Tage	Mon 27.09.27	Fre 31.03.28	
94	Werkplanung / Arbeitsvorbereitung	65 Tage	Mon 27.09.27	Fre 07.01.28	
95	Tischlerarbeiten	60 Tage	Mon 10.01.28	Fre 31.03.28	
96	Küchentechnik	20 Tage	Mon 06.03.28	Fre 31.03.28	
97	**037 Schließanlage**	85 Tage	Mon 22.11.27	Fre 31.03.28	
98	Werkplanung / Arbeitsvorbereitung	65 Tage	Mon 22.11.27	Fre 03.03.28	
99	Schließanlage	20 Tage	Mon 06.03.28	Fre 31.03.28	
100	**032 Galabauarbeiten (Freianlagen)**	170 Tage	Mon 26.07.27	Fre 31.03.28	
101	Abnahmen, Nacharbeiten	20 Tage	Mon 03.04.28	Fre 28.04.28	
102	Baufertigstellung	0 Tage	Fre 28.04.28	Fre 28.04.28	
103					
104	Einrichtung Nutzer	45 Tage	Mon 01.05.28	Fre 30.06.28	
105	Erster Schultag (2028/2029)	0 Tage	Mit 23.08.28	Mit 23.08.28
