Projektnummer:

Bauzeitenplan

BKBW-347_BZP_BT 4_Vorentwurf

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer
6	**Ersatzbau Bauteil 3 Hauswirtschaft**	220at	Mo, 03.08.26	Di, 15.06.27	
6.1	Rohbau	90at	Mo, 03.08.26	Fr, 04.12.26	
6.1.1	Erneuerung Wände/Betonstützen	20at	Mo, 03.08.26	Fr, 28.08.26	
6.1.2	Dachdecke (Spannbetonhohldielen)	10at	Mo, 31.08.26	Fr, 11.09.26	
6.1.3	Dachabklebung 1. Lage	5at	Mo, 14.09.26	Fr, 18.09.26	
6.1.4	Fenster/Außentüren	15at	Mo, 21.09.26	Fr, 09.10.26	
6.1.5	Verblender	30at	Mo, 05.10.26	Fr, 13.11.26	
6.1.6	Dachabdichtung/Attikaabdeckung	30at	Mo, 26.10.26	Fr, 04.12.26	
6.2	Innenausbau	175at	Mo, 05.10.26	Di, 15.06.27	
6.2.1	Heizung/Sanitär/Lüftung	30at	Mo, 05.10.26	Fr, 13.11.26	HLS
6.2.2	Elektroarbeiten	30at	Mo, 05.10.26	Fr, 13.11.26	ELT
6.2.3	GK-Wände 1-seitig 7/ Innenmauerwerk	10at	Mo, 05.10.26	Fr, 16.10.26	
6.2.4	GK-Wände 2. Seite / Schlitze schließen	15at	Mo, 09.11.26	Fr, 27.11.26	
6.2.5	Zargen	10at	Mo, 16.11.26	Fr, 27.11.26	
6.2.6	Innenputz	15at	Mo, 30.11.26	Fr, 18.12.26	
6.2.7	Bodenabklebung gegen aufsteig. Feuchte	5at	Mo, 21.12.26	Mo, 28.12.26	
6.2.8	Estrich	5at	Di, 29.12.26	Di, 05.01.27	
6.2.9	Abhangdecken	20at	Mi, 06.01.27	Di, 02.02.27	
6.2.10	Installationen Deckenbereich H/S/L/E	20at	Mi, 06.01.27	Di, 02.02.27	
6.2.11	Rollladen Ausgabe	5at	Mi, 27.01.27	Di, 02.02.27	
6.2.12	Wandfliesen	20at	Mi, 03.02.27	Di, 02.03.27	
6.2.13	Boden	20at	Mi, 03.03.27	Do, 01.04.27	
6.2.14	Anstricharbeiten	20at	Fr, 02.04.27	Do, 29.04.27	
6.2.15	Installationen Deckenbereich H/S/L/E	15at	Fr, 30.04.27	Mo, 24.05.27	
6.2.16	Türblätter, Tischler etc.	10at	Fr, 30.04.27	Fr, 14.05.27	
6.2.17	Baureinigung	5at	Di, 25.05.27	Di, 01.06.27	
6.2.18	Kücheneinrichtung	10at	Mi, 02.06.27	Di, 15.06.27	

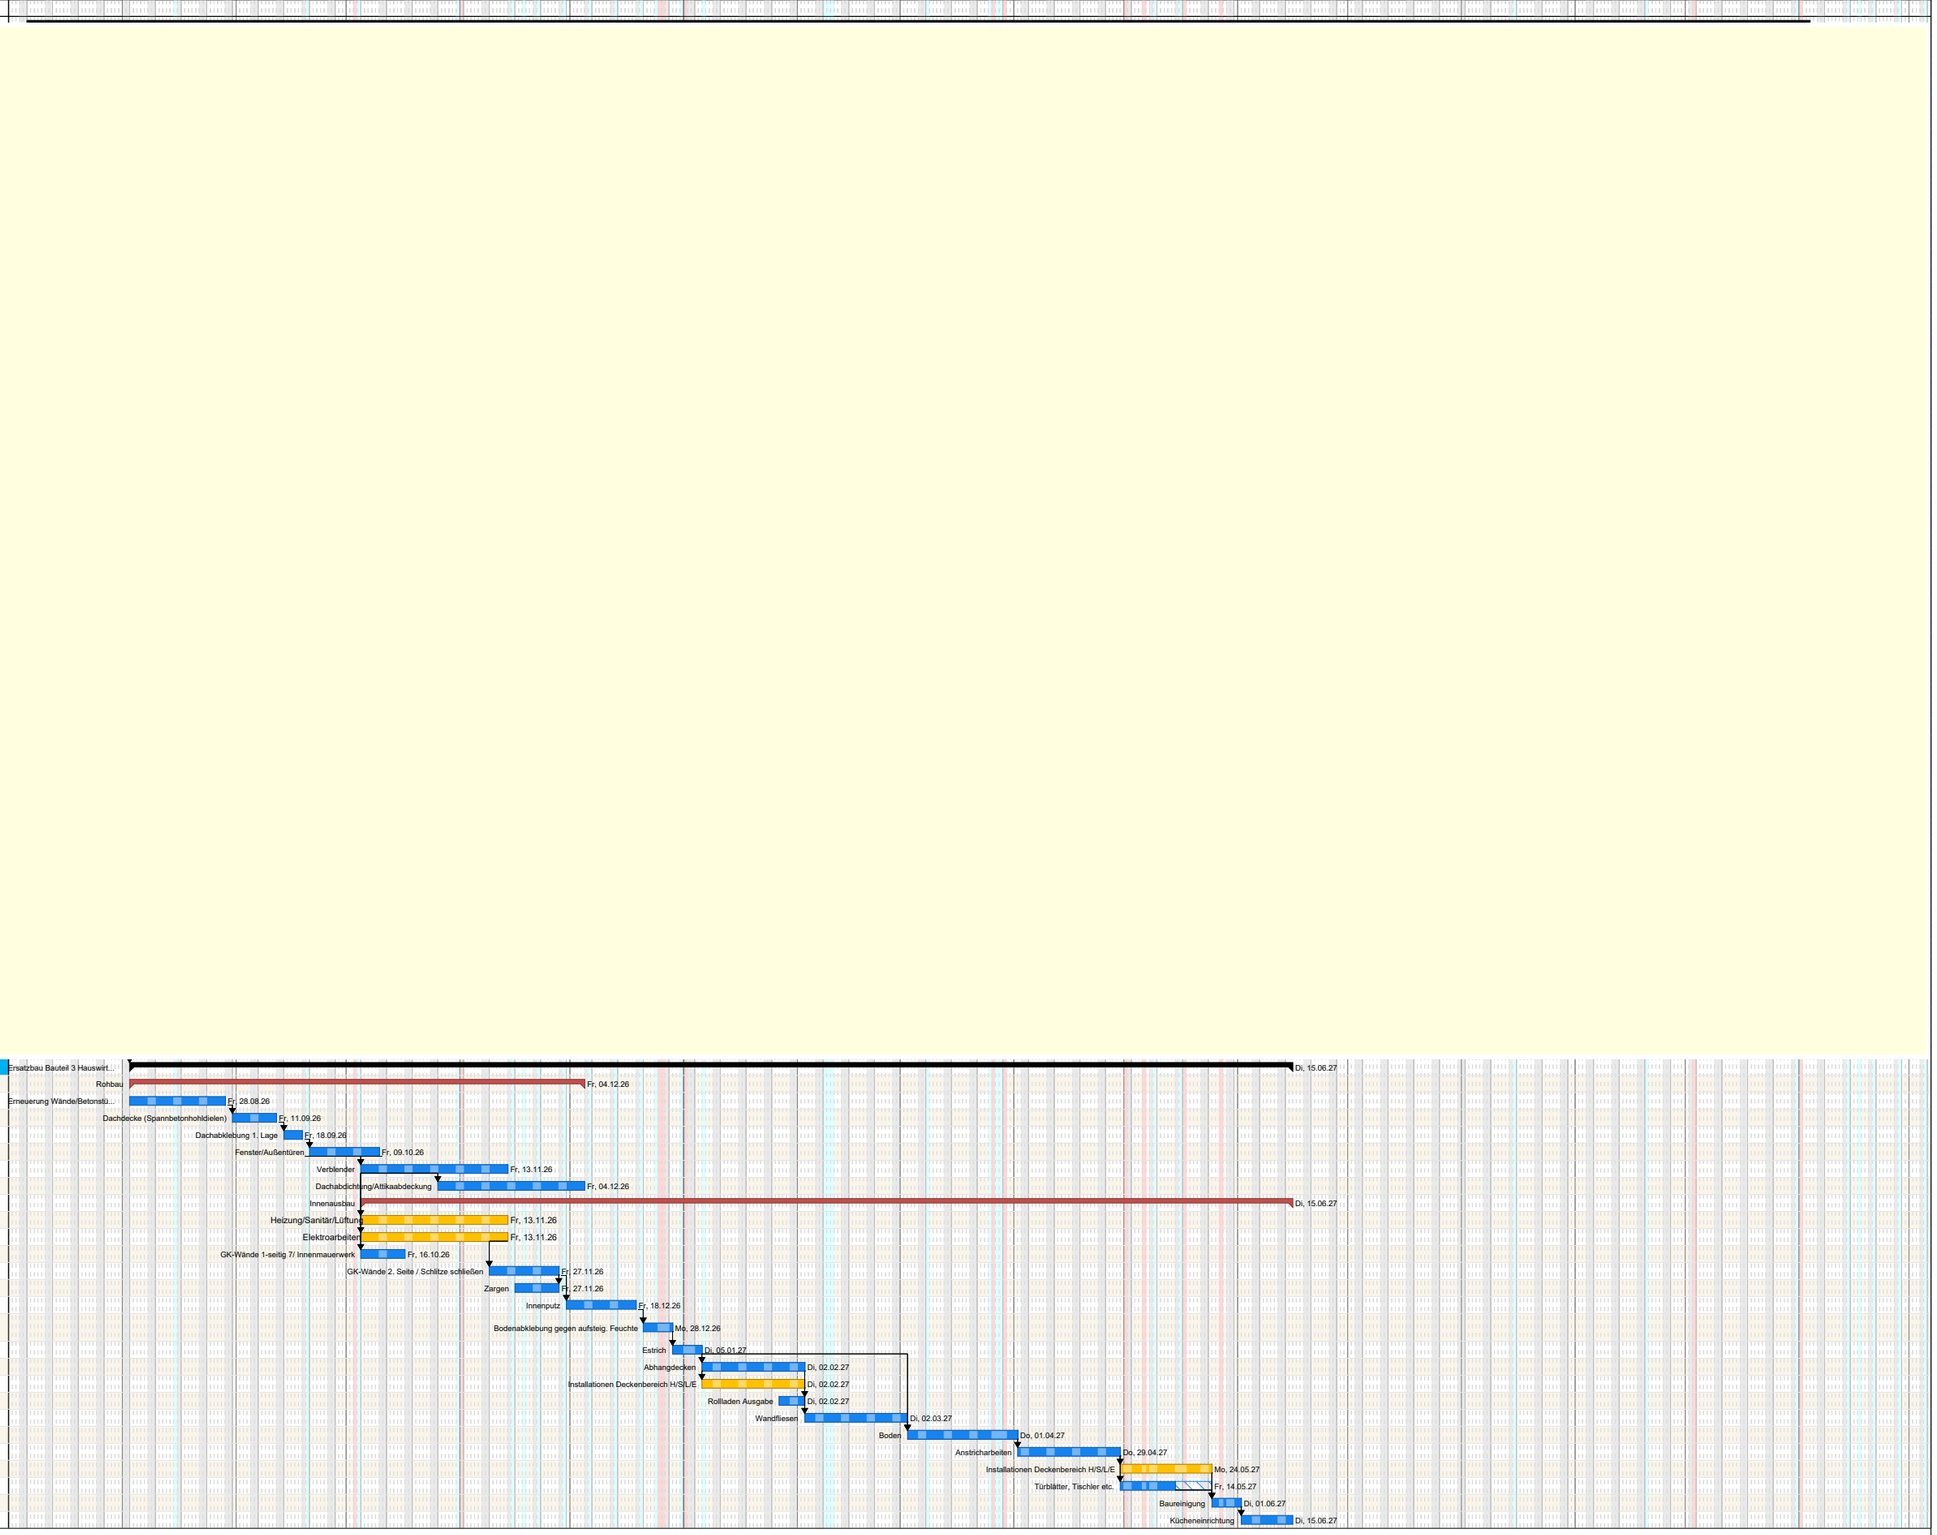

Projektzeitrahmen von So, 01.06.25 bis Do, 21.06.29
Kalender: Nordrhein-Westfalen (eingebettet)
Druckdatum: 22.05.2026 13:19
