Projektbezeichnung: Raphaelschule Recke
Projektnummer: 24-05
Bauherr: Gemeinde Recke

Bauzeitenplan Erweiterung Raphaelschule Recke

Stand 04.05.2026

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1	**OGS**	38,8 Wochen?	Die 19.05.26	Fre 26.02.27		
36	**Lehrerzimmer**	**21 Wochen?**	**Mit 01.07.26**	**Die 24.11.26**		
63	**Diff-Raum Nord-West**	**18,6 Wochen**	**Mit 15.07.26**	**Fre 20.11.26**		
64	**Rohbau**	5 Wochen	Mit 15.07.26	Die 18.08.26		
65	Maurerarbeiten Wände/ Stützen EG	1 Woche	Mit 15.07.26	Die 21.07.26	39	
66	Aufbau Gerüst EG	2 Tage	Mit 22.07.26	Don 23.07.26	65	
67	Stb-Arbeiten Decke EG	1 Woche	Mit 22.07.26	Die 28.07.26	65	
68	Maurerarbeiten Wände/ Stützen OG	1 Woche	Mit 29.07.26	Die 04.08.26	67	
69	Aufbau Gerüst OG	1 Woche	Mit 05.08.26	Die 11.08.26	68	
70	Stb-Arbeiten Decke OG inkl. Trocknungszeit	1 Woche	Mit 12.08.26	Die 18.08.26	69	
71	**Gebäude Außenhülle**	**8 Wochen**	**Mit 19.08.26**	**Die 13.10.26**		
72	Einbau Fensterelemente EG + 1.OG	2 Wochen	Mit 19.08.26	Die 01.09.26	70	
73	Dachdeckerarbeiten	4 Wochen	Mit 19.08.26	Die 15.09.26	70	
74	WDVS-Arbeiten	4 Wochen	Mit 02.09.26	Die 29.09.26	72	
75	Montage Fluchttreppen (Schlosser)	2 Wochen	Mit 30.09.26	Die 13.10.26	74	
76	**Innenausbau**	**11,6 Wochen**	**Mit 02.09.26**	**Fre 20.11.26**		
77	Rohinstallation EG + 1. OG Heizung, Lüftung, Sanitär (HLS)	3 Wochen	Mit 02.09.26	Die 22.09.26	72	
78	Rohinstallation EG + 1. OG Elektro- und Nachrichtentechnik (ELT)	3 Wochen	Mit 02.09.26	Die 22.09.26	77AA	
79	Innenputzarbeiten	2 Wochen	Mit 23.09.26	Die 06.10.26	78	
80	Auslegung Dämmschicht (Estrich)	1 Tag	Mit 07.10.26	Mit 07.10.26	79	
81	Einbringung Estrich (Estrich)	2 Tage	Don 08.10.26	Fre 09.10.26	80	
82	Einbau Trockenbaudecken (Trockenbau)	2 Wochen	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26	81	
83	Fliesenarbeiten (Fliesen)	1 Woche	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26	81	
84	Einbau Zargen (Tischlerarbeiten)	1 Woche	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26	83	
85	Malerarbeiten (Maler)	2 Wochen	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26	83AA	
86	Oberbodenarbeiten (Bodenleger)	2 Wochen	Mon 26.10.26	Fre 06.11.26	85	
87	Feininstallation Heizung, Lüftung, Sanitär (HLS)	2 Wochen	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26	86	
88	Feininstallationen Elektro- und Nachrichtentechnik (ELT)	2 Wochen	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26	87AA	
89	Einbau Türblätter (Tischlerarbeiten)	1 Woche	Mon 09.11.26	Fre 13.11.26	86	
90	Bauendreinigung	1 Woche	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26	89	
91	Abnahmen	1 Woche	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26	90AA	
92	Außenanlagen	3 Wochen	Mon 12.10.26	Fre 30.10.26	85AA	
93	**Diff-Raum Süd Ost**	**21,8 Wochen**	**Mit 29.07.26**	**Mon 11.01.27**		
94	**Rohbau**	4,4 Wochen	Mit 29.07.26	Don 27.08.26		
95	Maurerarbeiten Wände/ Stützen EG	1 Woche	Mit 29.07.26	Die 04.08.26	68AA	
96	Aufbau Gerüst EG	2 Tage	Mit 05.08.26	Don 06.08.26	95	
97	Stb-Arbeiten Decke EG	1 Woche	Fre 07.08.26	Don 13.08.26	96	
98	Maurerarbeiten Wände/ Stützen OG	1 Woche	Fre 14.08.26	Don 20.08.26	97	
99	Aufbau Gerüst OG	1 Woche	Fre 21.08.26	Don 27.08.26	98	
100	Stb-Arbeiten Decke OG inkl. Trocknungszeit	1 Woche	Fre 21.08.26	Don 27.08.26	98	
101	**Gebäude Außenhülle**	**8 Wochen**	**Fre 21.08.26**	**Don 15.10.26**		
102	Einbau Fensterelemente EG + 1.OG	2 Wochen	Fre 21.08.26	Don 03.09.26	98	
103	Dachdeckerarbeiten	4 Wochen	Fre 28.08.26	Don 24.09.26	100	
104	WDVS-Arbeiten	4 Wochen	Fre 04.09.26	Don 01.10.26	102	
105	Montage Fluchttreppen (Schlosser)	2 Wochen	Fre 02.10.26	Don 15.10.26	104	
106	**Innenausbau**	**16,4 Wochen**	**Fre 04.09.26**	**Mon 11.01.27**		
107	Rohinstallation EG + 1. OG Heizung, Lüftung, Sanitär (HLS)	3 Wochen	Fre 04.09.26	Don 24.09.26	102	
108	Rohinstallation EG + 1. OG Elektro- und Nachrichtentechnik (ELT)	3 Wochen	Fre 04.09.26	Don 24.09.26	107AA	
109	Innenputzarbeiten	2 Wochen	Fre 25.09.26	Don 08.10.26	108	
110	Auslegung Dämmschicht (Estrich)	1 Tag	Fre 09.10.26	Fre 09.10.26	109	
111	Installation Fußbodenheizung (Estrich)	4 Tage	Mon 12.10.26	Don 15.10.26	110	
112	Einbringung Estrich (Estrich)	2 Tage	Fre 16.10.26	Mon 19.10.26	111	
113	Montage Decken (Trockenbau)	2 Wochen	Die 20.10.26	Mon 02.11.26	112	
114	Fliesenarbeiten (Fliesen)	1 Woche	Die 20.10.26	Mon 26.10.26	112	
115	Einbau Zargen (Tischlerarbeiten)	1 Woche	Die 27.10.26	Mon 02.11.26	114	
116	Malerarbeiten (Maler)	2 Wochen	Die 03.11.26	Mon 16.11.26	113	
117	Einbau Türblätter (Tischlerarbeiten)	1 Woche	Die 17.11.26	Mon 23.11.26	116	
118	Oberbodenarbeiten (Bodenleger)	2 Wochen	Die 24.11.26	Mon 07.12.26	117	
119	Feininstallation Heizung, Lüftung, Sanitär (HLS)	3 Wochen	Die 08.12.26	Mon 11.01.27	118	
120	Feininstallationen Elektro- und Nachrichtentechnik (ELT)	3 Wochen	Die 08.12.26	Mon 11.01.27	119AA	
121	Einbau Innentüren (Tischlerarbeiten)	1 Woche	Die 08.12.26	Mon 14.12.26	118	
122	Bauendreinigung	1 Woche	Die 15.12.26	Mon 04.01.27	121	
123	Abnahmen	1 Woche	Die 15.12.26	Mon 04.01.27	122AA	

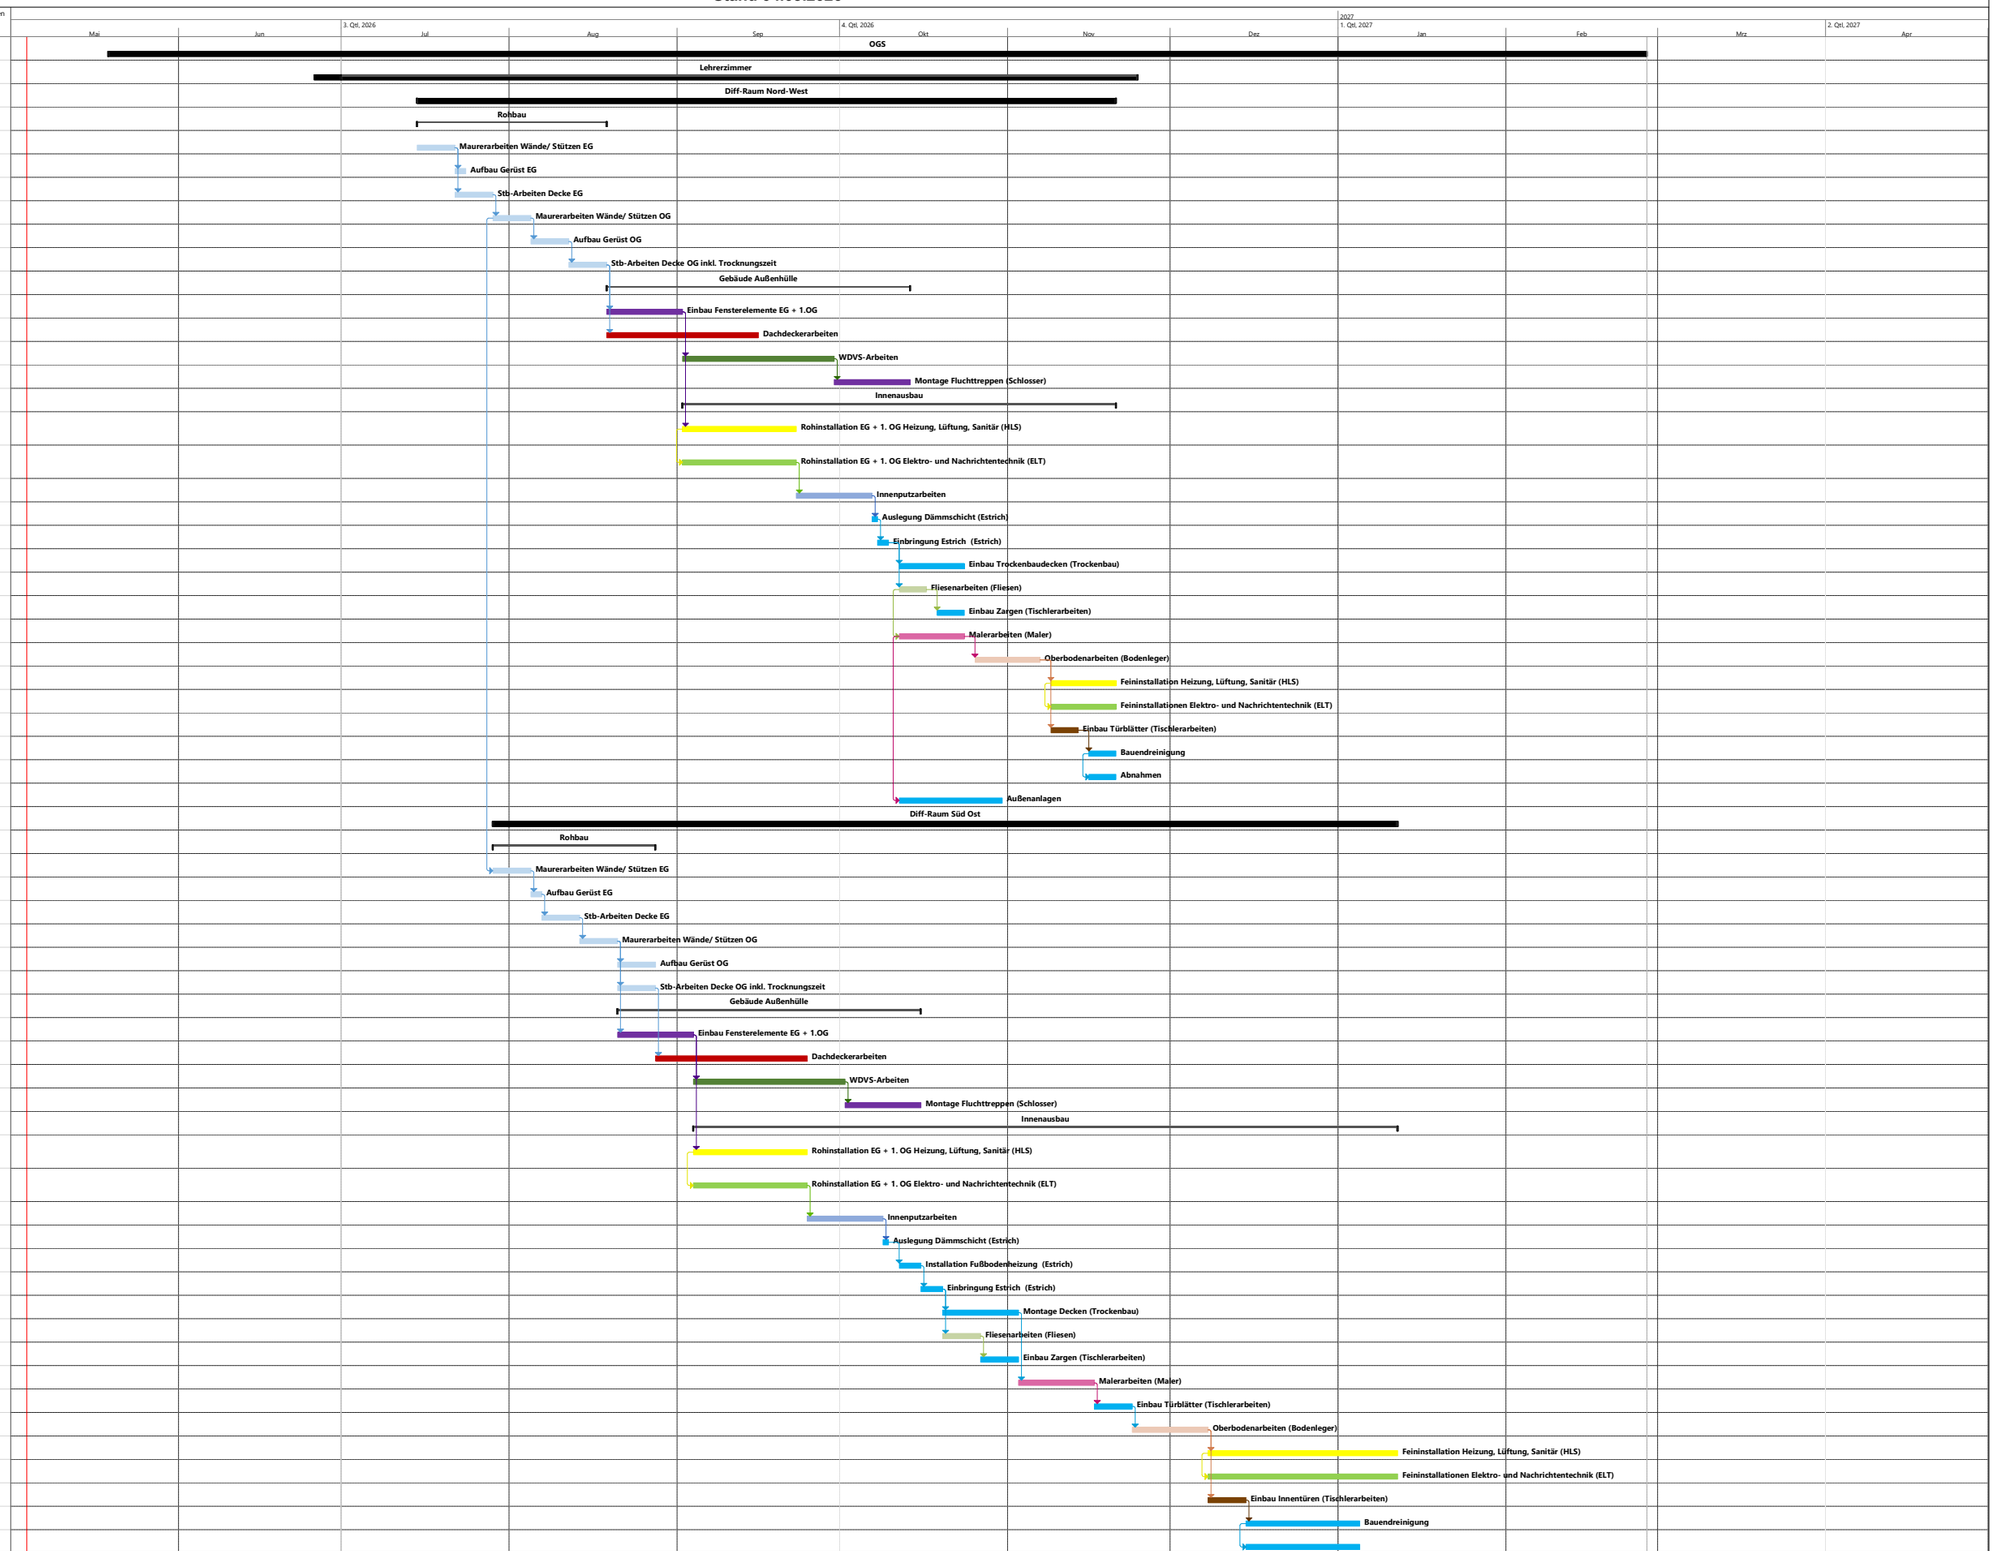

Bearbeiter: Lina Lindenthal
Datum: Mon 04.05.26

Vorgang, Unterbrechung, Meilenstein, Sammelvorgang, Projektsammelvorgang, Inaktiver Vorgang, Inaktiver Meilenstein, Inaktiver Sammelvorgang, Manueller Vorgang, Nur Dauer, Manueller Sammelvorgang, Manueller Sammelvollup, Nur Anfang, Nur Ende, Externe Vorgänge, Externer Meilenstein, Stichtag, In Arbeit, Manueller Fortschritt
