Projektbezeichnung: Raphaelschule Recke
Projektnummer: 24-05
Bauherr: Gemeinde Recke

Bauzeitenplan Erweiterung Raphaelschule Recke

Stand 04.05.2026

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1	**OGS**	38,8 Wochen?	Die 19.05.26	Fre 26.02.27		
2	**Rohbau**	13,8 Wochen	Die 19.05.26	Fre 21.08.26		
3	Abbruch der Fassade	1 Woche	Mon 25.05.26	Fre 29.05.26		
4	Erstellung Holz-Rahmenbau-Wand	1 Woche	Mon 25.05.26	Fre 29.05.26	3AA	
5	Maurer- und Stahlbetonarbeiten Wände/ Stützen EG	2 Wochen	Mon 01.06.26	Fre 12.06.26	4	
6	Aufbau Gerüst EG	3 Tage	Mit 10.06.26	Fre 12.06.26	5EE	
7	Stb-Arbeiten Decke EG	1 Woche	Mon 15.06.26	Fre 19.06.26	5	
8	Maurer- und Stahlbetonarbeiten Wände/ Stützen OG	2 Wochen	Mon 22.06.26	Fre 03.07.26	7	
9	Aufbau Gerüst OG	3 Tage	Mit 01.07.26	Fre 03.07.26	8EE	
10	Verblendarbeiten (Rohbau)	8 Wochen	Mon 22.06.26	Fre 14.08.26	7	
11	**Gebäude Außenhülle**	**6 Wochen**	**Mon 06.07.26**	**Fre 14.08.26**		
12	Deckenkonstruktion inkl. Notentwässerung (Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten)	2 Wochen	Mon 06.07.26	Fre 17.07.26	8	
13	Dachdeckerarbeiten	4 Wochen	Mon 20.07.26	Fre 14.08.26	12	
14	**Fensterarbeiten**	**4 Wochen**	**Mon 06.07.26**	**Fre 31.07.26**		
15	Einbau Fenster EG + 1.OG	4 Wochen	Mon 06.07.26	Fre 31.07.26	9	
16	**Innenausbau**	**29 Wochen**	**Mon 27.07.26**	**Fre 26.02.27**		
17	Stellen der Trockenbauwand EG (Trockenbau)	1 Woche	Mon 27.07.26	Fre 31.07.26	15EA-5 Tage	
18	Rohinstallation Heizung, Lüftung, Sanitär (HLS)	6 Wochen	Mon 27.07.26	Fre 04.09.26	17AA	
19	Rohinstallation Elektro- und Nachrichtentechnik (ELT)	6 Wochen	Mon 27.07.26	Fre 04.09.26	18AA	
20	Innenputzarbeiten	3 Wochen	Mon 07.09.26	Fre 25.09.26	19	
21	Montage Treppengeländer (Schlosser)	1 Woche	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26	20	
22	Auslegung Dämmschicht (Estrich)	3 Tage	Mon 05.10.26	Mit 07.10.26	21	
23	Installation Fußbodenheizung (Estrich)	7 Tage	Don 08.10.26	Fre 16.10.26	22	
24	Einbringung Estrich (Estrich)	1 Woche	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26	23	
25	Einbau Trockenbaudecken (Trockenbau)	4 Wochen	Mon 26.10.26	Fre 20.11.26	24	
26	Fliesenarbeiten (Fliesen)	4 Wochen	Mon 23.11.26	Fre 18.12.26	25	
27	Einbau Zargen (Tischlerarbeiten)	2 Wochen	Mon 04.01.27	Fre 15.01.27	28AA	
28	Malerarbeiten (Maler)	4 Wochen	Mon 04.01.27	Fre 29.01.27	26	
29	Oberbodenarbeiten (Bodenleger)	3 Wochen	Mon 18.01.27	Fre 05.02.27	28AA+10 Tage	
30	Feininstallation Heizung, Lüftung, Sanitär (HLS)	4 Wochen	Mon 25.01.27	Fre 19.02.27	29EA-10 Tage	
31	Feininstallationen Elektro- und Nachrichtentechnik (ELT)	4 Wochen	Mon 25.01.27	Fre 19.02.27	30AA	
32	Einbau Innentüren (Tischlerarbeiten)	1 Woche	Mon 22.02.27	Fre 26.02.27	30	
33	Bauendreinigung	5 Tage	Mon 22.02.27	Fre 26.02.27	31	
34	Abnahmen	1 Woche	Mon 22.02.27	Fre 26.02.27	33AA	
35	Außenanlagen	3 Wochen	Mon 04.01.27	Fre 22.01.27	28AA	
36	**Lehrerzimmer**	**21 Wochen?**	**Mit 01.07.26**	**Die 24.11.26**		
37	**Rohbau**	3 Wochen	Mit 01.07.26	Die 21.07.26		
38	Auszug Lehrerzimmer	3 Tage	Fre 26.06.26	Mit 01.07.26	39AE	
39	Maurerarbeiten Wände/ Stützen EG	2 Wochen	Mit 01.07.26	Die 14.07.26	8EA-5 Tage	
40	Aufbau Gerüst EG	2 Tage	Mit 15.07.26	Don 16.07.26	39	
41	**Gebäude Außenhülle**	**7 Wochen**	**Fre 17.07.26**	**Don 03.09.26**		
42	Montage Fenster	1 Woche	Fre 17.07.26	Don 23.07.26	40	
43	WDVS-Arbeiten	3 Wochen	Fre 24.07.26	Don 13.08.26	42	
44	Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten	5 Wochen	Fre 31.07.26	Don 03.09.26	43EA-10 Tage	
45	**Innenausbau**	**17,6 Wochen**	**Fre 24.07.26**	**Die 24.11.26**		
46	Erstellung Trockenbauwand Teeküche (Trockenbau)	2 Tage	Fre 24.07.26	Mon 27.07.26	47AA	
47	Rohinstallation EG Heizung, Lüftung, Sanitär (HLS)	3 Wochen	Fre 24.07.26	Don 13.08.26	42	
48	Rohinstallation EG Elektro- und Nachrichtentechnik (ELT)	3 Wochen	Fre 24.07.26	Don 13.08.26	47AA	
49	Innenputzarbeiten	2 Wochen	Fre 14.08.26	Don 27.08.26	47	
50	Auslegung Dämmschicht (Estrich)	2 Tage	Fre 28.08.26	Mon 31.08.26	49	
51	Installation Fußbodenheizung (Estrich)	4 Tage	Die 01.09.26	Fre 04.09.26	50	
52	Einbringung Estrich (Estrich)	2 Tage	Mon 07.09.26	Die 08.09.26	51	
53	Einbau Trockenbaudecken (Trockenbau)	2 Wochen	Mit 09.09.26	Die 22.09.26	52	
54	Malerarbeiten (Maler)	2 Wochen	Mit 23.09.26	Die 06.10.26	53	
55	Einbau Zargen (Tischlerarbeiten)	1 Woche	Mit 07.10.26	Die 13.10.26	54	
56	Oberbodenarbeiten (Bodenleger)	1 Woche	Mit 14.10.26	Die 20.10.26	55	
57	Feininstallation Heizung, Lüftung, Sanitär (HLS)	3 Wochen	Mit 21.10.26	Die 10.11.26	56	
58	Feininstallationen Elektro- und Nachrichtentechnik (ELT)	3 Wochen	Mit 21.10.26	Die 10.11.26	57AA	
59	Einbau Türblätter (Tischlerarbeiten)	1 Woche	Mit 11.11.26	Die 17.11.26	57	
60	Bauendreinigung	1 Woche	Mit 18.11.26	Die 24.11.26	59	
61	Abnahmen	1 Woche	Mit 18.11.26	Die 24.11.26	60AA	
62	Außenanlagen	3 Wochen	Mit 23.09.26	Die 13.10.26	54AA	
63	**Diff-Raum Nord-West**	**18,6 Wochen**	**Mit 15.07.26**	**Fre 20.11.26**		
93	**Diff-Raum Süd Ost**	**21,8 Wochen**	**Mit 29.07.26**	**Mon 11.01.27**		

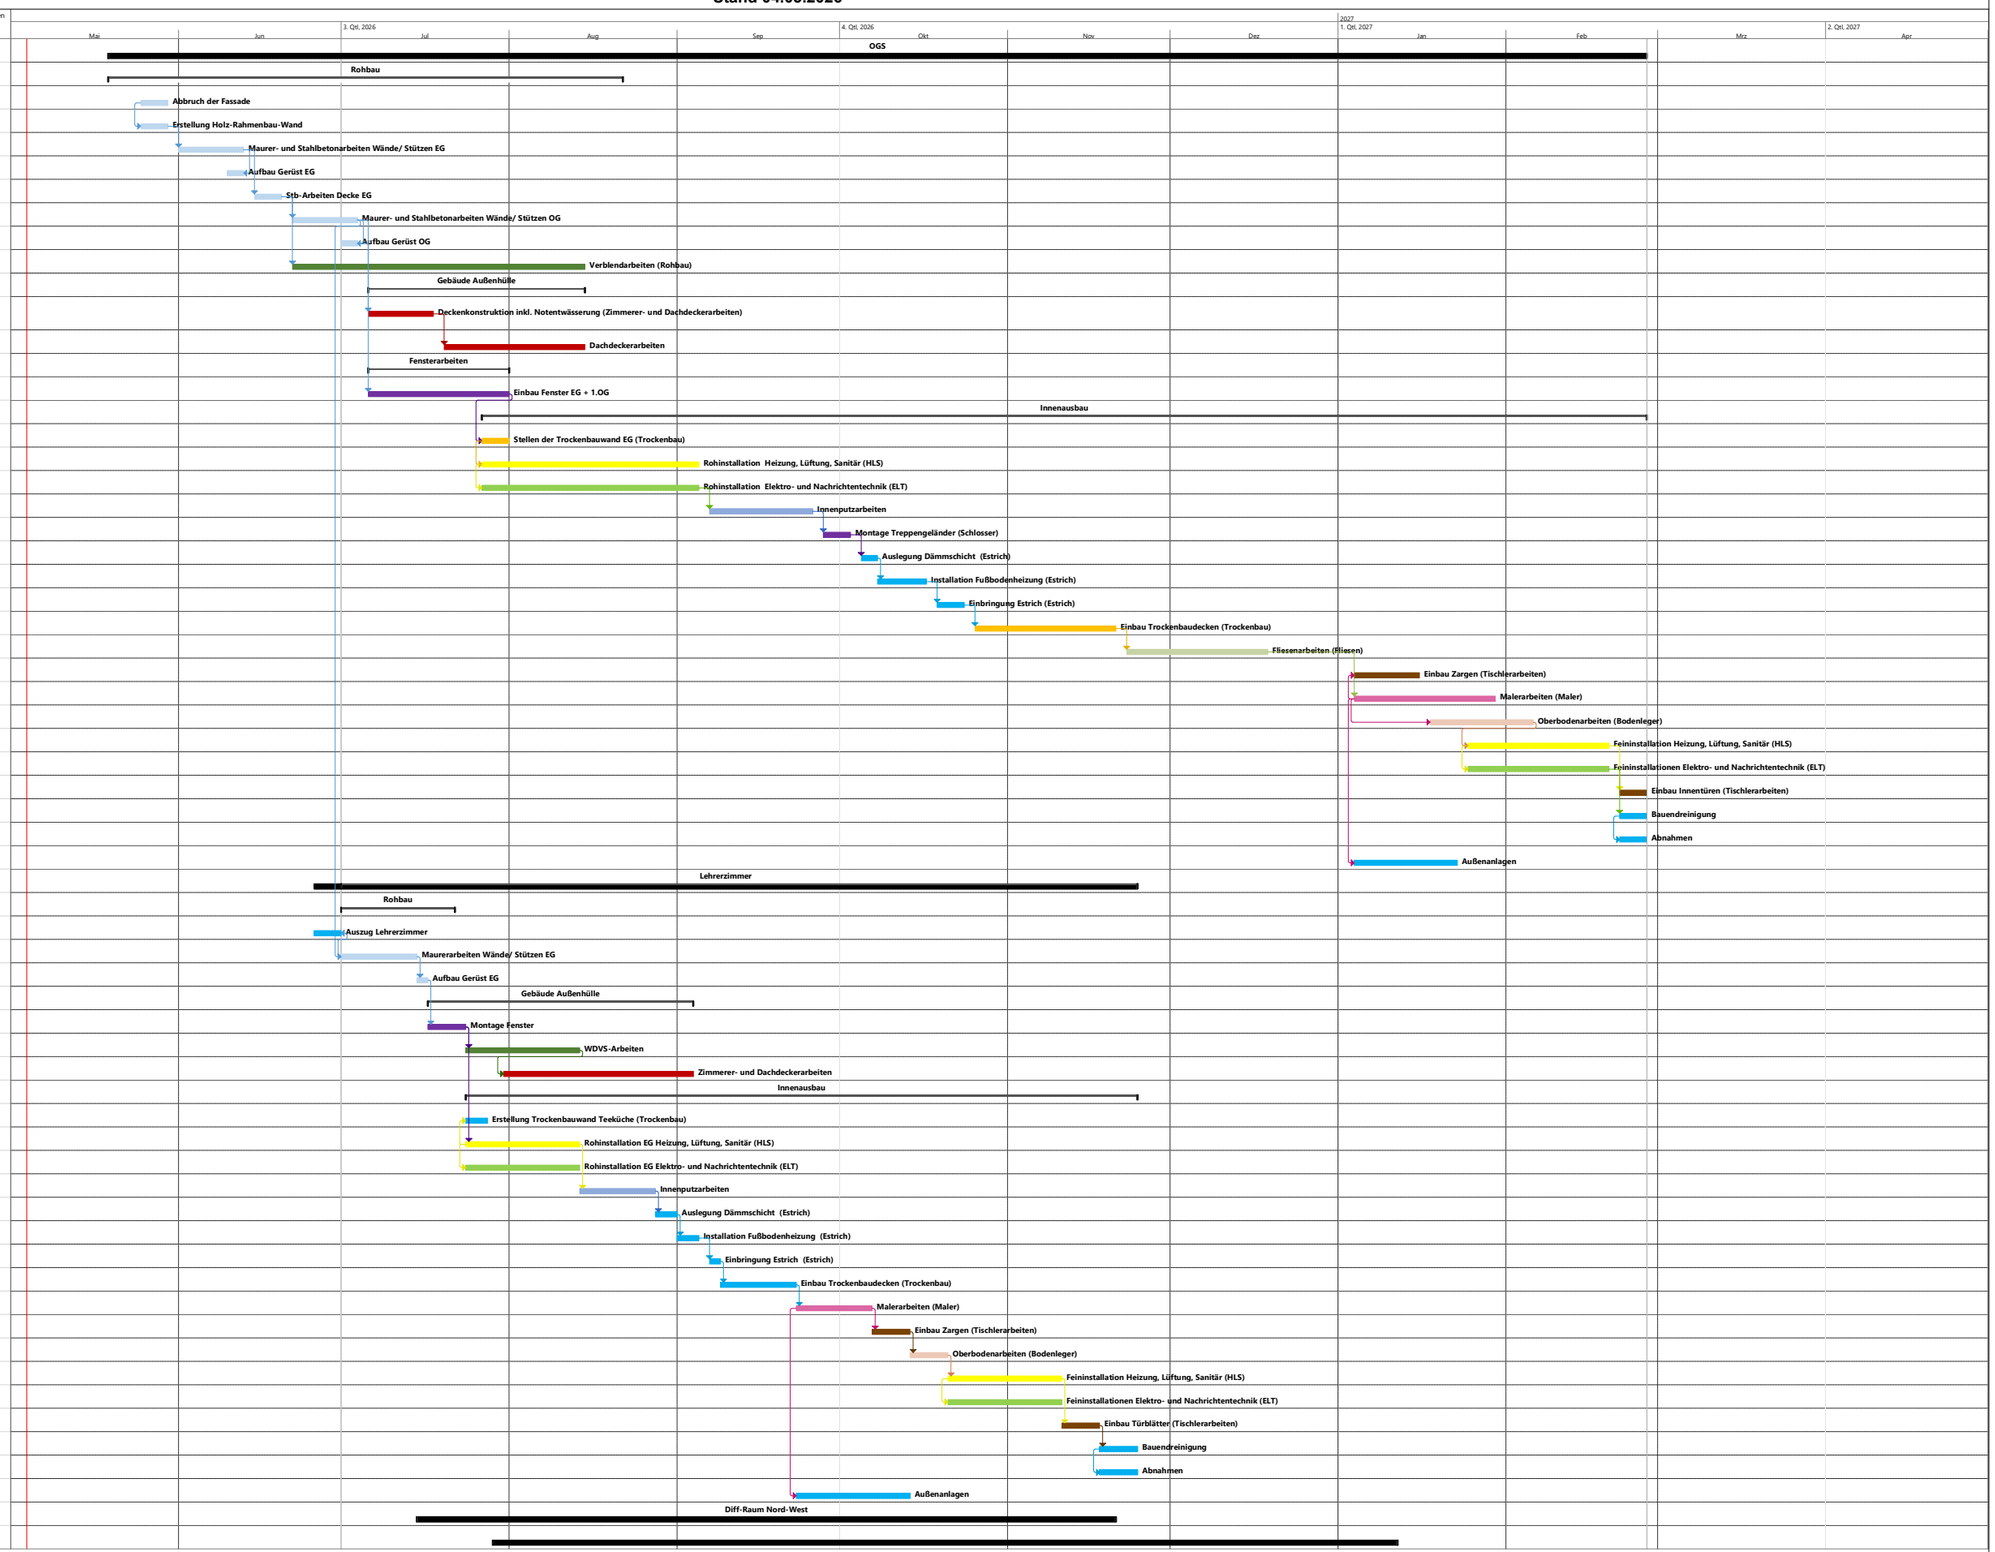

Bearbeiter: Lina Lindenthal
Datum: Mon 04.05.26

Vorgang, Unterbrechung, Meilenstein, Sammelvorgang, Projektsammelvorgang, Inaktiver Vorgang, Inaktiver Meilenstein, Inaktiver Sammelvorgang, Manueller Vorgang, Nur Dauer, Manueller Sammelrollup, Manueller Sammelvorgang, Nur Anfang, Nur Ende, Externe Vorgänge, Externer Meilenstein, Stichtag, In Arbeit, Manueller Fortschritt
