Nr.			Vorgangsname	Bereich	LV-Nr.	Dauer	Anfang	Ende
			Text1: allg.			**104t**		
11	✓		**Baubeginn**	Bestand & Neubau	allg.	**0 Tage**	**Mon 23.02.26**	**Mon 23.02.26**
109			Abnahme Neubau & Bestand	Bestand & Neubau	allg.	10 Tage	Fre 11.12.26	Don 24.12.26
108			**Fertigstellung**	Bestand & Neubau	allg.	**0 Tage**	**Son 20.12.26**	**Son 20.12.26**
110			Mängelbeseitungung nach Abnahme	Bestand & Neubau	allg.	10 Tage	Fre 25.12.26	Die 19.01.27
111			**Übergabe an den Bauherr**	Bestand & Neubau	allg.	**0 Tage**	**Die 19.01.27**	**Die 19.01.27**
			Text1: Ausschreibungsphase			**254t**		
120			Prüfung durch den Kreis		Ausschreibungsph	9 Tage	Die 23.06.26	Fre 03.07.26
121			Veröffentlichung durch den Kreis		Ausschreibungsph	5 Tage	Mon 06.07.26	Fre 10.07.26
122			Angebotsfrist		Ausschreibungsph	20 Tage	Mon 13.07.26	Fre 07.08.26
123			Submission		Ausschreibungsph	0 Tage	Mon 10.08.26	Mon 10.08.26
124			Bindefrist		Ausschreibungsph	11 Tage	Mon 10.08.26	Mon 24.08.26
125			Prüfung Submissionsergebnisse		Ausschreibungsph	5 Tage	Mon 10.08.26	Fre 14.08.26
126			Vergabe durch den Bauherrn		Ausschreibungsph	5 Tage	Mon 17.08.26	Fre 21.08.26
127			Wartezeit nach Auftragserteilung		Ausschreibungsph	10 Tage	Mon 24.08.26	Fre 04.09.26
128			Vorbereitungszeit durch Unternehmer		Ausschreibungsph	10 Tage	Mon 07.09.26	Fre 18.09.26
			Text1: Einrichtung			**5t**		
97			Einrichtung Liefern und Montieren	Bestand & Neubau	Einrichtung	5 Tage	Mon 21.12.26	Fre 25.12.26
			Text1: Ferien			**140t**		
3	✓		Herbstferien 2025	NRW	Ferien	11 Tage	Mon 13.10.25	Sam 25.10.25
4	✓		Weihnachtsferien 2025/2026	NRW	Ferien	12 Tage	Mon 22.12.25	Die 06.01.26
5	✓		Osterferien 2026	NRW	Ferien	11 Tage	Mon 30.03.26	Sam 11.04.26
6			Sommerferien 2026	NRW	Ferien	32 Tage	Mon 20.07.26	Die 01.09.26
7			Herbstferien 2026	NRW	Ferien	12 Tage	Sam 17.10.26	Sam 31.10.26
8			Weihnachtsferien 2026/2027	NRW	Ferien	11 Tage	Mit 23.12.26	Mit 06.01.27
			Text1: LV01 - Abbruch			**96t**		
9	✓		Abbruch alter Verblender	Bestand Aula	LV01 - Abbruch	2 Tage	Mon 09.02.26	Die 10.02.26
10			Abbruch Verblender	Aula zum Bestand	LV01 - Abbruch	2 Tage	Mon 15.06.26	Die 16.06.26
115			Bodenaufbau Aula abbrechen	Aula zum Bestand	LV01 - Abbruch	3 Tage	Die 11.08.26	Don 13.08.26
			Text1: LV02 - Rohbau			**164t**		
12	✓		Erdarbeiten	Neubau	LV02 - Rohbau	10 Tage	Mon 02.03.26	Fre 13.03.26
13	✓		Gründung	Neubau	LV02 - Rohbau	15 Tage	Mon 16.03.26	Fre 03.04.26
14	✓		Wände	Neubau	LV02 - Rohbau	10 Tage	Mon 06.04.26	Fre 17.04.26
15	✓		Decke	Neubau	LV02 - Rohbau	40 Tage	Mon 20.04.26	Fre 12.06.26
16			Attika	Neubau	LV02 - Rohbau	5 Tage	Mon 15.06.26	Fre 19.06.26
20			Erdarbeiten	Bestand	LV02 - Rohbau	2 Tage	Mon 15.06.26	Die 16.06.26
21			Gründung	Bestand	LV02 - Rohbau	2 Tage	Mon 15.06.26	Die 16.06.26
22			Wände	Bestand	LV02 - Rohbau	1 Tag	Mon 15.06.26	Mon 15.06.26
23			Decke	Bestand	LV02 - Rohbau	3 Tage	Mon 15.06.26	Mit 17.06.26
24			Attika	Bestand	LV02 - Rohbau	3 Tage	Mon 15.06.26	Mit 17.06.26
25			Verblendung	Bestand	LV02 - Rohbau	5 Tage	Mit 17.06.26	Die 23.06.26
17			Verblendung	Neubau	LV02 - Rohbau	15 Tage	Mon 22.06.26	Fre 10.07.26
39			Dampfsperre Sohle	Neubau	LV02 - Rohbau	3 Tage	Mon 22.06.26	Mit 24.06.26
18			Übergänge	Neubau	LV02 - Rohbau	5 Tage	Mon 06.07.26	Fre 10.07.26
26			Übergänge	Bestand	LV02 - Rohbau	2 Tage	Mon 06.07.26	Die 07.07.26
19			Restarbeiten	Neubau	LV02 - Rohbau	5 Tage	Mon 13.07.26	Fre 17.07.26
			Text1: LV03 - Alu-Elemente			**208t**		
32			Aufmaß	Außen | Bestand &	LV03 - Alu-Elemente	1 Tag	Mon 06.07.26	Mon 06.07.26
35			Aufmaß	Innen | Bestand &	LV03 - Alu-Elemente	1 Tag	Mon 06.07.26	Mon 06.07.26
33			Elemente montieren	Außen | Bestand &	LV03 - Alu-Elemente	2 Tage	Mon 13.07.26	Die 14.07.26
112			Sonnenschutz montieren	Außen | Bestand & Neubau	LV03 - Alu-Elemente	2 Tage	Mit 15.07.26	Don 16.07.26
36			Elemente montieren	Innen | Bestand &	LV03 - Alu-Elemente	5 Tage	Mit 22.07.26	Die 28.07.26
34			Inbetriebnahme	Außen | Bestand &	LV03 - Alu-Elemente	1 Tag	Mon 07.12.26	Mon 07.12.26
37			Inbetriebnahme	Innen | Bestand &	LV03 - Alu-Elemente	2 Tage	Mon 07.12.26	Die 08.12.26
38			Nacharbeiten	Innen | Bestand &	LV03 - Alu-Elemente	1 Tag	Mit 09.12.26	Mit 09.12.26
			Text1: LV04 - Ku-Fenster			**208t**		
28			Aufmaß	Bestand & Neubau	LV04 - Ku-Fenster	1 Tag	Mon 06.07.26	Mon 06.07.26
29			Fenster montieren	Bestand & Neubau	LV04 - Ku-Fenster	2 Tage	Mon 13.07.26	Die 14.07.26
30			Sonnenschutz montieren	Bestand & Neubau	LV04 - Ku-Fenster	2 Tage	Mit 15.07.26	Don 16.07.26
31			Nacharbeiten	Bestand & Neubau	LV04 - Ku-Fenster	1 Tag	Mon 30.11.26	Mon 30.11.26
			Text1: LV05 - Dachdecker			**209t**		
42			Attika montieren	Bestand & Neubau	LV05 - Dachdecker	2 Tage	Mon 22.06.26	Die 23.06.26
41			Dampfsperre Decke	Bestand & Neubau	LV05 - Dachdecker	2 Tage	Die 23.06.26	Mit 24.06.26
43			Flachdachaufbau herstellen	Bestand & Neubau	LV05 - Dachdecker	10 Tage	Mit 24.06.26	Die 07.07.26
44			Dachabdichtung	Bestand & Neubau	LV05 - Dachdecker	10 Tage	Mit 01.07.26	Die 14.07.26
45			Klempnerarbeiten	Bestand & Neubau	LV05 - Dachdecker	5 Tage	Mon 13.07.26	Fre 17.07.26
40			Abdichtung Fenster & Türen	Bestand & Neubau	LV05 - Dachdecker	3 Tage	Mit 15.07.26	Fre 17.07.26
113			Fallrohre herstellen	Bestand & Neubau	LV05 - Dachdecker	5 Tage	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26
46			Nacharbeiten	Bestand & Neubau	LV05 - Dachdecker	3 Tage	Mon 27.07.26	Mit 29.07.26
			Text1: LV06 - Trockenbau			**303t**		
114			Vorsatzschale herstellen	Neubau	LV06 - Trockenbau	3 Tage	Mon 21.09.26	Mit 23.09.26
64			Unterkonstruktion abgh. Decke	Neubau	LV06 - Trockenbau	5 Tage	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26
65			Beplankung abgh. Decke	Neubau	LV06 - Trockenbau	4 Tage	Mon 26.10.26	Don 29.10.26
66			Rasterplatten einlegen abgh. Decke	Neubau	LV06 - Trockenbau	3 Tage	Die 24.11.26	Don 26.11.26
			Text1: LV07 - Innenputz			**265t**		
67			Vorbereitung	Neubau	LV07 - Innenputz	3 Tage	Don 24.09.26	Mon 28.09.26
68			Innenputz herstellen	Neubau	LV07 - Innenputz	5 Tage	Die 29.09.26	Mon 05.10.26
			Text1: LV08 - Estrich und Fliesen			**294t**		
69			Dämmung auslegen	Neubau	LV08 - Estrich und Fliesen	2 Tage	Mit 07.10.26	Don 08.10.26
70			Estrich verlegen	Neubau	LV08 - Estrich und Fliesen	2 Tage	Mon 12.10.26	Die 13.10.26
71			Vorbereitung	Neubau	LV08 - Estrich und Fliesen	2 Tage	Mit 14.10.26	Don 15.10.26
117			Dämmung auslegen	Bestand	LV08 - Estrich und Fliesen	2 Tage	Mit 14.10.26	Don 15.10.26
72			Abdichten	Neubau	LV08 - Estrich und Fliesen	2 Tage	Fre 16.10.26	Mon 19.10.26
116			Estrich legen	Bestand	LV08 - Estrich und Fliesen	2 Tage	Mon 19.10.26	Die 20.10.26
73			Wandfliesen	Neubau	LV08 - Estrich und Fliesen	7 Tage	Die 20.10.26	Mit 28.10.26
74			Bodenfliesen	Neubau	LV08 - Estrich und Fliesen	5 Tage	Don 29.10.26	Mit 04.11.26
75			Verfugen	Neubau	LV08 - Estrich und Fliesen	3 Tage	Don 05.11.26	Mon 09.11.26
77			Vorbereitung	Bestand	LV08 - Estrich und Fliesen	2 Tage	Don 05.11.26	Fre 06.11.26
78			Bodenfliesen	Bestand	LV08 - Estrich und Fliesen	3 Tage	Mon 09.11.26	Mit 11.11.26
76			Versiegeln	Neubau	LV08 - Estrich und Fliesen	2 Tage	Die 10.11.26	Mit 11.11.26
79			Verfugen	Bestand	LV08 - Estrich und Fliesen	1 Tag	Don 12.11.26	Don 12.11.26
80			Versiegeln	Bestand	LV08 - Estrich und Fliesen	1 Tag	Fre 13.11.26	Fre 13.11.26
			Text1: LV09 - Bodenbelag			**13t**		
86			Vorbereitung	Neubau	LV09 - Bodenbelag	1 Tag	Mit 11.11.26	Mit 11.11.26
87			Spachteln	Neubau	LV09 - Bodenbelag	3 Tage	Don 12.11.26	Mon 16.11.26
88			Schleifen	Neubau	LV09 - Bodenbelag	1 Tag	Die 17.11.26	Die 17.11.26
89			Bodenlegen	Neubau	LV09 - Bodenbelag	4 Tage	Mit 18.11.26	Mon 23.11.26
90			Sockel	Neubau	LV09 - Bodenbelag	2 Tage	Die 24.11.26	Mit 25.11.26
91			Versiegeln	Neubau	LV09 - Bodenbelag	1 Tag	Don 26.11.26	Don 26.11.26
92			Nacharbeiten	Neubau	LV09 - Bodenbelag	2 Tage	Don 26.11.26	Fre 27.11.26
			Text1: LV10 - Maler			**23t**		
81			Vorbereitung	Neubau	LV10 - Maler	5 Tage	Mit 14.10.26	Die 20.10.26
82			Tapezieren	Neubau	LV10 - Maler	7 Tage	Mit 21.10.26	Don 29.10.26
83			Lackieren	Neubau	LV10 - Maler	3 Tage	Fre 30.10.26	Die 03.11.26
84			Streichen	Neubau	LV10 - Maler	6 Tage	Mit 04.11.26	Mit 11.11.26
85			Nacharbeiten	Neubau	LV10 - Maler	2 Tage	Mon 30.11.26	Die 01.12.26
			Text1: LV11 - Innentüren			**306t**		
93			Aufmaß	Neubau	LV11 - Innentüren	1 Tag	Mon 07.09.26	Mon 07.09.26
94			Zargenmontage	Neubau	LV11 - Innentüren	2 Tage	Mon 21.09.26	Die 22.09.26
95			Türblattmontage	Neubau	LV11 - Innentüren	2 Tage	Mon 30.11.26	Die 01.12.26
			Text1: LV12 - Gerüst			**55t**		
27			Gerüststellung	Bestand & Neubau	LV12 - Gerüst	55 Tage	Mon 18.05.26	Fre 31.07.26
			Text1: LV13 - Elektro			**30t**		
49			Grobinstallation	Bestand & Neubau	LV13 - Elektro	10 Tage	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26
50			Feininstallation	Bestand & Neubau	LV13 - Elektro	30 Tage	Mon 05.10.26	Fre 13.11.26
51			Inbetriebnahme	Bestand & Neubau	LV13 - Elektro	10 Tage	Fre 13.11.26	Don 26.11.26
52			Nacharbeiten	Bestand & Neubau	LV13 - Elektro	5 Tage	Mon 30.11.26	Fre 04.12.26
			Text1: LV14 - HSL			**274t**		
53			Grobinstallation	Bestand & Neubau	LV14 - HSL	10 Tage	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26
54			Fußbodenheizungsleitung	Neubau	LV14 - HSL	1 Tag	Fre 09.10.26	Fre 09.10.26
55			Feininstallation	Bestand & Neubau	LV14 - HSL	20 Tage	Mon 12.10.26	Fre 06.11.26
118			Fußbodenheizungsleitung	Bestand	LV14 - HSL	1 Tag	Fre 16.10.26	Fre 16.10.26
56			Einrichtung	Bestand & Neubau	LV14 - HSL	5 Tage	Mon 02.11.26	Fre 06.11.26
57			Inbetriebnahme	Bestand & Neubau	LV14 - HSL	5 Tage	Mon 09.11.26	Fre 13.11.26
58			Nacharbeiten	Bestand & Neubau	LV14 - HSL	5 Tage	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26
			Text1: LV16 - Blitzschutz			**83t**		
47	✓		Erdung	Neubau	LV16 - Blitzschutz	1 Tag	Mon 06.04.26	Mon 06.04.26
48			Außenliegender Blitzschutz	Bestand & Neubau	LV16 - Blitzschutz	3 Tage	Mon 27.07.26	Mit 29.07.26
			Text1: LV17 - GaLa-Bau			**99t**		
101			Eingänge anarbeiten	Außenbereich	LV17 - GaLa-Bau	10 Tage	Mon 30.10.26	Don 12.11.26
102			Flächen wieder herrichten	Außenbereich	LV17 - GaLa-Bau	20 Tage	Fre 13.11.26	Don 10.12.26
103			Sonstige Maßnahme	Außenbereich	LV17 - GaLa-Bau	5 Tage	Fre 11.12.26	Don 17.12.26
			Text1: LV19 - Baureinigung			**13t**		
104			Grobreinigung	Bestand & Neubau	LV19 - Baureinigung	2 Tage	Fre 27.11.26	Mon 30.11.26
105			Glasreinigung	Bestand & Neubau	LV19 - Baureinigung	1 Tag	Die 01.12.26	Die 01.12.26
106			Feinreinigung	Bestand & Neubau	LV19 - Baureinigung	3 Tage	Mit 09.12.26	Fre 11.12.26
107			Endreinigung	Bestand & Neubau	LV19 - Baureinigung	2 Tage	Mon 14.12.26	Die 15.12.26
			Text1: LV20 - Mobile Trennwand			**310t**		
59			Aufmaß	Neubau	LV20 - Mobile Trennwand	1 Tag	Mon 07.09.26	Mon 07.09.26
60			Einbau Schienen	Neubau	LV20 - Mobile Trennwand	3 Tage	Mon 26.10.26	Mit 28.10.26
61			Einbau Mobile-Trennwand	Neubau	LV20 - Mobile Trennwand	3 Tage	Fre 27.11.26	Die 01.12.26
62			Inbetriebnahme	Neubau	LV20 - Mobile Trennwand	2 Tage	Mit 02.12.26	Don 03.12.26
63			Nacharbeiten	Neubau	LV20 - Mobile Trennwand	2 Tage	Fre 04.12.26	Mon 07.12.26
			Text1: LV21 - WC-Trennwand			**18t**		
98			Aufmaß	Neubau	LV21 - WC-Trennwand	1 Tag	Don 05.11.26	Don 05.11.26
99			Liefern und Montieren	Neubau	LV21 - WC-Trennwand	3 Tage	Mit 25.11.26	Fre 27.11.26
100			Nacharbeiten	Neubau	LV21 - WC-Trennwand	1 Tag	Mon 30.11.26	Mon 30.11.26
			Text1: LV24 - Schlosser			**5t**		
96			Traverse für Wärmepumpe	Bestand & Neubau	LV24 - Schlosser	5 Tage	Mon 22.06.26	Fre 26.06.26

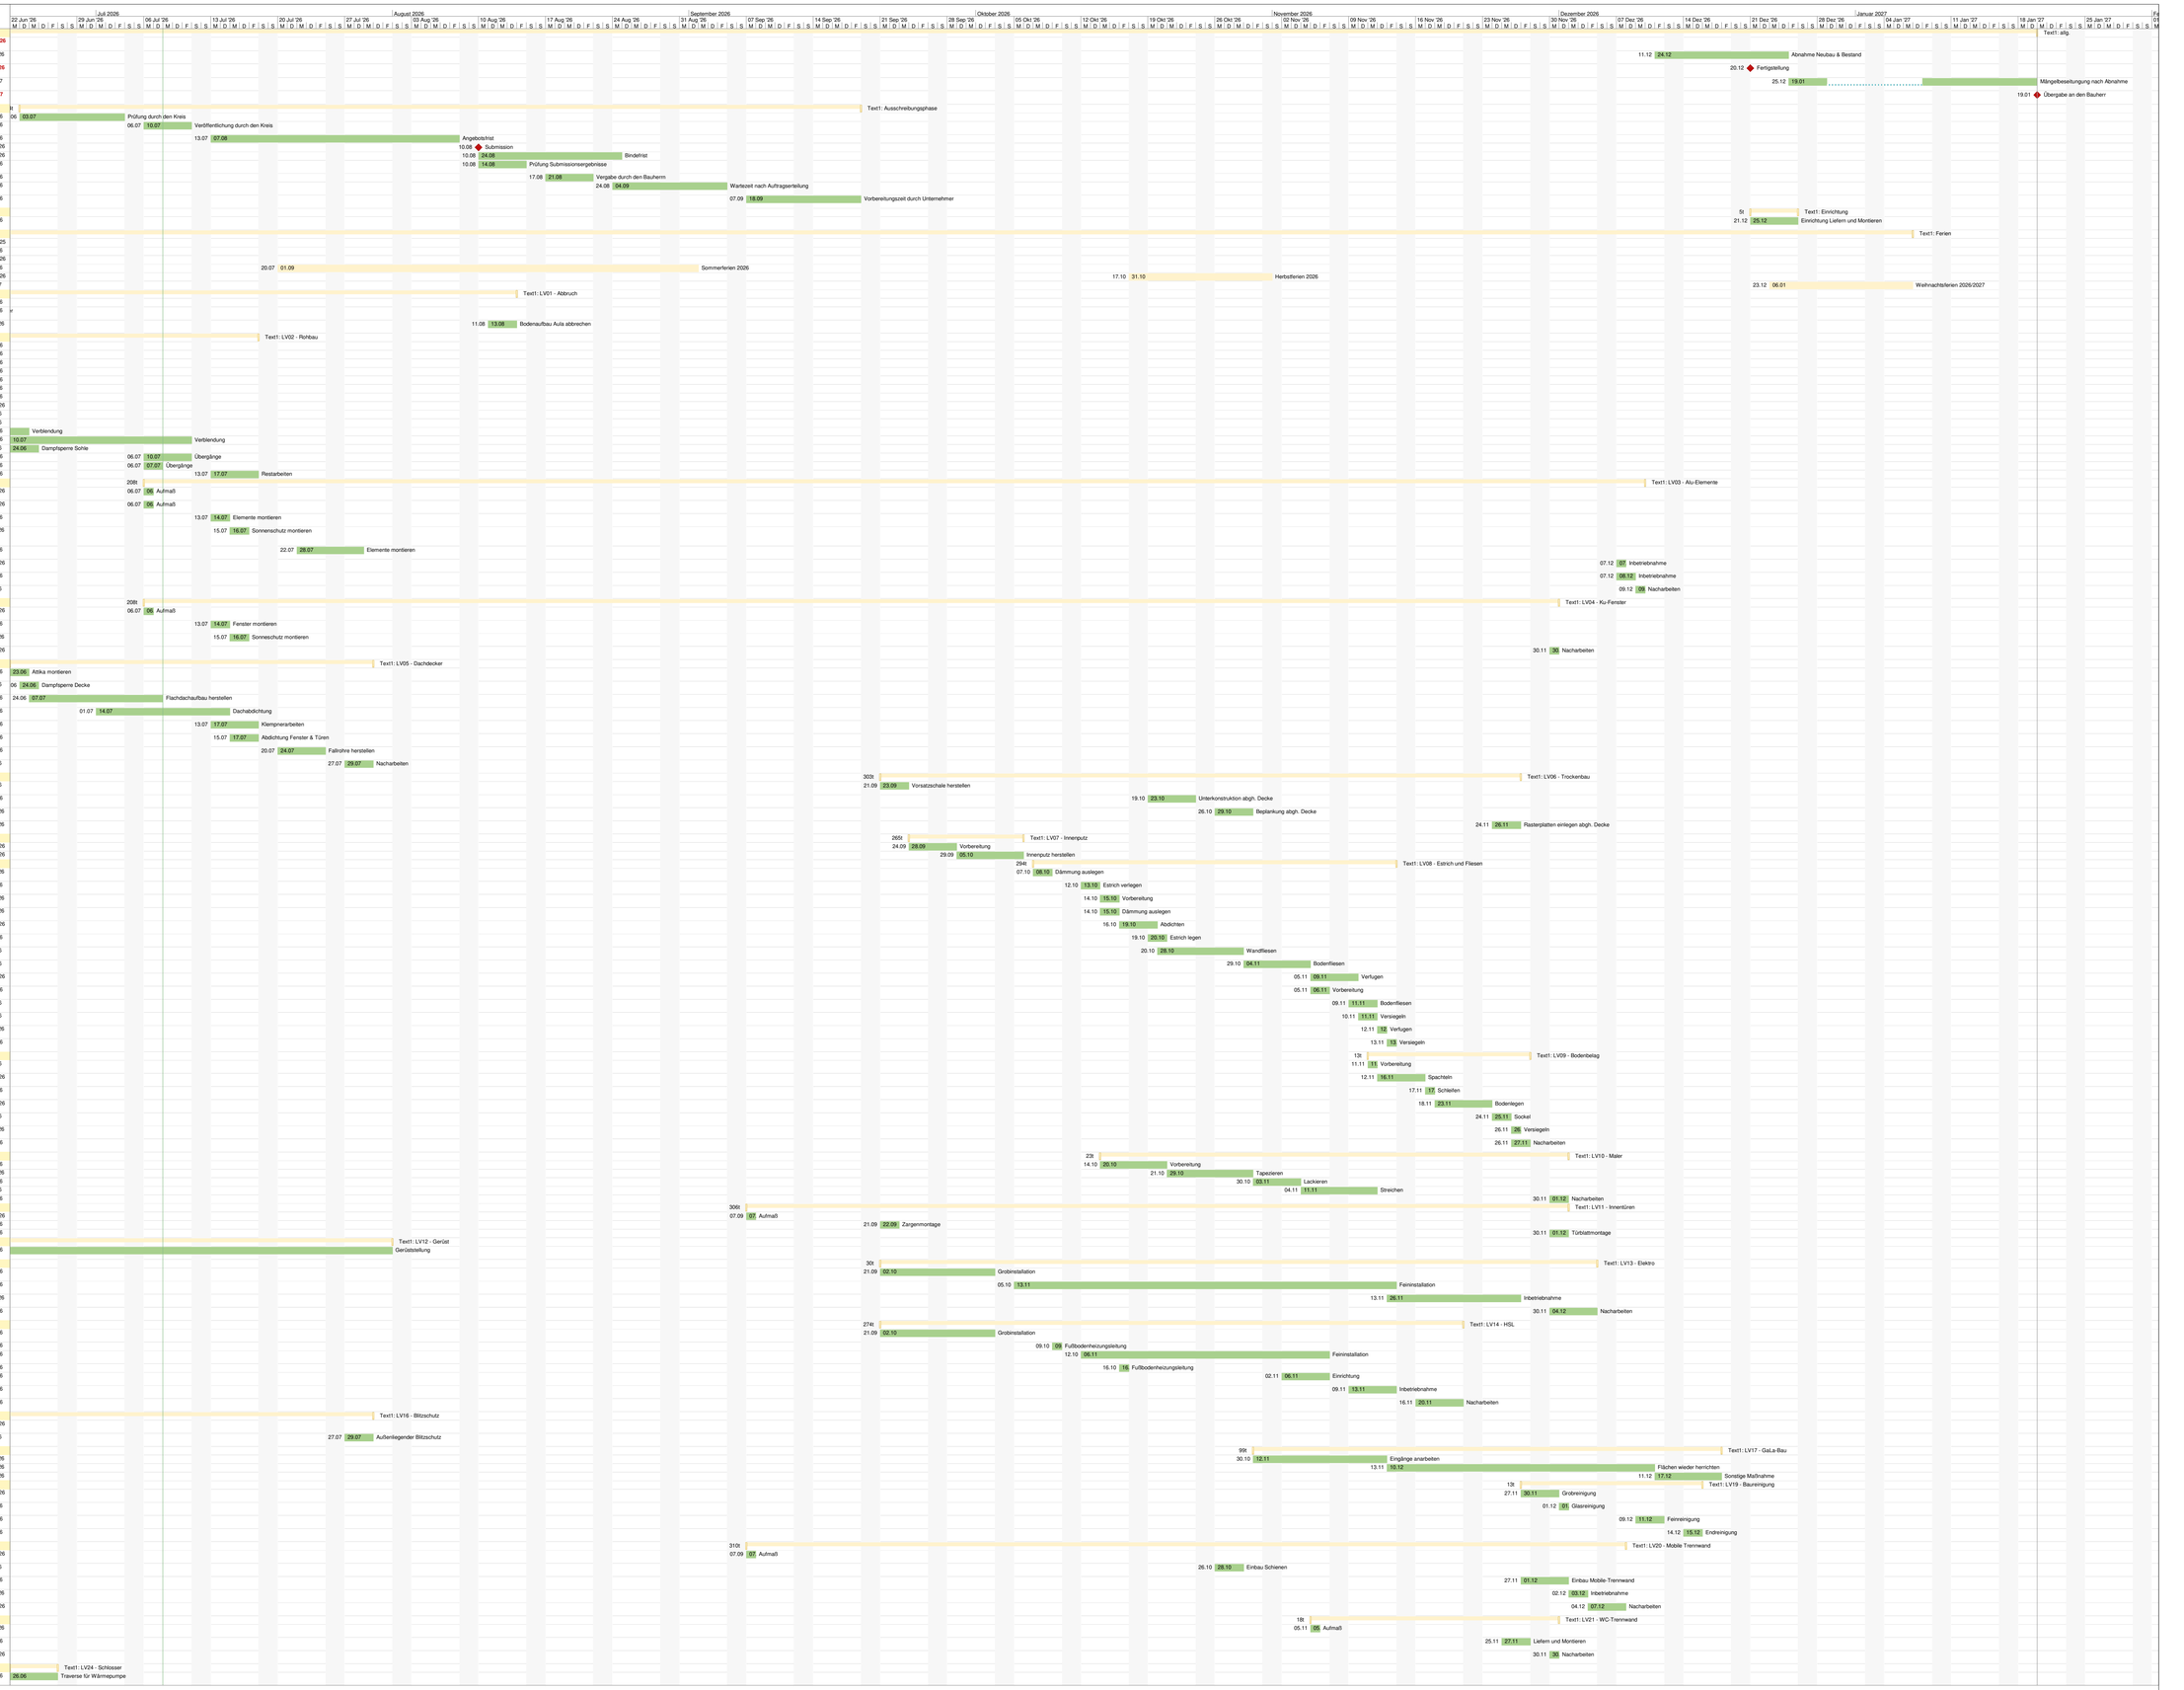

Projekt: Bauzeitenplan ALS Sch
Datum: Mit 08.07.26

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelrollup | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag | In Arbeit | Manueller Fortschritt | Sammelvorgang 2. Ebene
