
Nr.		Vorgangsr	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1			**LP1-5-Planung**	**422 Tage?**	**Fre 13.09.24**	**Mon 27.04.26**
2			**LP6-7-Vergabe**	**384 Tage**	**Mit 25.02.26**	**Fre 13.08.27**
3			**LP 5-8 Bauausführung**	**532 Tage?**	**Mon 09.03.26**	**Mit 05.04.28**
4			**Bauvorbereitung**	**135 Tage**	**Mon 09.03.26**	**Fre 11.09.26**
5			Baubeginn Rückbau	1 Tag	Mon 09.03.26	Mon 09.03.26
6			Rückbau	14 Wochen	Die 10.03.26	Mon 15.06.26
7			Ausbau Kunstglasfenster	2 Wochen	Die 28.07.26	Mon 10.08.26
8			Aufbau Baustelleneinrichtung	3 Wochen	Mon 24.08.26	Fre 11.09.26
9			**Bauarbeiten Rohbau + Hülle**	**218 Tage?**	**Fre 25.09.26**	**Mit 11.08.27**
10			Baubeginn Hochbau (Rohbauarbeiten)	1 Tag	Fre 25.09.26	Fre 25.09.26
11			Rohbau: Erdarbeiten und Fundmentvorbereitung	10 Wochen	Die 29.09.26	Mon 07.12.26
12			TGA Blitzschutz (Fundamentenerder)	1 Woche	Die 01.12.26	Mon 07.12.26
13			Rohbau: Bodenplatte	1 Woche	Die 08.12.26	Mon 14.12.26
14			Rohbau: Aufzugschacht EG/OG	3 Wochen	Die 15.12.26	Die 19.01.27
15			Rohbau: Umbau Bestandsdecke: Abbruch, Fundamente, MW, Anpassung Decke	4 Wochen	Die 08.12.26	Die 19.01.27
16			Robau: Ergänzung fundamente Bestand	4 Wochen	Die 15.12.26	Die 26.01.27
17			Rohbau: Mauerwerksarbeiten Abbruch und Umbau Bestand Öffnungen	10 Wochen	Die 22.12.26	Die 16.03.27
18			Holzbau: Werksattplanung und Materialbestellung	6 Wochen	Die 17.11.26	Die 12.01.27
19			Holzbau: Arbeitsvorbereitung + Vorfertigung Holzbau	17 Wochen	Die 15.12.26	Die 27.04.27
20			Holzbau: Wände + Decke EG Neubau	6 Wochen	Mit 17.02.27	Die 30.03.27
21			Holzbau: Wände + Decke OG Neubau	4 Wochen	Mit 31.03.27	Die 27.04.27
22			Holzbau: Abbruch Umbau Bestanddach Neubau	4 Wochen	Mit 14.04.27	Die 11.05.27
23			Holzbau: Dach OG Neubau	4 Wochen	Mit 28.04.27	Die 25.05.27
24			Holzbau: Bestandswände + Fassadenbekleidung	12 Wochen	Mit 14.04.27	Die 06.07.27
25			Fenster und Außentüren Vorfertigung	14 Wochen	Mit 10.02.27	Die 18.05.27
26			Fenster und Außentüren	10 Wochen	Mit 05.05.27	Die 13.07.27
27			Dachdeckung + Abdichtungsarbeiten	24 Wochen	Mit 17.02.27	Die 03.08.27
28			Metallbauarbeiten Außentreppe Vorfertigung	8 Wochen	Mit 19.05.27	Mit 14.07.27
29			Metallbauarbeiten Außentreppen	4 Wochen	Mit 14.07.27	Die 10.08.27

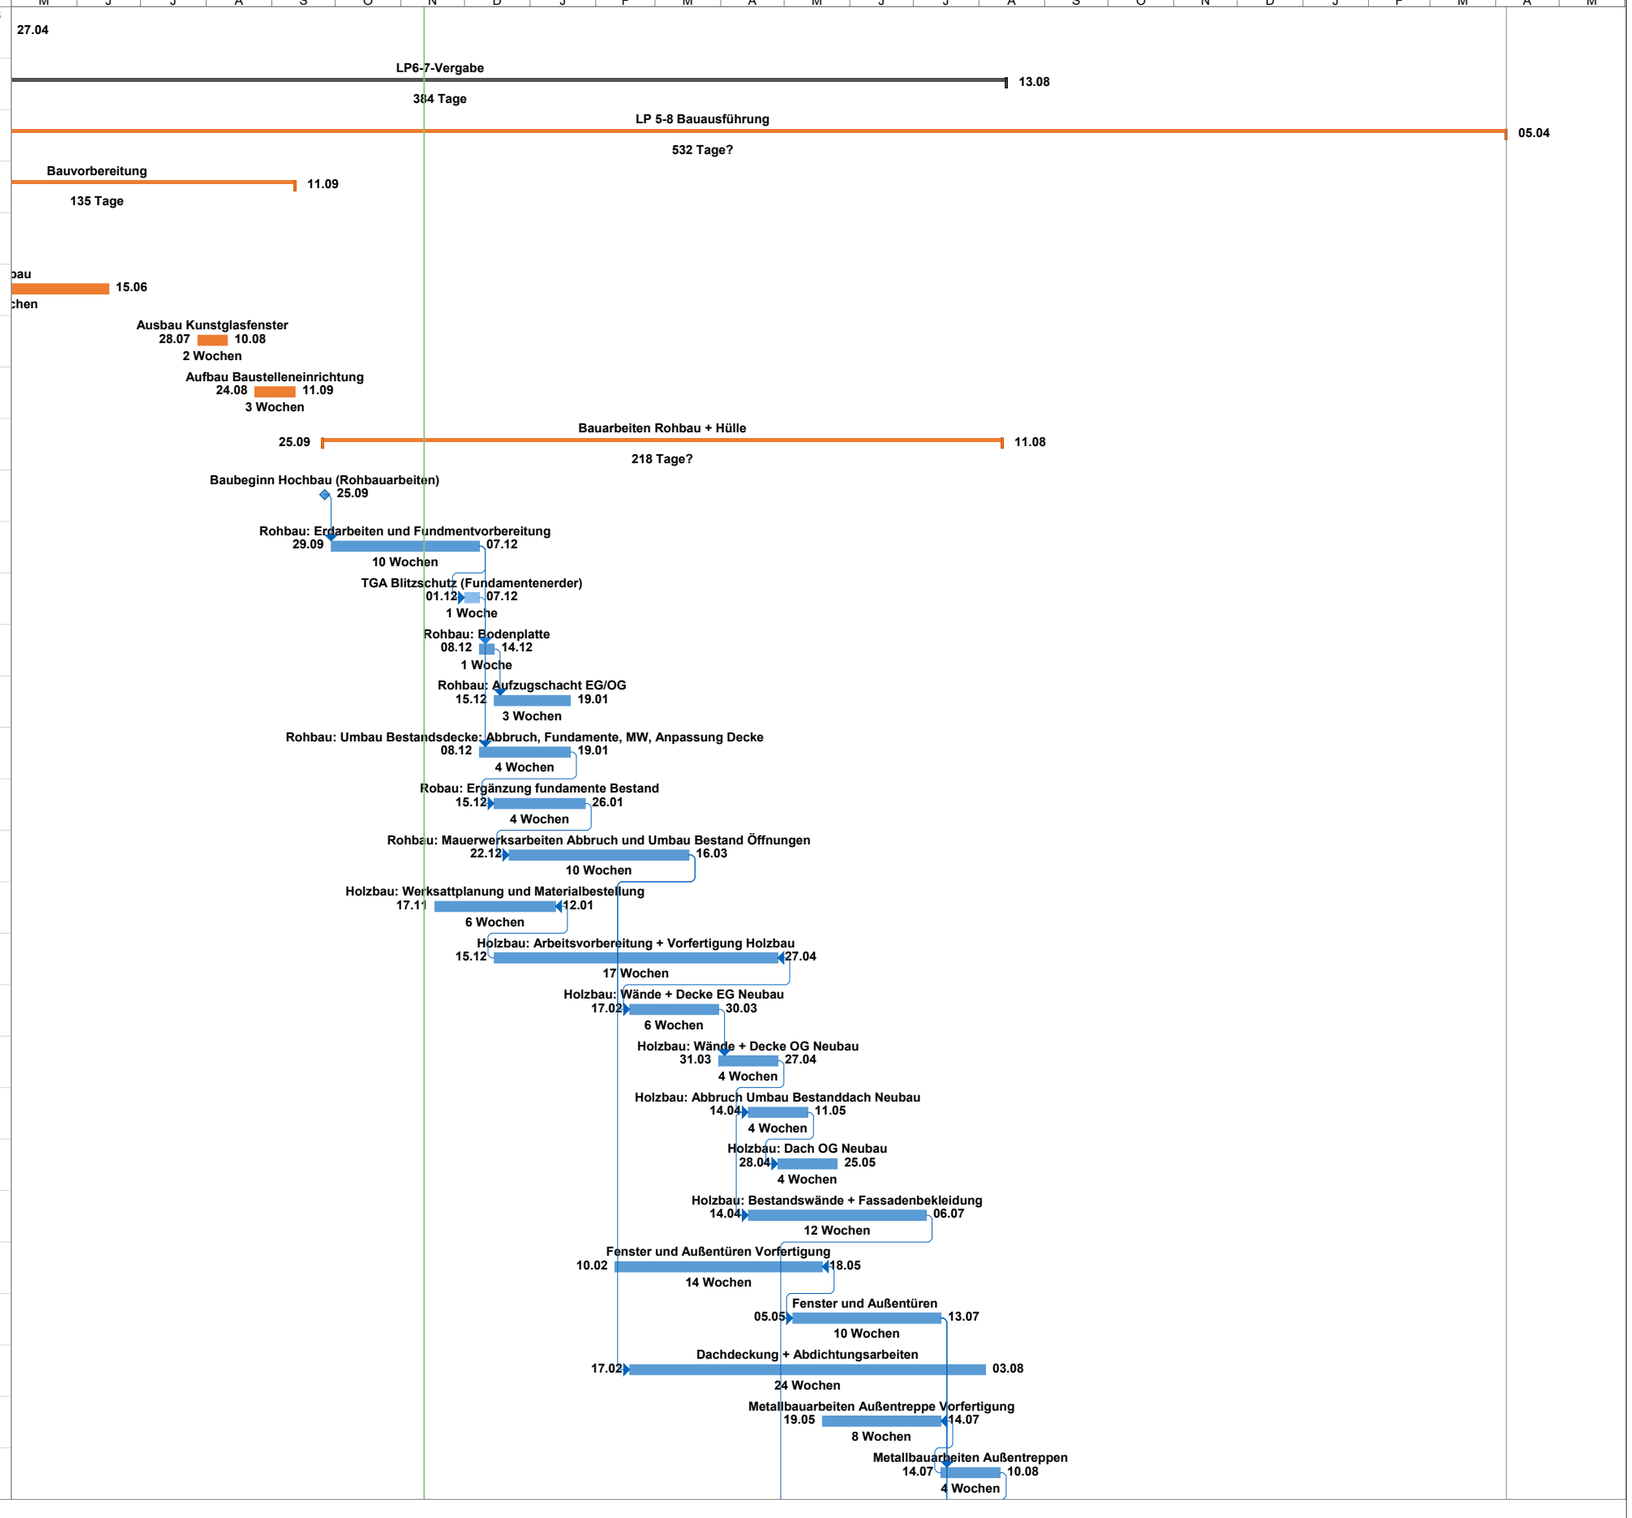


Surmmrw#Udkp hqwhup bqsodq
Gdwp #Grq#15144159

Yrujdqj Vdp p hqyrujdqj Iqdnwåyhu#P hldqgwhlq QxuSdxhu QxuDqidqj H{whuqhuP hldqgwhlq P dqpxhdnu#Iruwfkulw
Xqwhueufkxqj Surmmrwdp p hqyrujdqj Iqdnwåyhu#Vdp p hqyrujdqj P dqpxhdnu#Vdp p haxoxs QxuHqgh Vwdfkwdj
P hldqgwhlq Iqdnwåyhu#Yrujdqj P dqpxhdnu#Yrujdqj P dqpxhdnu#Vdp p hqyrujdqj H{whuqh#Yrujfiqjh Iq#Duehlw

Vhlwh#1

Nr.	Vorgangsr	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
30		Restarbeiten Blitzschutz	11 Tage?	Mit 28.07.27	Mit 11.08.27
31		Sonnenschutz	4 Wochen	Mit 14.07.27	Die 10.08.27
32		Blower Door Test	1 Woche	Mit 14.07.27	Die 20.07.27
33		**Bauarbeiten Ausbau**	**275 Tage**	**Mit 03.03.27**	**Die 21.03.28**
34		TGA Rohinstallation + Grundistallation Aufzug	12 Wochen	Mit 03.03.27	Die 25.05.27
35		Trockenbau OG Unterkonstruktion + TGA Installation	6 Wochen	Mit 05.05.27	Die 15.06.27
36		Trockenbau EG Unterkonstruktion + TGA Installation	8 Wochen	Mit 02.06.27	Die 27.07.27
37		Putzarbeiten Bestand	10 Wochen	Mit 16.06.27	Die 24.08.27
38		Trockenbau Wandbeplankung OG	4 Wochen	Mit 16.06.27	Die 13.07.27
39		Trockenbau Wandbeplankung EG	4 Wochen	Mit 28.07.27	Die 24.08.27
40		Estrich EG/OG	4 Wochen	Mit 14.07.27	Die 10.08.27
41		Estrich EG/OG Trocknung 2*28T (pro Etage 2W versetzt)	6 Wochen	Mit 28.07.27	Die 07.09.27
42		Fliesen	6 Wochen	Mit 08.09.27	Die 19.10.27
43		Metallbauarbeiten innen Vorfertigung	6 Wochen	Mit 30.06.27	Mit 11.08.27
44		Metallbauarbeiten innen	2 Wochen	Mit 11.08.27	Die 24.08.27
45		Malerarbeiten EG/OG	8 Wochen	Mit 25.08.27	Die 19.10.27
46		TGA Feininstallation	6 Wochen	Die 14.09.27	Mon 25.10.27
47		Akustikdecken EG/OG	8 Wochen	Mit 22.09.27	Die 16.11.27
48		Tischler Türen Vorbestellung	12 Wochen	Mit 28.07.27	Mit 20.10.27
49		Tischler Türen	8 Wochen	Mit 20.10.27	Die 14.12.27
50		Bodenbelagsarbeiten Vorbestellung	12 Wochen	Mit 25.08.27	Mit 17.11.27
51		Bodenbelagarbeiten EG/OG	8 Wochen	Mit 17.11.27	Die 11.01.28
52		Tischler Innenausstattung + Möbel	8 Wochen	Mit 12.01.28	Die 07.03.28
53		Schließanlage	2 Wochen	Mit 23.02.28	Die 07.03.28
54		Baureinigung	2 Wochen	Mit 08.03.28	Die 21.03.28
55		Abnahmen und Restarbeiten Gebäude	8 Wochen	Mit 09.02.28	Die 04.04.28
56		Aussenanlagen	7 Monate	Mon 16.08.27	Fre 25.02.28
57		Nutzungsaufnahme (Schuljahr 2028/2029)	1 Tag	Mit 05.04.28	Mit 05.04.28
58		**Umzug aus Ersatzquartier**	**50 Tage**	**Mit 26.01.28**	**Mit 05.04.28**

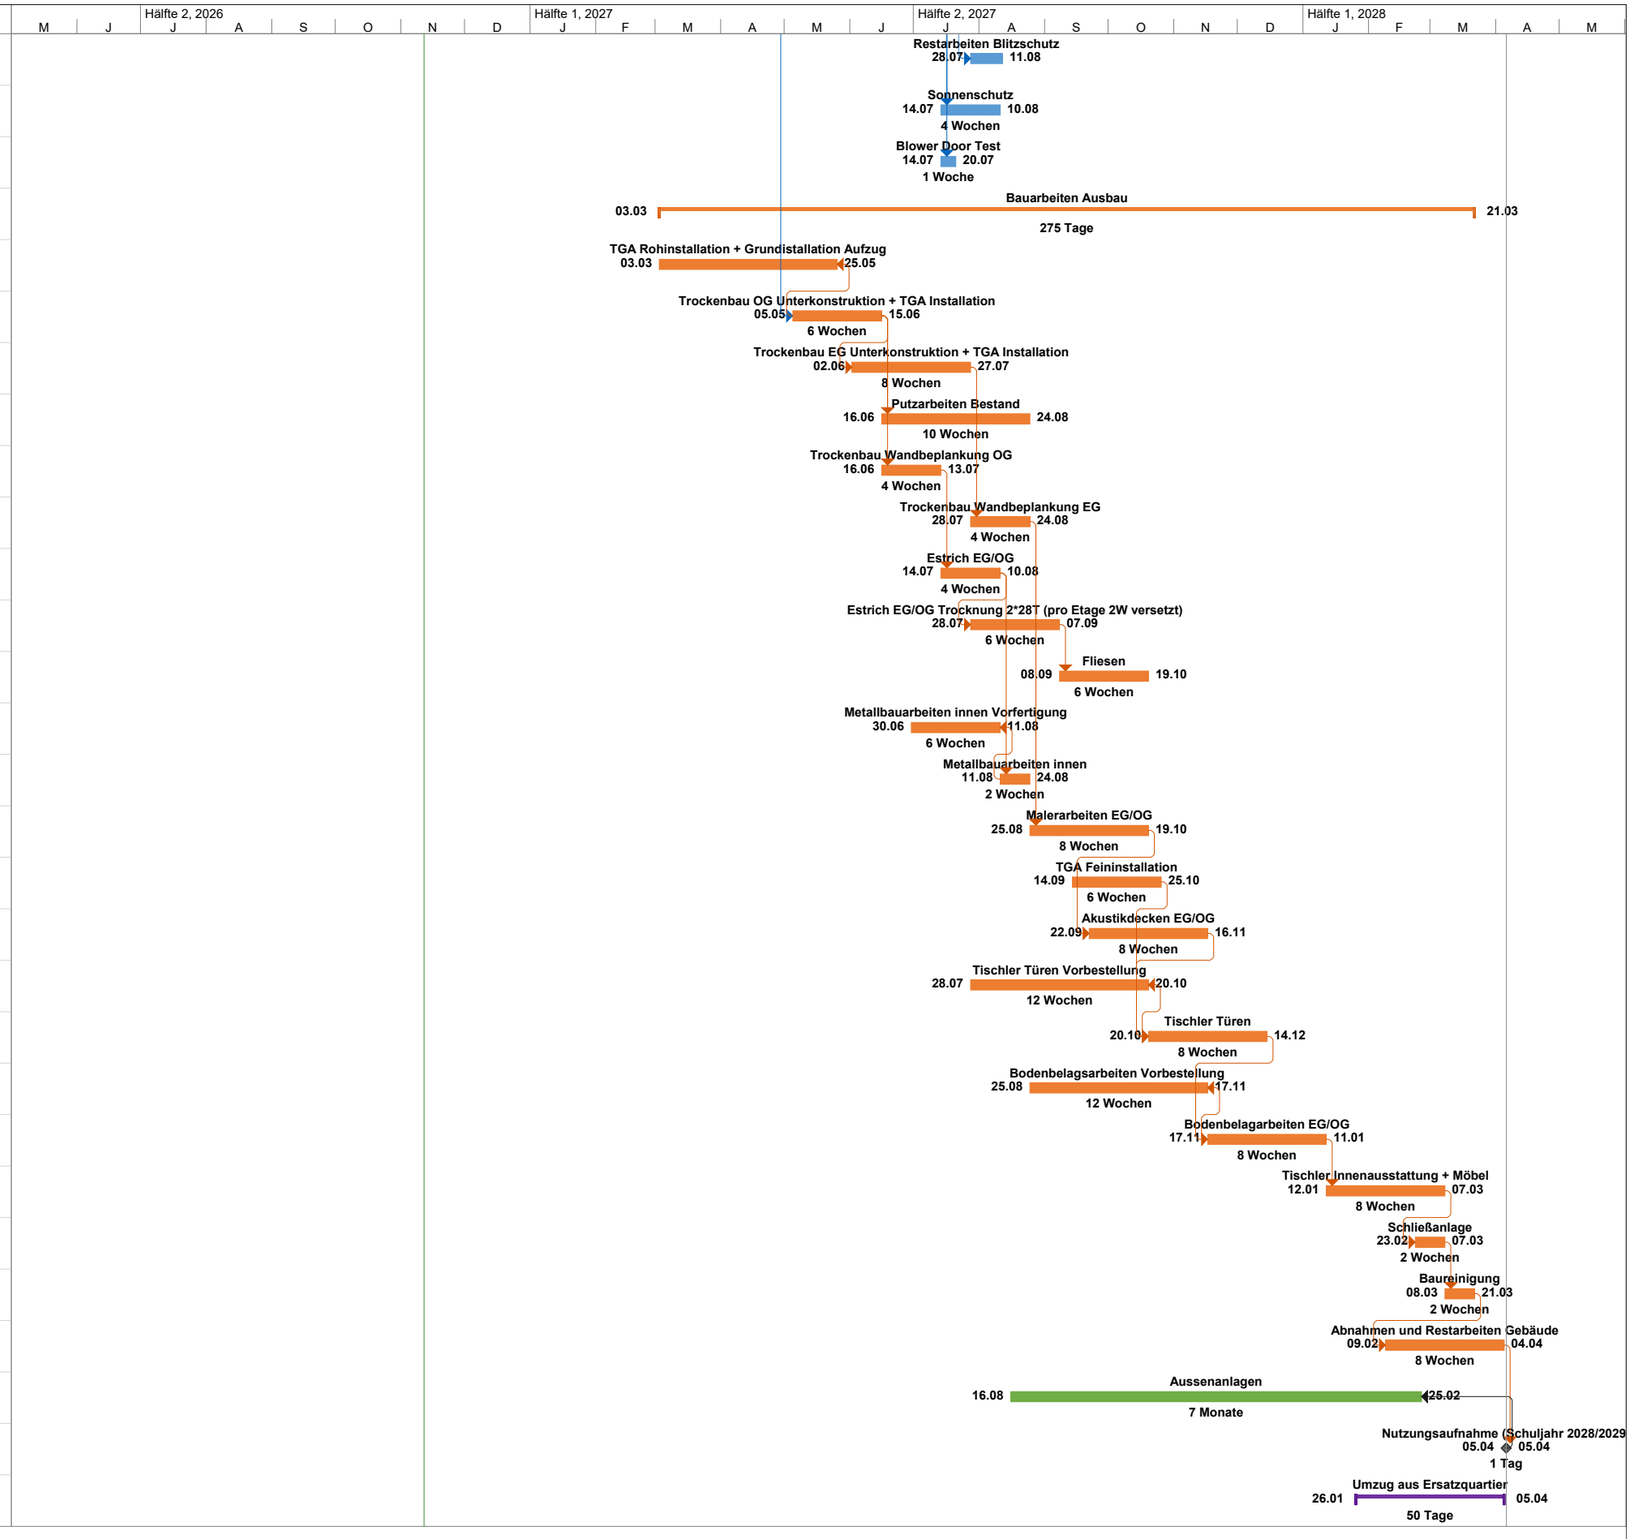

Surmmw#Udkp hqwhup bqsodq
Gdwp #Grq#15144159
Yrujdqj
Xqwhuehfkxqj
P hlhqwhlq
Vdp p hqyrujdqj
Surmmwdp p hqyrujdqj
Iqdnwÿhu#Yrujdqj
Iqdnwÿhu#P hlhqwhlq
Iqdnwÿhu#Vdp p hqyrujdqj
P dqxhakmu#Yrujdqj
QxuGdxhu
P dqxhakmu#Vdp p hqyrujdqj
P dqxhakmu#Vdp p hqyrujdqj
Qxu#Dqidqj
Qxu#Hqgh
H{whujhu#Yrujfiqjh
H{whujhu#P hlhqwhlq
VwdfkwdjIq#Duehlw
P dqxhakmu#Fruwfkulw
Vhlwh#5
