Errichtung Steg mit Treppen in Bocholt

Roxeler Ingenieurgesellschaft
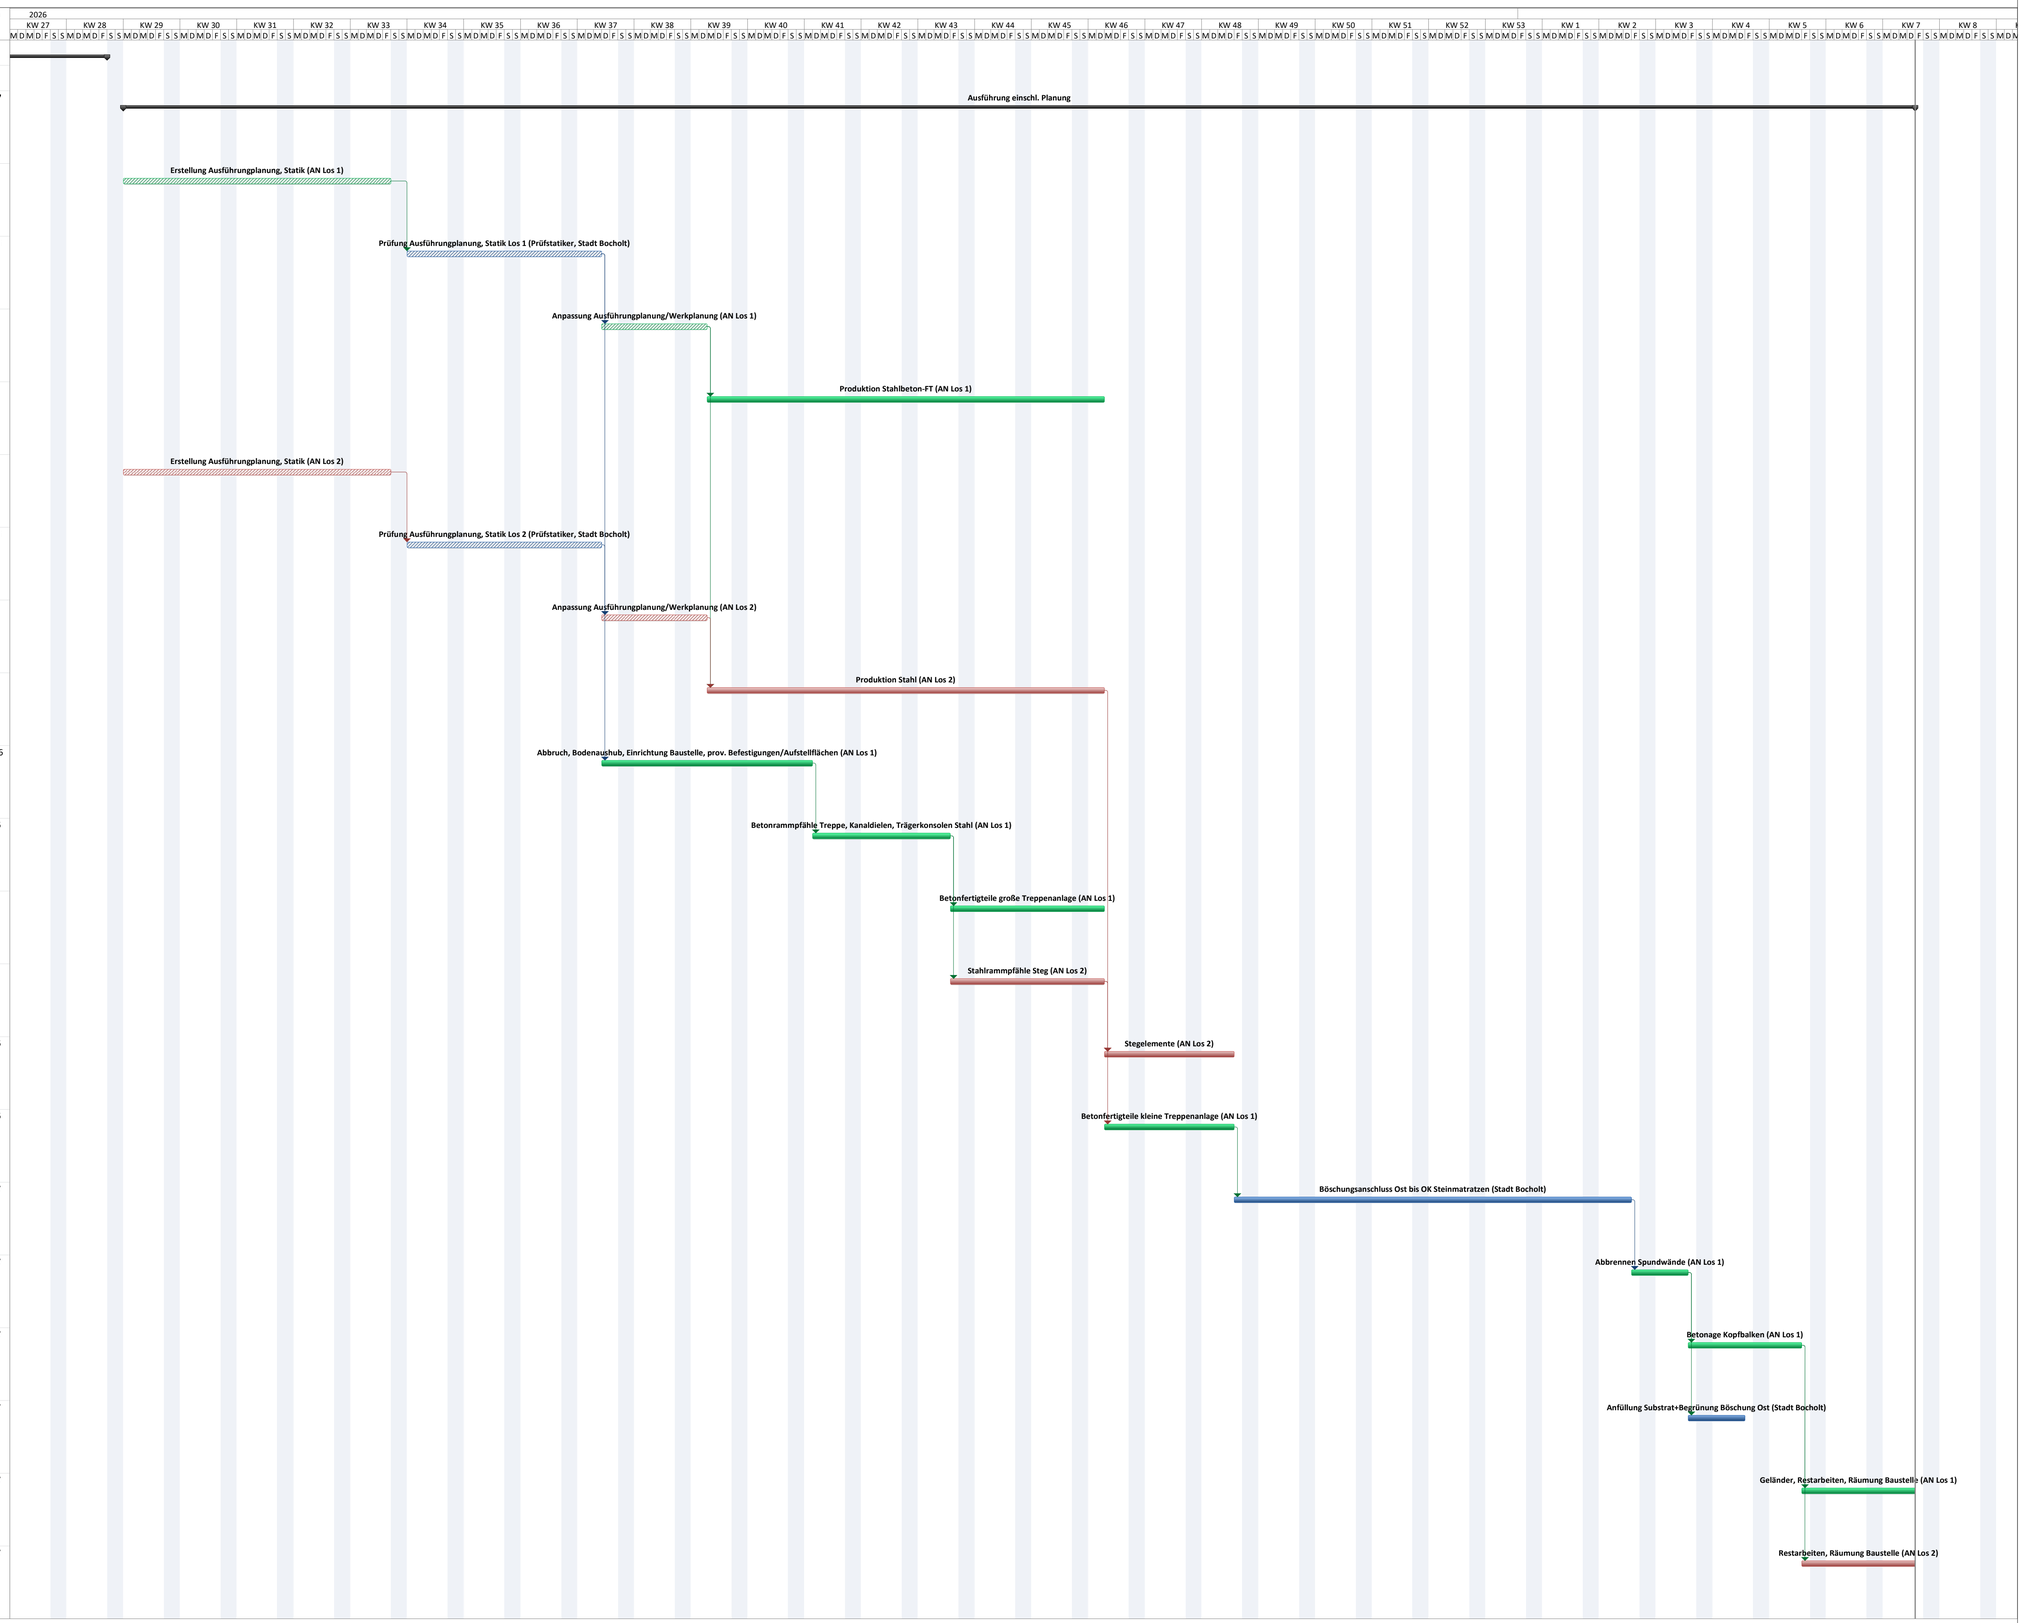
Nr.	Vorgan	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen
1		**Vergabe**	**42 Tage**	**Mo 11.05.26**	**Fr 10.07.26**
5					
6		**Ausführung einschl. Planung**	**159 Tage**	**Mo 13.07.26**	**Do 18.02.27**
7		Erstellung Ausführungplanung, Statik (AN Los 1)	25 Tage	Mo 13.07.26	Fr 14.08.26
8		Prüfung Ausführungplanung, Statik Los 1 (Prüfstatiker, Stadt Bocholt)	18 Tage	Mo 17.08.26	Mi 09.09.26
9		Anpassung Ausführungplanung/Werkplanung (AN Los 1)	9 Tage	Do 10.09.26	Di 22.09.26
10		Produktion Stahlbeton-FT (AN Los 1)	35 Tage	Mi 23.09.26	Di 10.11.26
11		Erstellung Ausführungplanung, Statik (AN Los 2)	25 Tage	Mo 13.07.26	Fr 14.08.26
12		Prüfung Ausführungplanung, Statik Los 2 (Prüfstatiker, Stadt Bocholt)	18 Tage	Mo 17.08.26	Mi 09.09.26
13		Anpassung Ausführungplanung/Werkplanung (AN Los 2)	9 Tage	Do 10.09.26	Di 22.09.26
14		Produktion Stahl (AN Los 2)	35 Tage	Mi 23.09.26	Di 10.11.26
15		Abbruch, Bodenaushub, Einrichtung Baustelle, prov. Befestigungen/Aufstellflächen (AN Los 1)	18 Tage	Do 10.09.26	Mo 05.10.26
16		Betonrammpfähle Treppe, Kanaldielen, Trägerkonsolen Stahl (AN Los 1)	13 Tage	Di 06.10.26	Do 22.10.26
17		Betonfertigteile große Treppenanlage (AN Los 1)	13 Tage	Fr 23.10.26	Di 10.11.26
18		Stahlrammpfähle Steg (AN Los 2)	13 Tage	Fr 23.10.26	Di 10.11.26
19		Stegelemente (AN Los 2)	12 Tage	Mi 11.11.26	Do 26.11.26
20		Betonfertigteile kleine Treppenanlage (AN Los 1)	12 Tage	Mi 11.11.26	Do 26.11.26
21		Böschungsanschluss Ost bis OK Steinmatratzen (Stadt Bocholt)	35 Tage	Fr 27.11.26	Do 14.01.27
22		Abbrennen Spundwände (AN Los 1)	5 Tage	Fr 15.01.27	Do 21.01.27
23		Betonage Kopfbalken (AN Los 1)	10 Tage	Fr 22.01.27	Do 04.02.27
24		Anfüllung Substrat+Begrünung Böschung Ost (Stadt Bocholt)	5 Tage	Fr 22.01.27	Do 28.01.27
25		Geländer, Restarbeiten, Räumung Baustelle (AN Los 1)	10 Tage	Fr 05.02.27	Do 18.02.27
26		Restarbeiten, Räumung Baustelle (AN Los 2)	10 Tage	Fr 05.02.27	Do 18.02.27
