2026-03-23-BzPl_VE3

Projekt: BRI-SZ-G22 Brilon, Schulzentrum Brilon - SLZ Brilon Gesamtbauzeitenplan

Zeitraum: 30.07.2026 - 31.05.2029
Datum: 16.04.2026
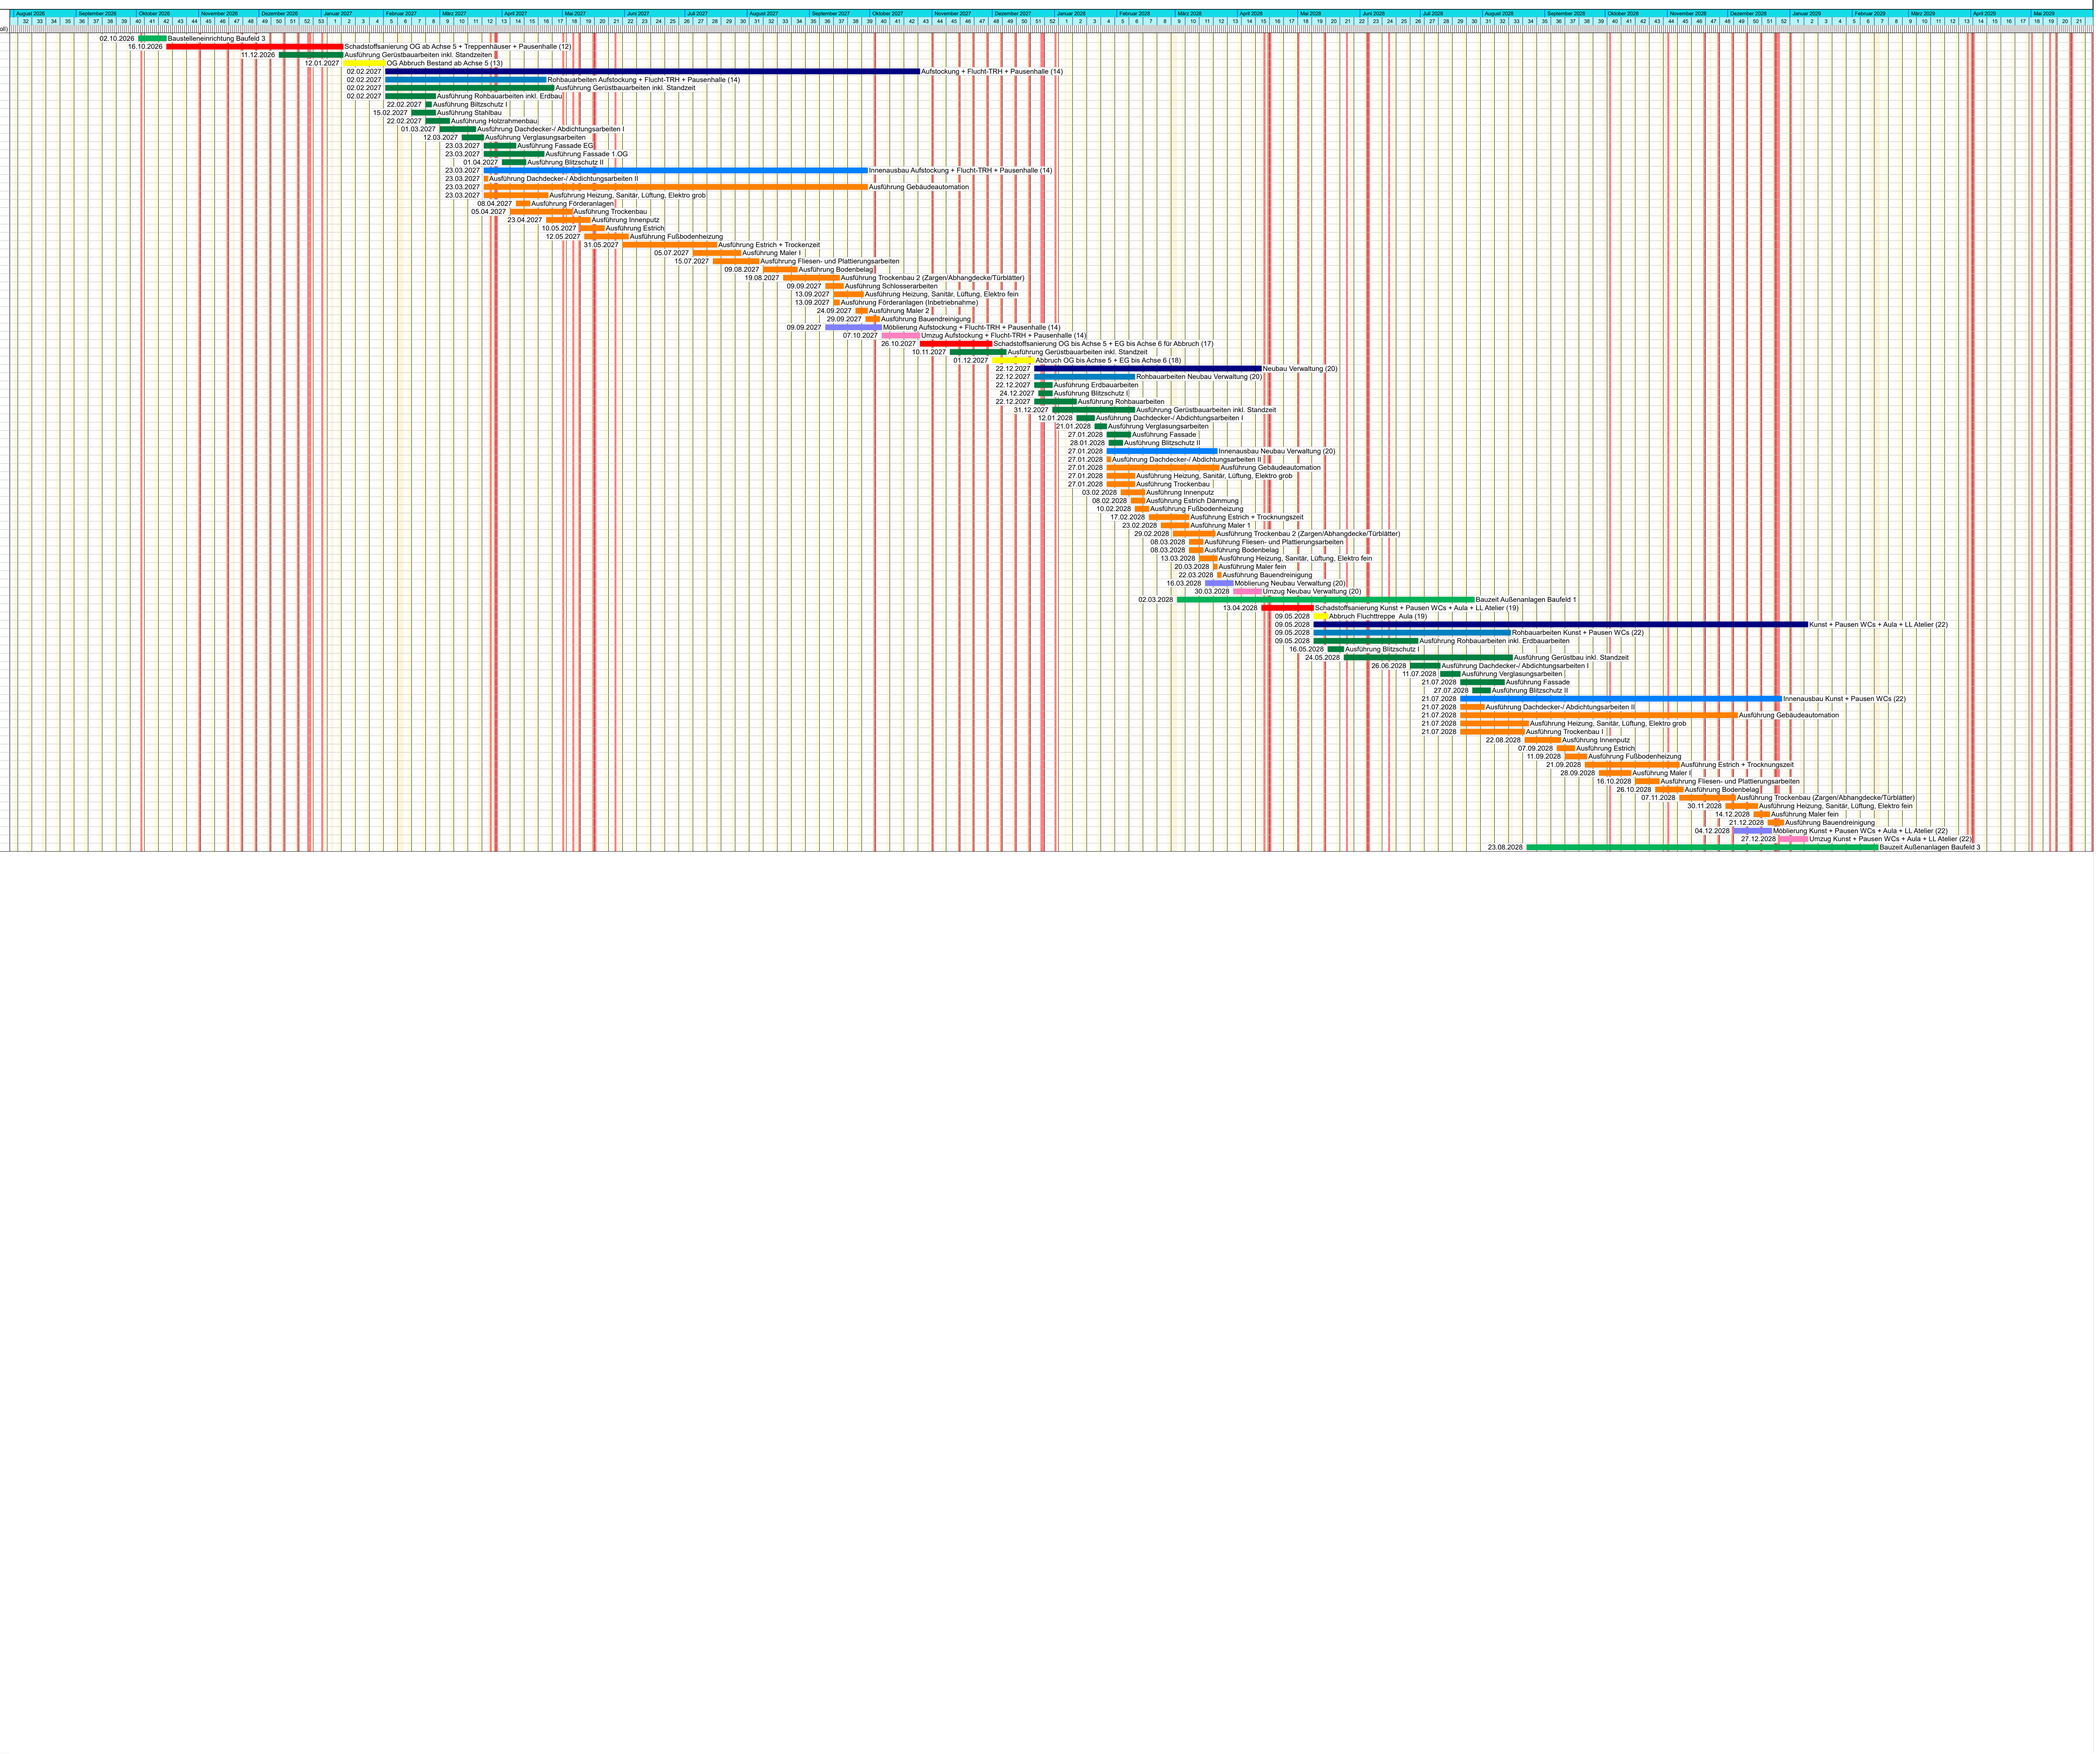
Nr.	Name	Start (Soll)	Ende (Soll)	Dauer (Soll)	Einheit (Soll)
6.5	Baustelleneinrichtung Baufeld 3	02.10.2026	15.10.2026	10	AT
6.6	Schadstoffsanierung OG ab Achse 5 + Treppenhäuser + Pausenhalle (12)	16.10.2026	11.01.2027	60	AT
6.7	Ausführung Gerüstbauarbeiten inkl. Standzeiten	11.12.2026	11.01.2027	20	AT
6.8	OG Abbruch Bestand ab Achse 5 (13)	12.01.2027	01.02.2027	15	AT
6.9	Aufstockung + Flucht-TRH + Pausenhalle (14)	02.02.2027	25.10.2027	185	AT
6.9.1	Rohbauarbeiten Aufstockung + Flucht-TRH + Pausenhalle (14)	02.02.2027	22.04.2027	56	AT
6.9.2	Ausführung Gerüstbauarbeiten inkl. Standzeit	02.02.2027	26.04.2027	58	AT
6.9.3	Ausführung Rohbauarbeiten inkl. Erdbau	02.02.2027	26.02.2027	19	AT
6.9.4	Ausführung Blitzschutz I	22.02.2027	24.02.2027	3	AT
6.9.5	Ausführung Stahlbau	15.02.2027	26.02.2027	10	AT
6.9.6	Ausführung Holzrahmenbau	22.02.2027	05.03.2027	10	AT
6.9.7	Ausführung Dachdecker-/ Abdichtungsarbeiten I	01.03.2027	18.03.2027	14	AT
6.9.8	Ausführung Verglasungsarbeiten	12.03.2027	22.03.2027	7	AT
6.9.9	Ausführung Fassade EG	23.03.2027	07.04.2027	10	AT
6.9.10	Ausführung Fassade 1.OG	23.03.2027	21.04.2027	20	AT
6.9.11	Ausführung Blitzschutz II	01.04.2027	12.04.2027	8	AT
6.9.12	Innenausbau Aufstockung + Flucht-TRH + Pausenhalle (14)	23.03.2027	29.09.2027	132	AT
6.9.13	Ausführung Dachdecker-/ Abdichtungsarbeiten II	23.03.2027	24.03.2027	2	AT
6.9.14	Ausführung Gebäudeautomation	23.03.2027	29.09.2027	132	AT
6.9.15	Ausführung Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro grob	23.03.2027	23.04.2027	22	AT
6.9.16	Ausführung Förderanlagen	08.04.2027	14.04.2027	5	AT
6.9.17	Ausführung Trockenbau	05.04.2027	05.05.2027	23	AT
6.9.18	Ausführung Innenputz	23.04.2027	14.05.2027	15	AT
6.9.19	Ausführung Estrich	10.05.2027	21.05.2027	9	AT
6.9.20	Ausführung Fußbodenheizung	12.05.2027	02.06.2027	14	AT
6.9.21	Ausführung Estrich + Trockenzeit	31.05.2027	16.07.2027	35	AT
6.9.22	Ausführung Maler I	05.07.2027	28.07.2027	18	AT
6.9.23	Ausführung Fliesen- und Plattierungsarbeiten	15.07.2027	06.08.2027	17	AT
6.9.24	Ausführung Bodenbelag	09.08.2027	25.08.2027	13	AT
6.9.25	Ausführung Trockenbau 2 (Zargen/Abhangdecke/Türblätter)	19.08.2027	15.09.2027	20	AT
6.9.26	Ausführung Schlosserarbeiten	09.09.2027	17.09.2027	7	AT
6.9.27	Ausführung Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro fein	13.09.2027	27.09.2027	11	AT
6.9.28	Ausführung Förderanlagen (Inbetriebnahme)	13.09.2027	15.09.2027	3	AT
6.9.29	Ausführung Maler 2	24.09.2027	29.09.2027	4	AT
6.9.30	Ausführung Bauendreinigung	29.09.2027	05.10.2027	5	AT
6.9.31	Möblierung Aufstockung + Flucht-TRH + Pausenhalle (14)	09.09.2027	06.10.2027	20	AT
6.9.32	Umzug Aufstockung + Flucht-TRH + Pausenhalle (14)	07.10.2027	25.10.2027	13	AT
6.10	Schadstoffsanierung OG bis Achse 5 + EG bis Achse 6 für Abbruch (17	26.10.2027	30.11.2027	25	AT
6.11	Ausführung Gerüstbauarbeiten inkl. Standzeit	10.11.2027	07.12.2027	20	AT
6.12	Abbruch OG bis Achse 5 + EG bis Achse 6 (18)	01.12.2027	21.12.2027	15	AT
6.13	Neubau Verwaltung (20)	22.12.2027	12.04.2028	81	AT
6.13.1	Rohbauarbeiten Neubau Verwaltung (20)	22.12.2027	09.02.2028	36	AT
6.13.2	Ausführung Erdbauarbeiten	22.12.2027	30.12.2027	7	AT
6.13.3	Ausführung Blitzschutz I	24.12.2027	30.12.2027	5	AT
6.13.4	Ausführung Rohbauarbeiten	22.12.2027	11.01.2028	15	AT
6.13.5	Ausführung Gerüstbauarbeiten inkl. Standzeit	31.12.2027	09.02.2028	29	AT
6.13.6	Ausführung Dachdecker-/ Abdichtungsarbeiten I	12.01.2028	20.01.2028	7	AT
6.13.7	Ausführung Verglasungsarbeiten	21.01.2028	26.01.2028	4	AT
6.13.8	Ausführung Fassade	27.01.2028	07.02.2028	8	AT
6.13.9	Ausführung Blitzschutz II	28.01.2028	03.02.2028	5	AT
6.13.10	Innenausbau Neubau Verwaltung (20)	27.01.2028	21.03.2028	39	AT
6.13.11	Ausführung Dachdecker-/ Abdichtungsarbeiten II	27.01.2028	28.01.2028	2	AT
6.13.12	Ausführung Gebäudeautomation	27.01.2028	22.03.2028	40	AT
6.13.13	Ausführung Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro grob	27.01.2028	09.02.2028	10	AT
6.13.14	Ausführung Trockenbau	27.01.2028	09.02.2028	10	AT
6.13.15	Ausführung Innenputz	03.02.2028	14.02.2028	8	AT
6.13.16	Ausführung Estrich Dämmung	08.02.2028	14.02.2028	5	AT
6.13.17	Ausführung Fußbodenheizung	10.02.2028	16.02.2028	5	AT
6.13.18	Ausführung Estrich + Trocknungszeit	17.02.2028	07.03.2028	14	AT
6.13.19	Ausführung Maler 1	23.02.2028	07.03.2028	10	AT
6.13.20	Ausführung Trockenbau 2 (Zargen/Abhangdecke/Türblätter)	29.02.2028	20.03.2028	15	AT
6.13.21	Ausführung Fliesen- und Plattierungsarbeiten	08.03.2028	14.03.2028	5	AT
6.13.22	Ausführung Bodenbelag	08.03.2028	14.03.2028	5	AT
6.13.23	Ausführung Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro fein	13.03.2028	21.03.2028	7	AT
6.13.24	Ausführung Maler fein	20.03.2028	21.03.2028	2	AT
6.13.25	Ausführung Bauendreinigung	22.03.2028	23.03.2028	2	AT
6.13.26	Möblierung Neubau Verwaltung (20)	16.03.2028	29.03.2028	10	AT
6.13.27	Umzug Neubau Verwaltung (20)	30.03.2028	12.04.2028	10	AT
6.14	Bauzeit Außenanlagen Baufeld 1	02.03.2028	27.07.2028	100	AT
6.15	Schadstoffsanierung Kunst + Pausen WCs + Aula + LL Atelier (19)	13.04.2028	08.05.2028	15	AT
6.16	Abbruch Fluchttreppe Aula (19)	09.05.2028	15.05.2028	5	AT
6.17	Kunst + Pausen WCs + Aula + LL Atelier (22)	09.05.2028	09.01.2029	168	AT
6.17.1	Rohbauarbeiten Kunst + Pausen WCs (22)	09.05.2028	14.08.2028	67	AT
6.17.2	Ausführung Rohbauarbeiten inkl. Erdbauarbeiten	09.05.2028	29.06.2028	35	AT
6.17.3	Ausführung Blitzschutz I	16.05.2028	23.05.2028	6	AT
6.17.4	Ausführung Gerüstbau inkl. Standzeit	24.05.2028	15.08.2028	57	AT
6.17.5	Ausführung Dachdecker-/ Abdichtungsarbeiten I	26.06.2028	10.07.2028	11	AT
6.17.6	Ausführung Verglasungsarbeiten	11.07.2028	20.07.2028	8	AT
6.17.7	Ausführung Fassade	21.07.2028	11.08.2028	16	AT
6.17.8	Ausführung Blitzschutz II	27.07.2028	04.08.2028	7	AT
6.17.9	Innenausbau Kunst + Pausen WCs (22)	21.07.2028	27.12.2028	110	AT
6.17.10	Ausführung Dachdecker-/ Abdichtungsarbeiten II	21.07.2028	01.08.2028	8	AT
6.17.11	Ausführung Gebäudeautomation	21.07.2028	05.12.2028	96	AT
6.17.12	Ausführung Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro grob	21.07.2028	23.08.2028	24	AT
6.17.13	Ausführung Trockenbau I	21.07.2028	31.08.2028	22	AT
6.17.14	Ausführung Innenputz	22.08.2028	08.09.2028	14	AT
6.17.15	Ausführung Estrich	07.09.2028	15.09.2028	7	AT
6.17.16	Ausführung Fußbodenheizung	11.09.2028	21.09.2028	9	AT
6.17.17	Ausführung Estrich + Trocknungszeit	21.09.2028	06.11.2028	31	AT
6.17.18	Ausführung Maler I	28.09.2028	13.10.2028	11	AT
6.17.19	Ausführung Fliesen- und Plattierungsarbeiten	16.10.2028	27.10.2028	10	AT
6.17.20	Ausführung Bodenbelag	26.10.2028	08.11.2028	9	AT
6.17.21	Ausführung Trockenbau (Zargen/Abhangdecke/Türblätter)	07.11.2028	04.12.2028	20	AT
6.17.22	Ausführung Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro fein	30.11.2028	15.12.2028	12	AT
6.17.23	Ausführung Maler fein	14.12.2028	21.12.2028	6	AT
6.17.24	Ausführung Bauendreinigung	21.12.2028	28.12.2028	4	AT
6.17.25	Möblierung Kunst + Pausen WCs + Aula + LL Atelier (22)	04.12.2028	22.12.2028	15	AT
6.17.26	Umzug Kunst + Pausen WCs + Aula + LL Atelier (22)	27.12.2028	09.01.2029	9	AT
6.18	Bauzeit Außenanlagen Baufeld 3	23.08.2028	13.02.2029	120	AT
