
Förderschulzentrum Bielefeld

Terminplan LP 8

[redacted]

Nr.	Vo	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1		**Projektstart: Startbesprechung**	**0 Tage**	**Mon 26.01.23**	**Mon 26.01.23**		
2		**Planungsphase**	**1629 Tage**	**Mon 30.01.23**	**Fre 20.07.29**		
3		**LPH 1: Grundlagenermittlung**	**65 Tage**	**Mon 30.01.23**	**Fre 28.04.23**		**H01_LWL**
25		**LPH 2: Vorplanung**	**143 Tage**	**Mon 27.02.23**	**Mit 13.09.23**		
66		**LPH 3: Entwurfsplanung**	**260 Tage**	**Don 14.09.23**	**Don 26.09.24**		
117		**LPH 3 Entwurfsplanung Umplanungsphase:**	**252 Tage**	**Mon 01.07.24**	**Die 01.07.25**		
128		Vollständiger Abruf Leistungsstufe 2 (LPH 4+S)	0 Tage	Die 01.07.25	Die 01.07.25	116;126	H01_LWL
129		**LPH 4: Bauvoranfrage**	**296 Tage**	**Mon 13.05.24**	**Mon 14.07.25**		
139		**LPH 4: Genehmigungsplanung**	**768 Tage**	**Mit 08.05.24**	**Fre 28.05.27**		
166		**LPH 5: Ausführungsplanung**	**660 Tage**	**Mon 01.09.25**	**Fre 21.04.28**		
218		Abruf Leistungsstufe 3 (LPH 6+7)	0 Tage	Fre 19.12.25	Fre 19.12.25	176	H01_LWL
219		**LPH 6+7: Ausschreibung + Vergabe**	**924 Tage**	**Mon 10.11.25**	**Fre 20.07.29**		
1035		**Planungsphase Infrastruktur ISW**	**56 Tage**	**Don 29.05.25**	**Don 14.08.25**		
1039		**Vorbereitende und Vorgezogene Maßnahmen**	**111 Tage**	**Fre 11.04.25**	**Fre 12.09.25**		
1046		**Inbetriebnahme Baustraße Ost**	**0 Tage**	**Mon 01.03.27**	**Mon 01.03.27**		
1047		**Fertigstellung Stabgitterzaun**	**0 Tage**	**Mon 22.03.27**	**Mon 22.03.27**		
1048		**G40.1 Geothermie Neubau**	**228 Tage**	**Mit 08.04.26**	**Fre 05.03.27**		
1049		G40.1_Geothermie Arbeitsvorbereitung Auftragnehmer	1 Tag	Mit 08.04.26	Mit 08.04.26	231	
1050		G40.1_Geothermie Erstellung Genehmigungsunterlagen	55 Tage	Don 09.04.26	Mit 24.06.26	1049	
1051		G40.1_Geothermie Einreichung Genehmigung	5 Tage	Don 25.06.26	Mit 01.07.26	1050	
1052		G40.1_Geothermie Bearbeitung Genehmigung Behörde	52 Tage	Don 02.07.26	Fre 11.09.26	1051	
1053		G40.1_Geothermie Arbeitsvorbereitung Auftragnehmer	40 Tage	Mon 14.09.26	Fre 06.11.26	1052	
1054		G40.1_Geothermie Erstellung	75 Tage	Mon 09.11.26	Fre 05.03.27	1053	
1055		**LPH 8: Objektüberwachung/ Bauausführung Neubau**	**829 Tage**	**Mon 22.03.27**	**Fre 05.07.30**		
1056		**Baustart Neubau**	**0 Tage**	**Mon 22.03.27**	**Mon 22.03.27**	1054;158;248;1046;1047	
1057		**G00_Baustelleneinrichtung**	**764 Tage**	**Die 23.03.27**	**Fre 05.04.30**		
1058		Vorlage + Freigabe Arbeitsplan Baustelleneinrichtung	5 Tage	Die 23.03.27	Mon 29.03.27	248	
1059		Mobile WC und Waschboxen	5 Tage	Die 30.03.27	Mon 05.04.27	1058	
1060		Bauzaun stellen	15 Tage	Die 01.06.27	Mon 21.06.27	1086	
1061		Vorbereitung Einrichtungsfläche	5 Tage	Die 11.05.27	Mon 17.05.27	1067	
1062		Stellung Sanitär + Bürocontainer	10 Tage	Die 18.05.27	Mon 31.05.27	1061	
1063		Hauptanschluss Strom + Wasser	10 Tage	Mit 28.04.27	Die 11.05.27	1058;1078	
1064		Aspaltschicht Baustraße Zufahrt Ost	5 Tage	Die 20.04.27	Mon 26.04.27	1083	
1065		Leitungsgräben Versorgung Container	5 Tage	Die 20.04.27	Mon 26.04.27	1083	
1066		Leitungsverlegung Container	5 Tage	Die 27.04.27	Mon 03.05.27	1065	
1067		Leitungsgräben für Container verfüllen	5 Tage	Die 04.05.27	Mon 10.05.27	1066	
1068		Asphaltschicht Baustraße Umfahrt (Abschnitt 1 Flügel D-A)	10 Tage	Die 17.08.27	Mon 30.08.27	1105	
1069		Baustraße 2. Teilabschnitt Flügel A/D	5 Tage	Die 07.03.28	Mon 13.03.28	1152;1155	
1070		Einrichtung Wertstoffhof	5 Tage	Die 14.03.28	Mon 20.03.28	1069	
1071		Rückbau Bauzaun A-B	5 Tage	Mon 16.07.29	Fre 20.07.29	1646EE	
1072		Rückbau Bauzaun B-C	5 Tage	Fre 19.10.29	Don 25.10.29	1647EE	
1073		Rückbau Bauzaun höhere BE-Fläche	5 Tage	Mon 01.04.30	Fre 05.04.30	1789EE	
1074		Rückbau Wertstoffhof	5 Tage	Fre 25.01.30	Don 31.01.30	1648EE	
1075		Rückbau Container	5 Tage	Fre 29.03.30	Don 04.04.30	1759;1653AE	
1076		Rückbau Reste Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mon 01.04.30	Fre 05.04.30	1789EE	
1077		**G55_Baustrom**	**5 Tage**	**Mit 21.04.27**	**Die 27.04.27**		
1078		Baustrom Aufbau	1 Woche	Mit 21.04.27	Die 27.04.27	264	
1079		**G02_Erdarbeiten**	**115 Tage**	**Die 23.03.27**	**Mon 30.08.27**		
1080		Vorlage + Freigabe Arbeitsplan	2 Wochen	Die 23.03.27	Mon 05.04.27	279	
1081		prov. Abgrenzung Baustelle	1 Woche	Die 06.04.27	Mon 12.04.27	1080	
1082		Oberbodenabtrag BE-Fläche (inkl. Bewuchs)	1 Woche	Die 06.04.27	Mon 12.04.27	1080	
1083		Kiesschicht BE-Fläche	1 Woche	Die 13.04.27	Mon 19.04.27	1082	
1084		Freimachen Bau-Gelände Bewuchs	1 Woche	Die 27.04.27	Mon 03.05.27	1064	
1085		Wurzel- und Baumschutzmaßnahmen	2 Wochen	Die 04.05.27	Mon 17.05.27	1084	
1086		Abtrag Oberboden + Andecken Schotter (20.000 m3)/ Zug um Zug	4 Wochen	Die 04.05.27	Mon 31.05.27	1084	
1087		Verbau Grundstücksgrenze	2 Wochen	Die 18.05.27	Mon 31.05.27	1086AA+2 Wochen	
1088		**Wasserhaltung (Abstimmung Kockel !!)**	**40 Tage**	**Die 27.04.27**	**Mon 21.06.27**		
1089		**Vorlage wasserrechtliche Erlaubnis**	**0 Tage**	**Die 27.04.27**	**Die 27.04.27**	**1090AE-4 Wochen**	
1090		Baustelleneinrichtung	1 Woche	Die 25.05.27	Mon 31.05.27	1086EE	
1091		Einbringen Lanzen + Prüfschächte	2 Wochen	Die 01.06.27	Mon 14.06.27	1090	
1092		Anschlüsse Wasserabfluss	1 Woche	Die 08.06.27	Mon 14.06.27	1091EE	
1093		Grundwasserabsenkung	1 Woche	Die 15.06.27	Mon 21.06.27	1092	
1094		Baugrubenaushub (25.000 m3)	5 Wochen	Die 15.06.27	Mon 19.07.27	1086;1093AA	
1095		**Rigolen**	**30 Tage**	**Die 15.06.27**	**Mon 26.07.27**		
1096		Aushub Rigolen	2 Wochen	Die 15.06.27	Mon 28.06.27	1086;1087;1093AA	
1097		Einbau Rigolen	2 Wochen	Die 29.06.27	Mon 12.07.27	1096	
1098		Verfüllung Rigolen	2 Wochen	Die 13.07.27	Mon 26.07.27	1097	
1099		Grobplanum herstellen	1 Woche	Die 27.07.27	Mon 02.08.27	1094;1098	
1100		Lastplattenversuche	1 Woche	Die 03.08.27	Mon 09.08.27	1099	
1101		Leitungs- Kabelgräben ausheben	2 Wochen	Die 15.06.27	Mon 28.06.27	1086;1087;1093AA	
1102		Leerrohrverlegung (Kabel- und Leitungsverlegung)	4 Wochen	Die 29.06.27	Mon 26.07.27	1101	
1103		TGA Geothermie: Anbindeleitungen Sondenfeld bis Baugrube	25 Tage	Die 15.06.27	Mon 19.07.27	1101AA	G40.1
1104		Gräben verfüllen	2 Wochen	Die 27.07.27	Mon 09.08.27	1102;1103	
1105		Bodenverbesserung / Frostschutzschicht UG liefern + einbauen (2000m3)	1 Woche	Die 10.08.27	Mon 16.08.27	1104;1099	
1106		Feinplanum UG / Übergabe Rohbau	1 Woche	Die 24.08.27	Mon 30.08.27	1105;1068EE	
1107		**G13.1_Rohbau (bis OK EG-Platte)**	**215 Tage**	**Die 31.08.27**	**Mon 10.07.28**		
1108		**Untergeschoss/ Gründung**	**115 Tage**	**Die 31.08.27**	**Mon 21.02.28**		
1109		Absteckungsarbeiten	1 Woche	Die 31.08.27	Mon 06.09.27	1106;327	
1110		**Technikgebäude EG (separat, außerhalb Bodenplatte)**	**46 Tage**	**Die 07.09.27**	**Die 09.11.27**		
1111		Sauberkeitsschicht/Dämmung	1 Woche	Die 07.09.27	Mon 13.09.27	1109	
1112		Grundleitungen	1 Tag	Die 14.09.27	Die 14.09.27	1111	
1113		Fundamenterder	1 Tag	Mit 15.09.27	Mit 15.09.27	1112	
1114		Ringerder	1 Tag	Don 16.09.27	Don 16.09.27	1113	
1115		Leerrohrverlegung (Kabel- und Leitungsverlegung)	1 Tag	Fre 17.09.27	Fre 17.09.27	1114	
1116		Bodenplatte	1 Woche	Mon 20.09.27	Fre 24.09.27	1115	
1117		Wände	2 Wochen	Mon 27.09.27	Fre 08.10.27	1116;1120	
1118		Dach	2 Wochen	Mon 11.10.27	Fre 22.10.27	1117	
1119		Notabdichtung (Rohbau)	1 Woche	Mit 03.11.27	Die 09.11.27	1118;359	
1120		Kranfundamente + Aufstellung	2 Wochen	Die 31.08.27	Mon 13.09.27	1109AA	
1121		Sauberkeitsschicht	1 Woche	Die 07.09.27	Mon 13.09.27	1120AA+1 Woche	
1122		Leitungen unterhalb Aufzugsunterfahrt	1 Woche	Die 07.09.27	Mon 13.09.27	1121AA	
1123		Aufzugsunterfahrt innerhalb Keller	2 Wochen	Die 14.09.27	Mon 27.09.27	1121	
1124		Randschalung + Dämmung	4 Wochen	Die 21.09.27	Mon 18.10.27	1123AA+1 Woche	
1125		Aufzugsunterfahrten Außerhalb Keller / Bewegungsbad (Beckenvertiefung)	2 Wochen	Die 28.09.27	Mon 11.10.27	1123	
1126		TGA Bewegungsbad: Einbauteile Beckenboden (Bodenabläufe und Rohrleitungen)	5 Tage	Fre 01.10.27	Don 07.10.27	1125AA+3 Tage	G13
1127		Fundamenterder	1 Woche	Die 12.10.27	Mon 18.10.27	1124EE	
1128		Grundleitungen Keller	4 Tage	Die 12.10.27	Fre 15.10.27	1127AA	
1129		Bewehrung	4 Wochen	Die 19.10.27	Mon 15.11.27	1127;1128	
1130		Betonage UG Bodenplatte (ca. 750m3);	1 Woche	Die 02.11.27	Mon 08.11.27	1129AA+2 Wochen	
1131		Ausführung Bodenplatte in 3 Bauabschnitten	2 Wochen	Die 09.11.27	Mon 22.11.27	1130	
1132		**Wände UG**	**35 Tage**	**Die 23.11.27**	**Mon 24.01.28**		
1133		Schalung Wände (ca. 2.000m2)	2 Wochen	Die 23.11.27	Mon 06.12.27	1131	
1134		Einbau Futterrohre/Wanddurchführungen UG-Wände (Erdkanal, Sole, Wärme/Kälte, Kabel)	10 Tage	Die 23.11.27	Mon 06.12.27	1133AA	
1135		Bewehrung	2 Wochen	Die 07.12.27	Mon 03.01.28	1133;1134	
1136		Leerrohre Treppenhäuser (durch Rohbau)	2 Tage	Fre 17.12.27	Mon 03.01.28	1135AA+8 Tage	
1137		Schalung schließen	1 Woche	Die 04.01.28	Mon 10.01.28	1135;1136	
1138		Betonieren	1 Woche	Die 11.01.28	Mon 17.01.28	1137;1134	
1139		Ausschalen	1 Woche	Die 18.01.28	Mon 24.01.28	1138	
1140		Treppenläufe / Podeste UG	2 Wochen	Die 25.01.28	Mon 07.02.28	1139	
1141		Dämmung Kellerwände	2 Wochen	Die 25.01.28	Mon 07.02.28	1139	
1142		TGA Geothermie: Gebäudeeinführung Sole (drückendes Wasser) + Anbindeleitung bis UG-Wand	5 Tage	Die 25.01.28	Mon 31.01.28	1141AA	
1143		Schrägabstützung Kellerwände	1 Woche	Die 25.01.28	Mon 31.01.28	1139	
1144		Verfüllung Arbeitsräume	2 Wochen	Die 08.02.28	Mon 21.02.28	1143;1141;1142	
1145		**Erdgeschoss**	**115 Tage**	**Die 01.02.28**	**Mon 10.07.28**		
1146		**Bodenplatte EG + Decke ü. UG inkl. Sockel**	**100 Tage**	**Die 01.02.28**	**Mon 19.06.28**		
1147		Schalung Decke über UG	2 Wochen	Die 01.02.28	Mon 14.02.28	1143	
1148		Randschalung Bewehrung Decke über UG	2 Wochen	Die 15.02.28	Mon 28.02.28	1147	
1149		Beton Decke über UG	1 Woche	Die 29.02.28	Mon 06.03.28	1148	
1150		Flutung UG zur Auftriebssicherheit	1 Woche	Die 07.03.28	Mon 13.03.28	1149;1138EA+28 Tage	
1151		Rückbau Wasserhaltung	1 Woche	Die 14.03.28	Mon 20.03.28	1150	
1152		TGA Heizung/Kälte: Erdleitungen Wärme/Kälte zwischen UG A und UG E	5 Tage	Die 22.02.28	Mon 28.02.28	1141;1144	
1153		TGA Sanitär: Grundleitungen unterhalb der Bodenplatte KG-Rohr	30 Tage	Die 22.02.28	Mon 03.04.28	1141;1144	
1154		TGA Sanitär: Fettabscheider + Hebeanlage Küche (unterirdisch) – Anbindung an Grundleitungen	20 Tage	Die 07.03.28	Mon 03.04.28	1153AA+10 Tage	
1155		TGA ELT: Kabelschutzrohre/Zugschächte (Anschluss an Technikgebäude über außenliegenden Schacht)	10 Tage	Die 22.02.28	Mon 06.03.28	1153AA	
1156		Feinplanumn EG/ Absteckung	1 Woche	Die 21.03.28	Mon 27.03.28	1151	
1157		Sauberkeitsschicht	1 Woche	Die 28.03.28	Mon 03.04.28	1156;1152	
1158		Randschalung + Dämmung Bodenplatte EG	2 Wochen	Die 04.04.28	Mon 17.04.28	1157;1153	
1159		Fundamenterder	2 Wochen	Die 18.04.28	Mon 01.05.28	1148;375;1158	

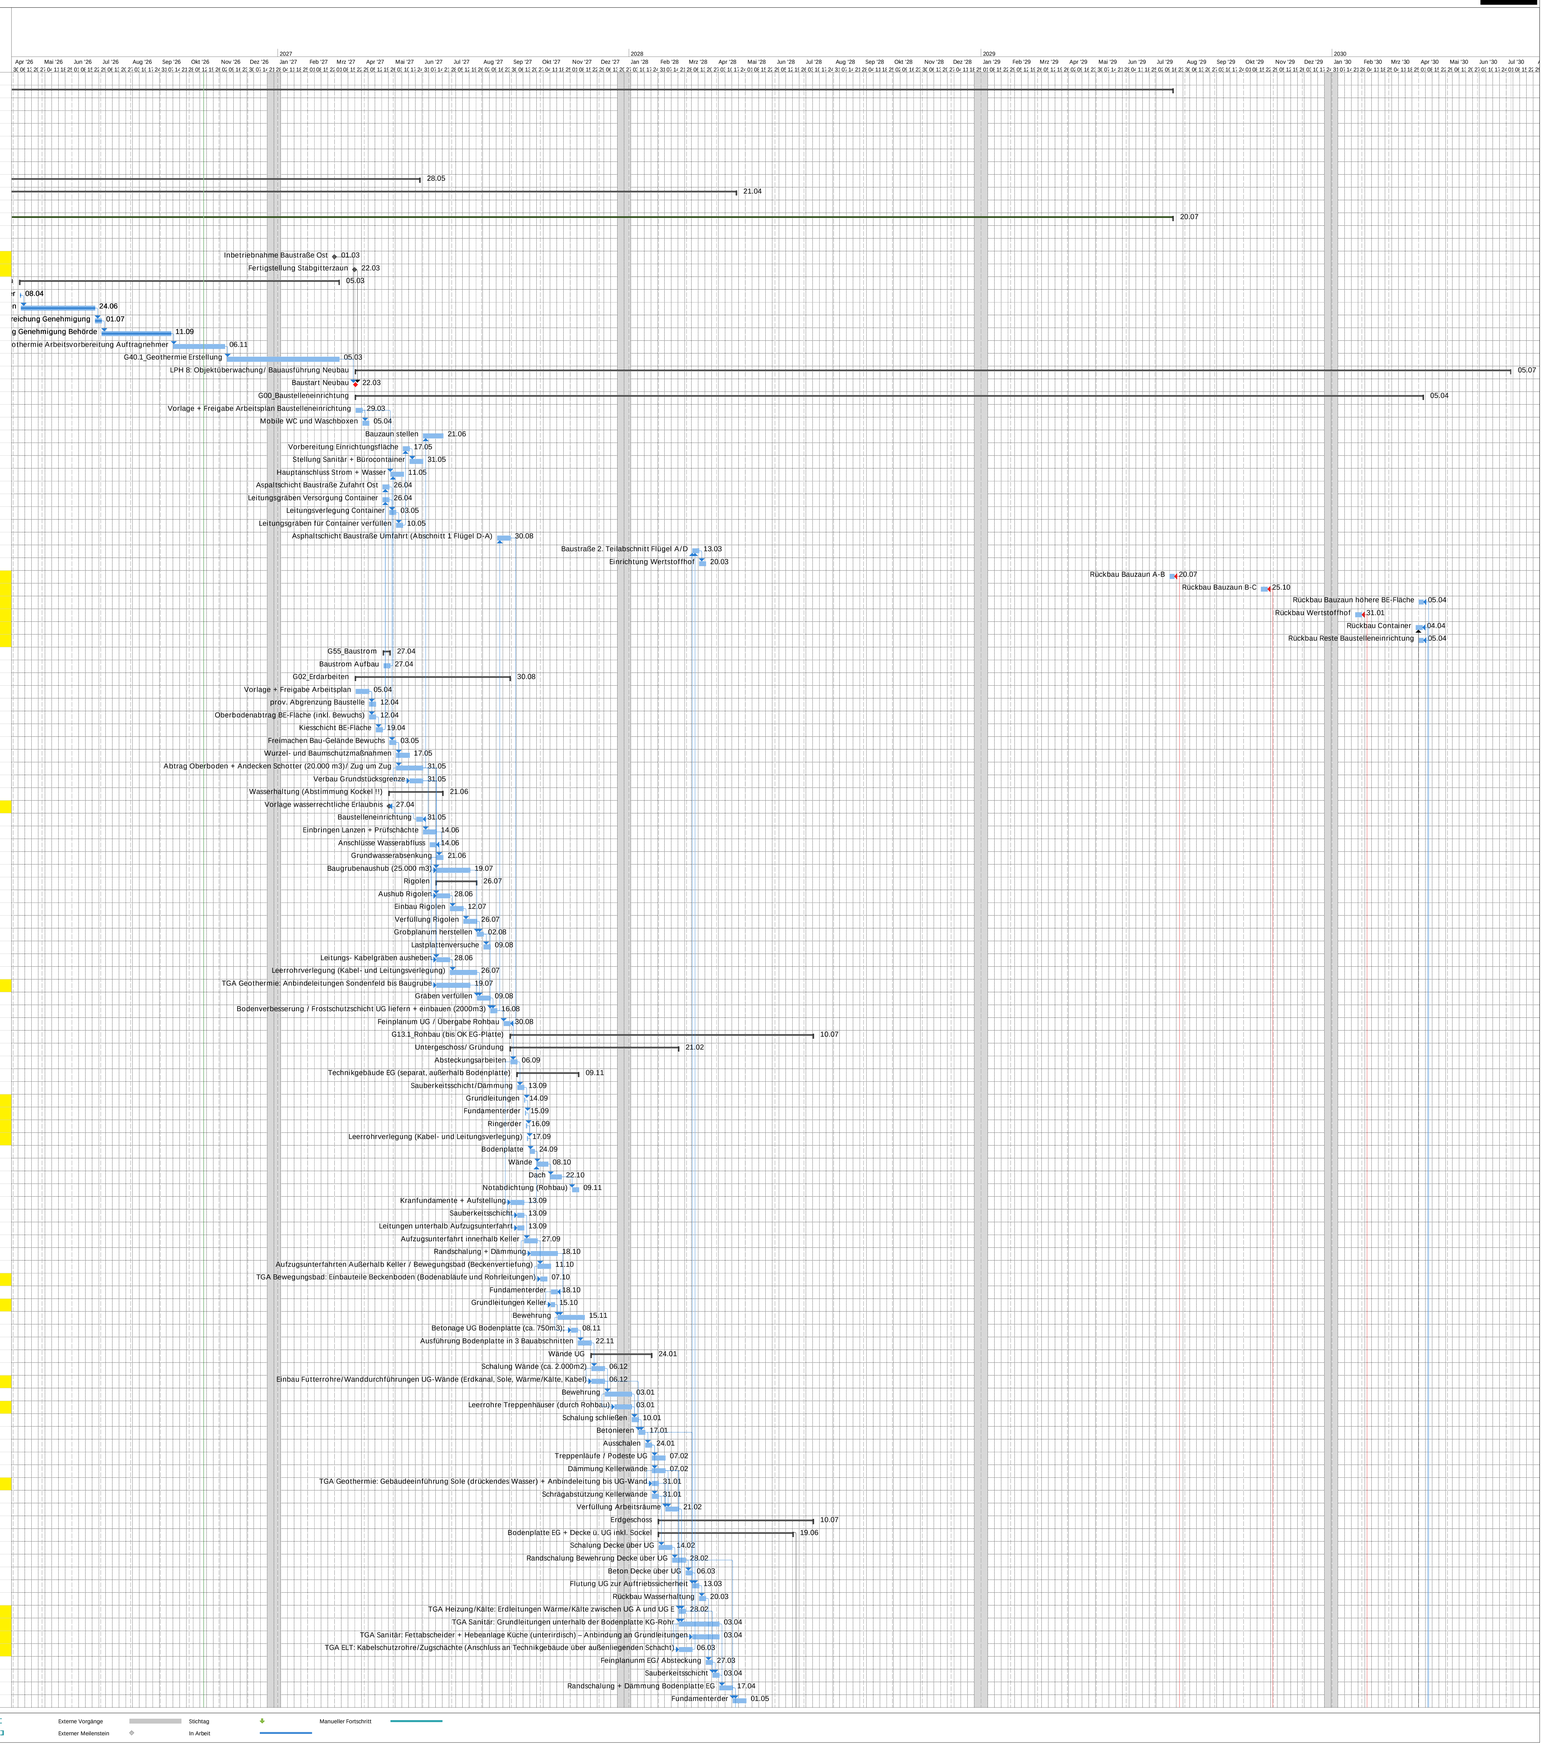

Projekt: 208_T_01_008_202610
Datum: Fre 16.10.26


Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelrollup | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag | In Arbeit | Manueller Fortschritt

Förderschulzentrum Bielefeld

Terminplan LP 8

[redacted]

Nr.	Vo	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1160		Bewehrung Bodenplatte EG	5 Wochen	Die 18.04.28	Mon 22.05.28	1158	
1161		TGA ELT/Sanitär: Einlegearbeiten Bodenplatte EG (Leerrohre, Anschlussfahnen, Folienflansche Bodenabläufe)	10 Tage	Die 18.04.28	Mon 01.05.28	1160AA;550	G53
1162		Betonage EG Platte 1. BA (alle BA: 2.800m3)	1 Woche	Die 02.05.28	Mon 08.05.28	1160AA+2 Wochen;1161	
1163		Ausführung Bodenplatte in 4 Bauabschnitten	4 Wochen	Die 09.05.28	Mon 05.06.28	1162	
1164		Sockel EG Schalung Bewehrung Beton	3 Wochen	Die 30.05.28	Mon 19.06.28	1163EE+2 Wochen	
1165		Abdichtungsarbeiten Sockel	3 Wochen	Die 20.06.28	Mon 10.07.28	1146	
1166		**G13.2_Rohbau ab EG / G16_Holzbau + Gerüst**	**342 Tage**	**Mit 20.10.27**	**Don 08.03.29**		
1167		Erstellung W-M-Planung	16 Wochen	Mit 20.10.27	Die 22.02.28	343	
1168		**Muster Fassade**	**12 Wochen**	**Mit 20.10.27**	**Die 25.01.28**	**343**	
1169		Prüfung W-M-Planung	8 Wochen	Mit 26.01.28	Die 21.03.28	1167EA-4 Wochen	
1170		Vorfertigung im Werk	16 Wochen	Mit 23.02.28	Die 13.06.28	1167	
1171		**Erdgeschoss**	**101 Tage**	**Die 06.06.28**	**Die 24.10.28**		
1172		**Wände EG**	**50 Tage**	**Die 06.06.28**	**Mon 14.08.28**		
1173		**Flügel A**	**30 Tage**	**Die 06.06.28**	**Mon 17.07.28**		
1174		Schalung 1. Lage	2 Wochen	Die 06.06.28	Mon 19.06.28	1163	
1175		Bewehrung + schließen	2 Wochen	Die 13.06.28	Mon 26.06.28	1174AA+1 Woche	
1176		TGA ELT/TGA: Einlegearbeiten Stahlbetonwände (Leerrohre, Deckendosen, Futterrohre)	2 Tage	Die 20.06.28	Mit 21.06.28	1175AA+5 Tage;550	
1177		Betonieren	1 Woche	Die 27.06.28	Mon 03.07.28	1175;1176	
1178		Außenwände HOLZ	10 Tage	Die 04.07.28	Mon 17.07.28	1177;1170AA+12 Wochen	
1179		Stützen/Unterzüge HOLZ	10 Tage	Die 04.07.28	Mon 17.07.28	1177;1170AA+12 Wochen	
1180		Ausschalen	2 Tage	Die 04.07.28	Mit 05.07.28	1177	
1181		**Flügel B+E**	**30 Tage**	**Die 06.06.28**	**Mon 17.07.28**		
1182		Schalung 1. Lage	2 Wochen	Die 06.06.28	Mon 19.06.28	1163	
1183		Bewehrung + schließen	2 Wochen	Die 13.06.28	Mon 26.06.28	1182AA+1 Woche	
1184		TGA ELT/TGA: Einlegearbeiten Stahlbetonwände (Leerrohre, Deckendosen, Futterrohre)	2 Tage	Die 20.06.28	Mit 21.06.28	1183AA+5 Tage;550	
1185		Betonieren	1 Woche	Die 27.06.28	Mon 03.07.28	1183;1184	
1186		tragende Außenwände HOLZ	2 Wochen	Die 04.07.28	Mon 17.07.28	1185;1170AA+12 Wochen	
1187		Stützen /Unterzüge HOLZ	2 Wochen	Die 04.07.28	Mon 17.07.28	1185;1170AA+12 Wochen	
1188		Ausschalen	2 Tage	Die 04.07.28	Mit 05.07.28	1185	
1189		**Flügel C**	**30 Tage**	**Die 04.07.28**	**Mon 14.08.28**		
1190		Schalung 1. Lage	2 Wochen	Die 04.07.28	Mon 17.07.28	1177	
1191		Bewehrung + schließen	2 Wochen	Die 11.07.28	Mon 24.07.28	1190AA+1 Woche	
1192		TGA ELT/TGA: Einlegearbeiten Stahlbetonwände (Leerrohre, Deckendosen, Futterrohre)	2 Tage	Die 18.07.28	Mit 19.07.28	1191AA+5 Tage;550	
1193		Betonieren	1 Woche	Die 25.07.28	Mon 31.07.28	1191;1192	
1194		tragende Außenwände HOLZ	2 Wochen	Die 01.08.28	Mon 14.08.28	1193	
1195		Stützen /Unterzüge HOLZ	2 Wochen	Die 01.08.28	Mon 14.08.28	1193	
1196		Ausschalen	2 Tage	Die 01.08.28	Mit 02.08.28	1193	
1197		**Flügel D**	**30 Tage**	**Die 04.07.28**	**Mon 14.08.28**		
1198		Schalung 1. Lage	2 Wochen	Die 04.07.28	Mon 17.07.28	1177	
1199		Bewehrung + schließen	2 Wochen	Die 11.07.28	Mon 24.07.28	1198AA+1 Woche	
1200		TGA ELT/TGA: Einlegearbeiten Stahlbetonwände (Leerrohre, Deckendosen, Futterrohre)	2 Tage	Die 18.07.28	Mit 19.07.28	1199AA+5 Tage	
1201		TGA Bewegungsbad: Einbauteile Beckenrand (Rinnen-/Abläufe, Düsen, Messeinr.)	5 Tage	Die 18.07.28	Mon 24.07.28	1199AA+5 Tage;486	
1202		Betonieren	1 Woche	Die 25.07.28	Mon 31.07.28	1199;1200;1201	
1203		tragende Außenwände HOLZ	2 Wochen	Die 01.08.28	Mon 14.08.28	1202	
1204		Stützen /Unterzüge HOLZ	2 Wochen	Die 01.08.28	Mon 14.08.28	1202	
1205		Ausschalen	2 Tage	Die 01.08.28	Mit 02.08.28	1202	
1206		**Decken über EG**	**79 Tage**	**Don 06.07.28**	**Die 24.10.28**		
1207		**Flügel A**	**29 Tage**	**Don 06.07.28**	**Die 15.08.28**		
1208		Schalung	2 Wochen	Don 06.07.28	Mit 19.07.28	1180	
1209		Bewehrung	2 Wochen	Don 13.07.28	Mit 26.07.28	1208AA+1 Woche	
1210		TGA ELT/TGA: Einlegearbeiten Stahlbetondecke (Leerrohre, Deckendosen, Futterrohre)	5 Tage	Don 20.07.28	Mit 26.07.28	1209AA+5 Tage	
1211		Betonieren	1 Tag	Don 27.07.28	Don 27.07.28	1209;1210	
1212		Ausschalen (Stützung bleibt)	5 Tage	Fre 04.08.28	Don 10.08.28	1211EA+1 Woche	
1213		HBV Verlegen Holzbalken	2 Wochen	Die 18.07.28	Mon 31.07.28	1180;1178	
1214		HBV Filigrandecke / Randschalung	1 Woche	Die 01.08.28	Mon 07.08.28	1213	
1215		HBV Bewehrung	1 Woche	Die 08.08.28	Mon 14.08.28	1214	
1216		TGA ELT/TGA: Einlegearbeiten HBV-Aufbeton (Leerrohre, Deckendosen, Aussparungen)	5 Tage	Die 08.08.28	Mon 14.08.28	1215AA	
1217		HBV Aufbeton	1 Tag	Die 15.08.28	Die 15.08.28	1215;1211AA;1216	
1218		**Flügel B+E**	**29 Tage**	**Don 06.07.28**	**Die 15.08.28**		
1219		Schalung	2 Wochen	Don 06.07.28	Mit 19.07.28	1188	
1220		Bewehrung	2 Wochen	Don 13.07.28	Mit 26.07.28	1219AA+1 Woche	
1221		TGA ELT/TGA: Einlegearbeiten Stahlbetondecke (Leerrohre, Deckendosen, Futterrohre)	5 Tage	Don 20.07.28	Mit 26.07.28	1220AA+5 Tage	
1222		Betonieren	1 Tag	Don 27.07.28	Don 27.07.28	1220;1221	
1223		Ausschalen	5 Tage	Fre 04.08.28	Don 10.08.28	1222EA+1 Woche	
1224		HBV Verlegen Holzbalken	2 Wochen	Die 18.07.28	Mon 31.07.28	1188;1186	
1225		HBV Filigrandecke / Randschalung	1 Woche	Die 01.08.28	Mon 07.08.28	1224	
1226		HBV Bewehrung	1 Woche	Die 08.08.28	Mon 14.08.28	1225	
1227		TGA ELT/TGA: Einlegearbeiten HBV-Aufbeton (Leerrohre, Deckendosen, Aussparungen)	5 Tage	Die 08.08.28	Mon 14.08.28	1226AA	
1228		HBV Aufbeton	1 Tag	Die 15.08.28	Die 15.08.28	1226;1222AA;1227	
1229		**Flügel C**	**29 Tage**	**Don 03.08.28**	**Die 12.09.28**		
1230		Schalung	2 Wochen	Don 03.08.28	Mit 16.08.28	1196	
1231		Bewehrung	2 Wochen	Don 10.08.28	Mit 23.08.28	1230AA+1 Woche	
1232		TGA ELT/TGA: Einlegearbeiten Stahlbetondecke (Leerrohre, Deckendosen, Futterrohre)	5 Tage	Don 17.08.28	Mit 23.08.28	1231AA+5 Tage	
1233		Betonieren	1 Tag	Don 24.08.28	Don 24.08.28	1231;1232	
1234		Ausschalen	5 Tage	Fre 01.09.28	Don 07.09.28	1233EA+1 Woche	
1235		HBV Verlegen Holzbalken	2 Wochen	Die 15.08.28	Mon 28.08.28	1196;1194	
1236		HBV Filigrandecke / Randschalung	1 Woche	Die 29.08.28	Mon 04.09.28	1235	
1237		HBV Bewehrung	1 Woche	Die 05.09.28	Mon 11.09.28	1236	
1238		TGA ELT/TGA: Einlegearbeiten HBV-Aufbeton (Leerrohre, Deckendosen, Aussparungen)	5 Tage	Die 05.09.28	Mon 11.09.28	1237AA	
1239		HBV Aufbeton	1 Tag	Die 12.09.28	Die 12.09.28	1237;1233AA;1238	
1240		**Flügel D**	**29 Tage**	**Don 03.08.28**	**Die 12.09.28**		
1241		Schalung	2 Wochen	Don 03.08.28	Mit 16.08.28	1205	
1242		Bewehrung	2 Wochen	Don 10.08.28	Mit 23.08.28	1241AA+1 Woche	
1243		TGA ELT/TGA: Einlegearbeiten Stahlbetondecke (Leerrohre, Deckendosen, Futterrohre)	5 Tage	Don 17.08.28	Mit 23.08.28	1242AA+5 Tage	
1244		Betonieren	1 Tag	Don 24.08.28	Don 24.08.28	1242;1243	
1245		Ausschalen	5 Tage	Fre 01.09.28	Don 07.09.28	124EA+1 Woche	
1246		HBV Verlegen Holzbalken	2 Wochen	Die 15.08.28	Mon 28.08.28	1205;1203	
1247		HBV Filigrandecke / Randschalung	1 Woche	Die 29.08.28	Mon 04.09.28	1246	
1248		HBV Bewehrung	1 Woche	Die 05.09.28	Mon 11.09.28	1247	
1249		TGA ELT/TGA: Einlegearbeiten HBV-Aufbeton (Leerrohre, Deckendosen, Aussparungen)	5 Tage	Die 05.09.28	Mon 11.09.28	1248AA	
1250		HBV Aufbeton	1 Tag	Die 12.09.28	Die 12.09.28	1248;1244AA;1249	
1251		Block A-D, nichttragende Fassade EG	6 Wochen	Mit 13.09.28	Die 24.10.28	1250	
1252		**1. Obergeschoss**	**91 Tage**	**Fre 28.07.28**	**Fre 01.12.28**		
1253		**Wände 1. OG**	**50 Tage**	**Fre 28.07.28**	**Don 05.10.28**		
1254		**Flügel A**	**30 Tage**	**Fre 28.07.28**	**Don 07.09.28**		
1255		Schalung 1. Lage	2 Wochen	Fre 28.07.28	Don 10.08.28	1211	
1256		Bewehrung + schließen	2 Wochen	Fre 04.08.28	Don 17.08.28	1255AA+1 Woche	
1257		TGA ELT/TGA: Einlegearbeiten Stahlbetonwände (Leerrohre, Deckendosen, Futterrohre)	2 Tage	Fre 11.08.28	Mon 14.08.28	1256AA+5 Tage	
1258		Betonieren	1 Woche	Fre 18.08.28	Don 24.08.28	1256;1257	
1259		tragende Außenwände HOLZ	2 Wochen	Fre 25.08.28	Don 07.09.28	1258	
1260		Stützen/Unterzüge HOLZ	2 Wochen	Fre 25.08.28	Don 07.09.28	1258	
1261		Ausschalen	2 Tage	Fre 25.08.28	Mon 28.08.28	1258	
1262		**Flügel B**	**30 Tage**	**Fre 28.07.28**	**Don 07.09.28**		
1263		Schalung 1. Lage	2 Wochen	Fre 28.07.28	Don 10.08.28	1222	
1264		Bewehrung + schließen	2 Wochen	Fre 04.08.28	Don 17.08.28	1263AA+1 Woche	
1265		TGA ELT/TGA: Einlegearbeiten Stahlbetonwände (Leerrohre, Deckendosen, Futterrohre)	2 Tage	Fre 11.08.28	Mon 14.08.28	1264AA+5 Tage	
1266		Betonieren	1 Woche	Fre 18.08.28	Don 24.08.28	1264;1265	
1267		tragende Aussenwände HOLZ	2 Wochen	Fre 25.08.28	Don 07.09.28	1266	
1268		Stützen /Unterzüge HOLZ	2 Wochen	Fre 25.08.28	Don 07.09.28	1266	
1269		Ausschalen	2 Tage	Fre 25.08.28	Mon 28.08.28	1266	
1270		**Flügel C**	**30 Tage**	**Fre 25.08.28**	**Don 05.10.28**		
1271		Schalung 1. Lage	2 Wochen	Fre 25.08.28	Don 07.09.28	1233	
1272		Bewehrung + schließen	2 Wochen	Fre 01.09.28	Don 14.09.28	1271AA+1 Woche	
1273		TGA ELT/TGA: Einlegearbeiten Stahlbetonwände (Leerrohre, Deckendosen, Futterrohre)	2 Tage	Fre 08.09.28	Mon 11.09.28	1272AA+5 Tage	
1274		Betonieren	1 Woche	Fre 15.09.28	Don 21.09.28	1272;1273	
1275		tragende Aussenwände HOLZ	2 Wochen	Fre 22.09.28	Don 05.10.28	1274	
1276		Stützen /Unterzüge HOLZ	2 Wochen	Fre 22.09.28	Don 05.10.28	1274	
1277		Ausschalen	2 Tage	Fre 22.09.28	Mon 25.09.28	1274	
1278		**Flügel D**	**30 Tage**	**Fre 25.08.28**	**Don 05.10.28**		
1279		Schalung 1. Lage	2 Wochen	Fre 25.08.28	Don 07.09.28	1244	
1280		Bewehrung + schließen	2 Wochen	Fre 01.09.28	Don 14.09.28	1279AA+1 Woche	
1281		TGA ELT/TGA: Einlegearbeiten Stahlbetonwände (Leerrohre, Deckendosen, Futterrohre)	2 Tage	Fre 08.09.28	Mon 11.09.28	1280AA+5 Tage	
1282		Betonieren	1 Woche	Fre 15.09.28	Don 21.09.28	1280;1281	
1283		tragende Aussenwände HOLZ	2 Wochen	Fre 22.09.28	Don 05.10.28	1282	
1284		Stützen /Unterzüge HOLZ	2 Wochen	Fre 22.09.28	Don 05.10.28	1282	
1285		Ausschalen	2 Tage	Fre 22.09.28	Mon 25.09.28	1282	
1286		**Decken über 1. OG**	**69 Tage**	**Die 29.08.28**	**Fre 01.12.28**		
1287		**Flügel A**	**34 Tage**	**Die 29.08.28**	**Fre 13.10.28**		

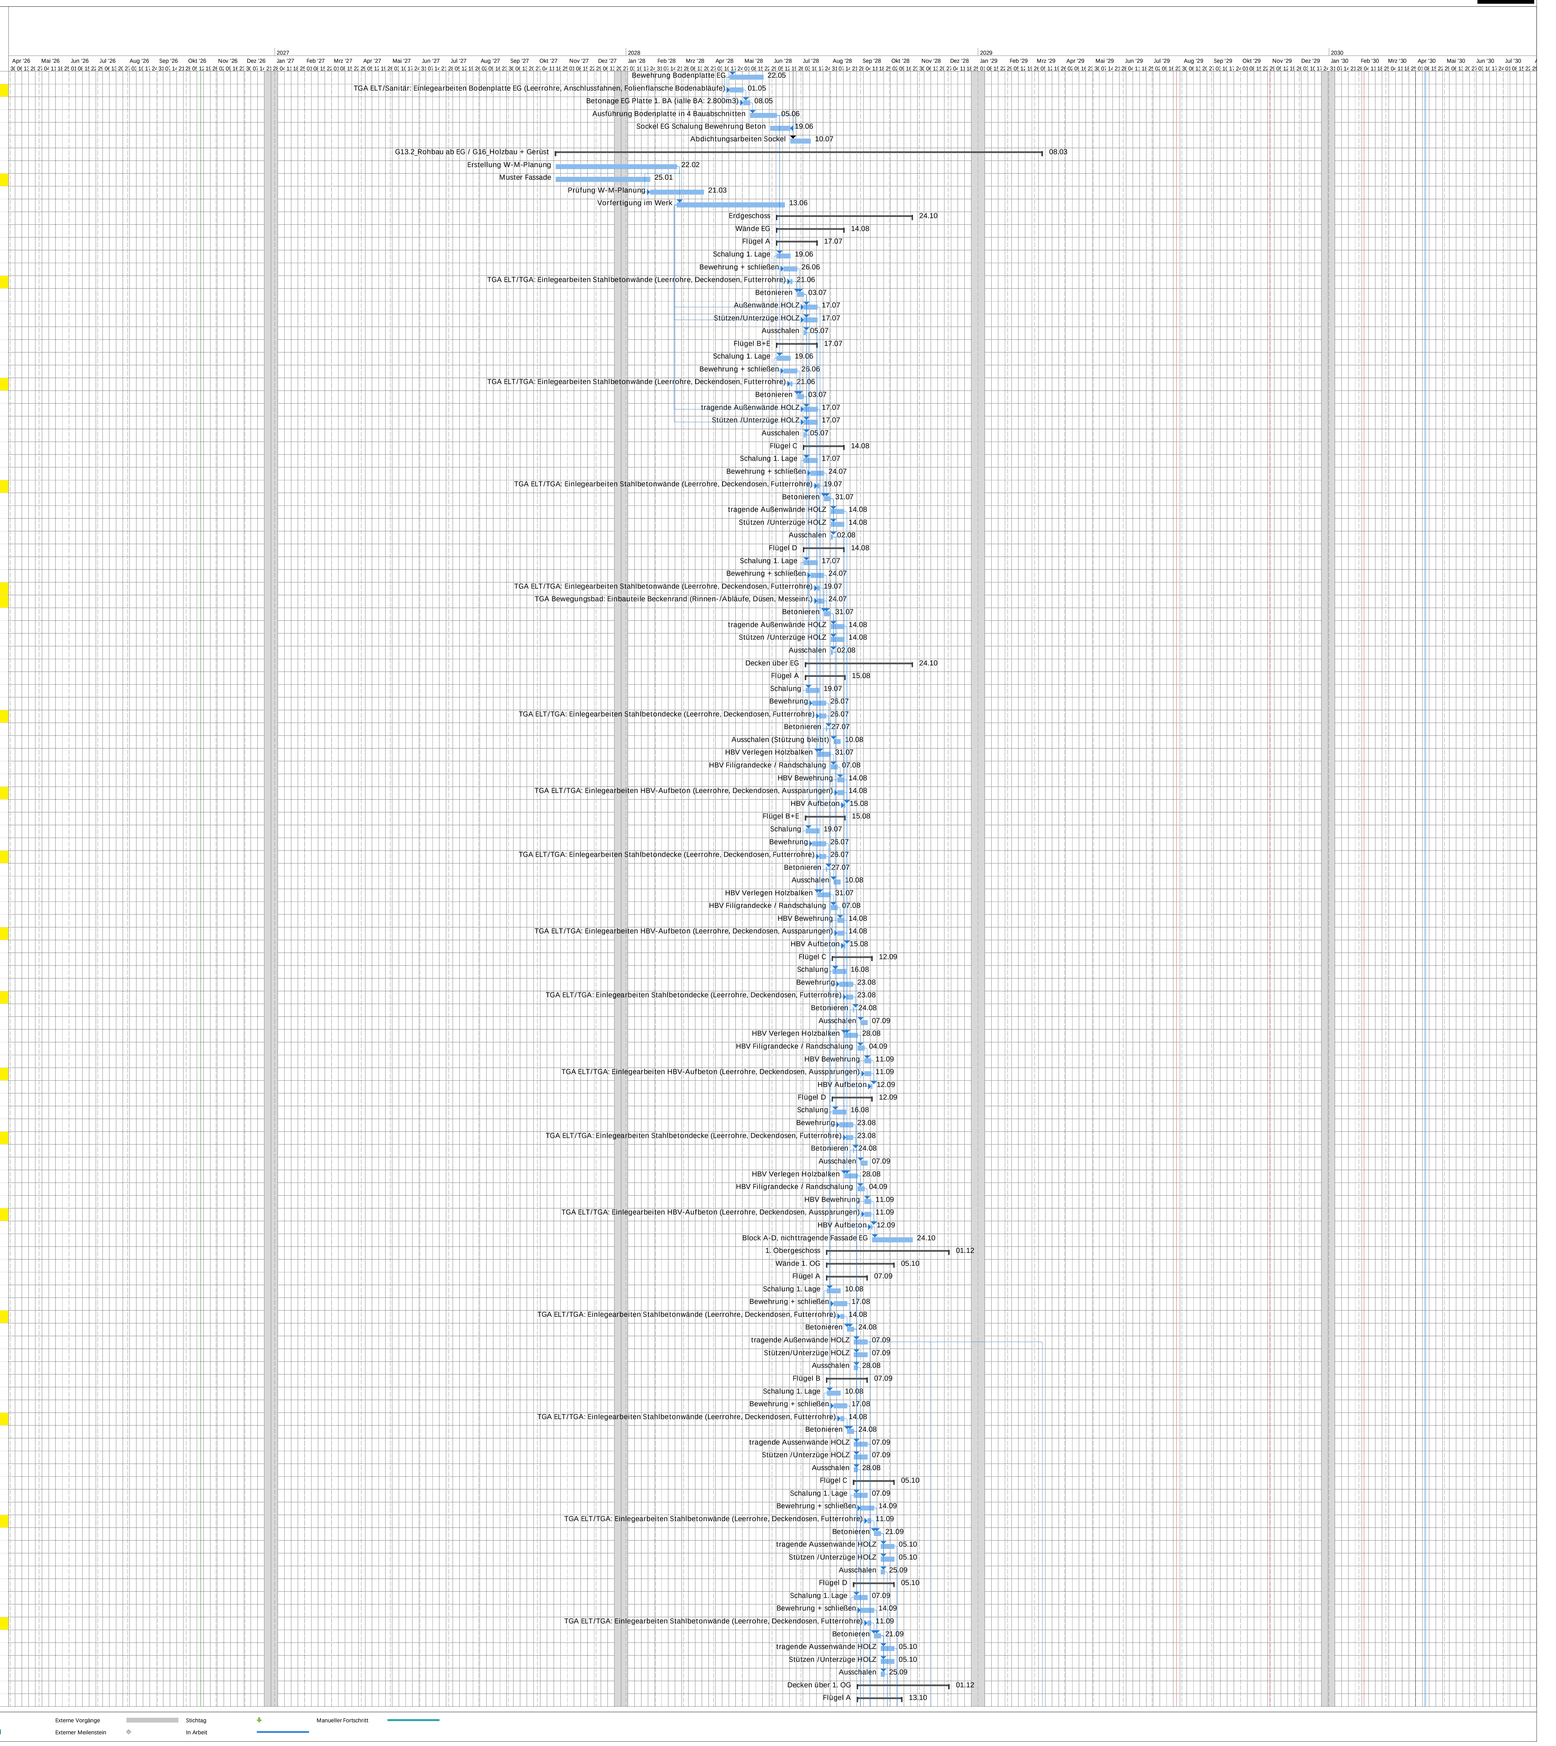


Projekt: 208_T_01_008_202610
Datum: Fre 16.10.26

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelvorlup | Nur Anfang | Externe Vorgänge | Stichtag | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Sammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | Externer Meilenstein | In Arbeit

Terminplan LP 8

[redacted]

Nr.	Vo	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1288		Schalung	2 Wochen	Die 29.08.28	Mon 11.09.28	1261	
1289		Bewehrung	2 Wochen	Die 05.09.28	Mon 18.09.28	1288AA+1 Woche	
1290		TGA ELT/TGA: Einlegearbeiten Stahlbetondecke (Leerrohre, Deckendosen, Futterrohre)	5 Tage	Die 12.09.28	Mon 18.09.28	1289AA+5 Tage	
1291		Betonieren	1 Woche	Die 19.09.28	Mon 25.09.28	1289;1290	
1292		Ausschalen	5 Tage	Die 03.10.28	Mon 09.10.28	1291EA+1 Woche	
1293		HBV + Balkendecke Verlegen Holzbalken	2 Wochen	Fre 08.09.28	Don 21.09.28	1259	
1294		HBV Filigrandecke / Randschalung + BSP Elemente	1 Woche	Fre 22.09.28	Don 28.09.28	1293	
1295		HBV Bewehrung	1 Woche	Fre 29.09.28	Don 05.10.28	1294	
1296		TGA ELT/TGA: Einlegearbeiten HBV-Aufbeton (Leerrohre, Deckendosen, Aussparungen)	5 Tage	Fre 29.09.28	Don 05.10.28	1295AA	
1297		HBV Aufbeton	1 Tag	Fre 06.10.28	Fre 06.10.28	1295;1296	
1298		Attika HOLZ	5 Tage	Mon 09.10.28	Fre 13.10.28	1297	
1299		**Flügel B**	**34 Tage**	**Die 29.08.28**	**Fre 13.10.28**		
1300		Schalung	2 Wochen	Die 29.08.28	Mon 11.09.28	1269	
1301		Bewehrung	2 Wochen	Die 05.09.28	Mon 18.09.28	1300AA+1 Woche	
1302		TGA ELT/TGA: Einlegearbeiten Stahlbetondecke (Leerrohre, Deckendosen, Futterrohre)	5 Tage	Die 12.09.28	Mon 18.09.28	1301AA+5 Tage	
1303		Betonieren	1 Woche	Die 19.09.28	Mon 25.09.28	1301;1302	
1304		Ausschalen	5 Tage	Die 03.10.28	Mon 09.10.28	1303EA+1 Woche	
1305		HBV Verlegen Holzbalken	2 Wochen	Fre 08.09.28	Don 21.09.28	1267	
1306		HBV Filigrandecke / Randschalung	1 Woche	Fre 22.09.28	Don 28.09.28	1305	
1307		HBV Bewehrung	1 Woche	Fre 29.09.28	Don 05.10.28	1306	
1308		TGA ELT/TGA: Einlegearbeiten HBV-Aufbeton (Leerrohre, Deckendosen, Aussparungen)	5 Tage	Fre 29.09.28	Don 05.10.28	1307AA	
1309		HBV Aufbeton	1 Tag	Fre 06.10.28	Fre 06.10.28	1307;1308	
1310		Attika HOLZ	5 Tage	Mon 09.10.28	Fre 13.10.28	1309	
1311		Rückbau Durchstützung Flügel A + B	1 Woche	Mon 06.11.28	Fre 10.11.28	1303EA+4 Wochen;1309EA+4 Wochen	
1312		**Flügel C**	**34 Tage**	**Die 26.09.28**	**Fre 10.11.28**		
1313		Schalung	2 Wochen	Die 26.09.28	Mon 09.10.28	1277	
1314		Bewehrung	2 Wochen	Die 03.10.28	Mon 16.10.28	1313AA+1 Woche	
1315		TGA ELT/TGA: Einlegearbeiten Stahlbetondecke (Leerrohre, Deckendosen, Futterrohre)	5 Tage	Die 10.10.28	Mon 16.10.28	1314AA+5 Tage	
1316		Betonieren	1 Woche	Die 17.10.28	Mon 23.10.28	1314;1315	
1317		Ausschalen	5 Tage	Die 31.10.28	Mon 06.11.28	1316EA+1 Woche	
1318		HBV Verlegen Holzbalken	2 Wochen	Fre 06.10.28	Don 19.10.28	1275	
1319		HBV Filigrandecke / Randschalung	1 Woche	Fre 20.10.28	Don 26.10.28	1318	
1320		HBV Bewehrung	1 Woche	Fre 27.10.28	Don 02.11.28	1319	
1321		TGA ELT/TGA: Einlegearbeiten HBV-Aufbeton (Leerrohre, Deckendosen, Aussparungen)	5 Tage	Fre 27.10.28	Don 02.11.28	1320AA	
1322		HBV Aufbeton	1 Tag	Fre 03.11.28	Fre 03.11.28	1320;1321	
1323		Attika HOLZ	5 Tage	Mon 06.11.28	Fre 10.11.28	1322	
1324		**Flügel D**	**49 Tage**	**Die 26.09.28**	**Fre 01.12.28**		
1325		Schalung	2 Wochen	Die 26.09.28	Mon 09.10.28	1285	
1326		Bewehrung	2 Wochen	Die 03.10.28	Mon 16.10.28	1325AA+1 Woche	
1327		TGA ELT/TGA: Einlegearbeiten Stahlbetondecke (Leerrohre, Deckendosen, Futterrohre)	5 Tage	Die 10.10.28	Mon 16.10.28	1326AA+5 Tage	
1328		Betonieren	1 Woche	Die 17.10.28	Mon 23.10.28	1326;1327	
1329		Ausschalen	5 Tage	Die 31.10.28	Mon 06.11.28	1328EA+1 Woche	
1330		HBV Verlegen Holzbalken	2 Wochen	Fre 06.10.28	Don 19.10.28	1283	
1331		HBV Filigrandecke / Randschalung	1 Woche	Fre 20.10.28	Don 26.10.28	1330	
1332		HBV Bewehrung	1 Woche	Fre 27.10.28	Don 02.11.28	1331	
1333		TGA ELT/TGA: Einlegearbeiten HBV-Aufbeton (Leerrohre, Deckendosen, Aussparungen)	5 Tage	Fre 27.10.28	Don 02.11.28	1332AA	
1334		HBV Aufbeton	1 Tag	Fre 03.11.28	Fre 03.11.28	1332;1333	
1335		Attika HOLZ	5 Tage	Mon 06.11.28	Fre 10.11.28	1334	
1336		Abpumpen Wasser UG (Ende Auftriebsicherheit) + Reinigung	4 Wochen	Mon 06.11.28	Fre 01.12.28	1334	
1337		**2. Obergeschoss**	**88 Tage**	**Die 24.10.28**	**Don 08.03.29**		
1338		**Wände 2. OG**	**30 Tage**	**Die 24.10.28**	**Mon 04.12.28**		
1339		**Flügel C**	**30 Tage**	**Die 24.10.28**	**Mon 04.12.28**		
1340		Schalung 1. Lage	2 Wochen	Die 24.10.28	Mon 06.11.28	1316	
1341		Bewehrung + schließen	2 Wochen	Die 31.10.28	Mon 13.11.28	1340AA+1 Woche	
1342		TGA ELT/TGA: Einlegearbeiten Stahlbetonwände (Leerrohre, Deckendosen, Futterrohre)	2 Tage	Die 07.11.28	Mit 08.11.28	1341AA+5 Tage	
1343		Betonieren	1 Woche	Die 14.11.28	Mon 20.11.28	1341;1342	
1344		tragende Aussenwände HOLZ	2 Wochen	Die 21.11.28	Mon 04.12.28	1343	
1345		Stützen /Unterzüge HOLZ	2 Wochen	Die 21.11.28	Mon 04.12.28	1343	
1346		Ausschalen	2 Tage	Die 21.11.28	Mit 22.11.28	1343	
1347		**Decken/Dächer ü. 2.OG**	**66 Tage**	**Don 23.11.28**	**Don 08.03.29**		
1348		**Flügel C**	**30 Tage**	**Don 23.11.28**	**Mit 17.01.29**		
1349		Schalung	2 Wochen	Don 23.11.28	Mit 06.12.28	1346	
1350		Bewehrung	2 Wochen	Don 30.11.28	Mit 13.12.28	1349AA+1 Woche	
1351		TGA ELT/TGA: Einlegearbeiten Stahlbetondecke (Leerrohre, Deckendosen, Futterrohre)	5 Tage	Don 07.12.28	Mit 13.12.28	1350AA+5 Tage	
1352		Betonieren	1 Woche	Don 14.12.28	Mit 20.12.28	1350;1351	
1353		Ausschalen	5 Tage	Don 11.01.29	Mit 17.01.29	1352EA+1 Woche	
1354		HBV Verlegen Holzbalken	2 Wochen	Don 23.11.28	Mit 06.12.28	1346	
1355		HBV Filigrandecke / Randschalung	1 Woche	Don 07.12.28	Mit 13.12.28	1354	
1356		HBV Bewehrung	1 Woche	Don 14.12.28	Mit 20.12.28	1355	
1357		TGA ELT/TGA: Einlegearbeiten HBV-Aufbeton (Leerrohre, Deckendosen, Aussparungen)	5 Tage	Don 14.12.28	Mit 20.12.28	1356AA	
1358		HBV Aufbeton	1 Tag	Don 21.12.28	Don 21.12.28	1356;1357	
1359		Attika HOLZ	5 Tage	Fre 22.12.28	Don 11.01.29	1358	
1360		Ausschalen	5 Tage	Don 11.01.29	Mit 17.01.29	1352EA+1 Woche	
1361		Rückbau Durchstützung Flügel C + D	1 Woche	Fre 02.02.29	Don 08.02.29	1352EA+4 Wochen;1358EA+4 Wochen	
1362		Verpresszeitraum WU nach Fertigstellung Rohbau (Zeitangabe geschätzt, RISIKO!)	4 Wochen	Fre 09.02.29	Don 08.03.29	1361	
1363		**Messung BOS Funkanlage**	1 Woche	Fre 12.01.29	Don 18.01.29	1359	
1364		**G21_Dach**	**99 Tage**	**Mon 16.10.28**	**Don 15.03.29**		
1365		**Flügel A**	**45 Tage**	**Mon 16.10.28**	**Fre 15.12.28**		
1366		Notabdichtung/Dampfsperre	5 Tage	Mon 16.10.28	Fre 20.10.28	1298;359	
1367		Gefälledämmung	5 Tage	Mon 23.10.28	Fre 27.10.28	1366	
1368		Abdichtung	10 Tage	Mon 30.10.28	Fre 10.11.28	1367	
1369		Attika/Einbauteile	5 Tage	Mon 13.11.28	Fre 17.11.28	1368	
1370		TGA Lüftung: Dachdurchführungen AUL/FOL, Lamellenhauben, Entlüftungen Flügel A	2 Tage	Mon 13.11.28	Die 14.11.28	1369AA	
1371		Absturzsicherung	5 Tage	Mon 20.11.28	Fre 24.11.28	1369;1370	
1372		Kiesstreifen/Gründach/ UK für PV	15 Tage	Mon 27.11.28	Fre 15.12.28	1371	
1373		**Flügel B**	**45 Tage**	**Mon 16.10.28**	**Fre 15.12.28**		
1374		Notabdichtung/Dampfsperre	5 Tage	Mon 16.10.28	Fre 20.10.28	1310	
1375		Gefälledämmung	5 Tage	Mon 23.10.28	Fre 27.10.28	1374	
1376		Abdichtung	10 Tage	Mon 30.10.28	Fre 10.11.28	1375	
1377		Attika/Einbauteile	5 Tage	Mon 13.11.28	Fre 17.11.28	1376	
1378		TGA Lüftung: Dachdurchführungen AUL/FOL, Lamellenhauben, Entlüftungen Flügel B	2 Tage	Mon 13.11.28	Die 14.11.28	1377AA	
1379		Absturzsicherung	5 Tage	Mon 20.11.28	Fre 24.11.28	1377;1378	
1380		Kiesstreifen/Gründach / UK für PV	15 Tage	Mon 27.11.28	Fre 15.12.28	1379	
1381		**Flügel C**	**45 Tage**	**Fre 12.01.29**	**Don 15.03.29**		
1382		Notabdichtung/Dampfsperre	5 Tage	Fre 12.01.29	Don 18.01.29	1359	
1383		Gefälledämmung	5 Tage	Fre 19.01.29	Don 25.01.29	1382	
1384		Abdichtung	10 Tage	Fre 26.01.29	Don 08.02.29	1383	
1385		Attika/Einbauteile	5 Tage	Fre 09.02.29	Don 15.02.29	1384	
1386		TGA Lüftung: Dachdurchführungen AUL/FOL, Lamellenhauben, Entlüftungen Flügel C	2 Tage	Fre 09.02.29	Mon 12.02.29	1385AA	
1387		Absturzsicherung	5 Tage	Fre 16.02.29	Don 22.02.29	1385;1386	
1388		Kiesstreifen/Gründach / UK für PV	15 Tage	Fre 23.02.29	Don 15.03.29	1387	
1389		**Flügel D + E**	**55 Tage**	**Mon 13.11.28**	**Fre 09.02.29**		
1390		Notabdichtung/Dampfsperre	10 Tage	Mon 13.11.28	Fre 24.11.28	1335	
1391		Gefälledämmung	10 Tage	Mon 27.11.28	Fre 08.12.28	1390	
1392		Abdichtung	10 Tage	Mon 11.12.28	Fre 22.12.28	1391	
1393		Attika/Einbauteile	5 Tage	Mon 08.01.29	Fre 12.01.29	1392	
1394		TGA Lüftung: Dachdurchführungen AUL/FOL, Lamellenhauben, Entlüftungen Flügel D	2 Tage	Mon 08.01.29	Die 09.01.29	1393AA	
1395		Absturzsicherung	5 Tage	Mon 15.01.29	Fre 19.01.29	1393;1394	
1396		Kiesstreifen/Gründach / UK für PV	15 Tage	Mon 22.01.29	Fre 09.02.29	1395	
1397		**Rückbau Gerüst Flügel A**	**5 Tage**	**Mon 27.11.28**	**Fre 01.12.28**	**1371**	
1398		**Rückbau Gerüst Flügel B**	**5 Tage**	**Mon 27.11.28**	**Fre 01.12.28**	**1379**	
1399		**Rückbau Gerüst Flügel C**	**5 Tage**	**Fre 23.02.29**	**Don 01.03.29**	**1387**	
1400		**Rückbau Gerüst Flügel D+E**	**5 Tage**	**Mon 22.01.29**	**Fre 26.01.29**	**1395**	
1401		**G17_Stahlbau Vordach**	**4 Wochen**	**Mon 29.01.29**	**Fre 23.02.29**	**1397;1400;726**	
1402		**G21_Dachaufbau Vordach**	**2 Wochen**	**Mon 26.02.29**	**Fre 09.03.29**	**1401;359**	
1403		**PV Anlage / Blitzschutz Dach**	**80 Tage**	**Mit 28.02.29**	**Die 19.06.29**		
1404		Meilenstein: Beginn Frühjahr – PV-Montage frühestens	0 Tage	Don 01.03.29	Don 01.03.29		
1405		Flügel A	8 Wochen	Mit 28.02.29	Die 24.04.29	1372;566;1404EA-1 Tag	
1406		Flügel B	8 Wochen	Mit 28.02.29	Die 24.04.29	1380;566;1404EA-1 Tag	
1407		Flügel C	8 Wochen	Mit 25.04.29	Die 19.06.29	1388;1405;566;1404EA-1 Tag	
1408		Flügel D+E	8 Wochen	Mit 25.04.29	Die 19.06.29	1396;1406;566;1404EA-1 Tag	
1409		**G26_Metallbau P-R-Fassade**	**100 Tage**	**Mon 23.10.28**	**Fre 23.03.29**		
1410		Fuge A/B	4 Wochen	Mon 23.10.28	Fre 17.11.28	1374;614	
1411		Fuge B/C	4 Wochen	Mon 20.11.28	Fre 15.12.28	1410	
1412		Fuge C/D	4 Wochen	Mon 18.12.28	Fre 26.01.29	1411	
1413		Innenhof A	4 Wochen	Mon 29.01.29	Fre 23.02.29	1412	
1414		Aula/Foyers	4 Wochen	Mon 26.02.29	Fre 23.03.29	1413	
1415		Blower Door Test Vorprüfung (eingeschränkte Zugänglichkeit alle Gewerke)	1 Woche	Mon 26.03.29	Fre 30.03.29	1414;662	

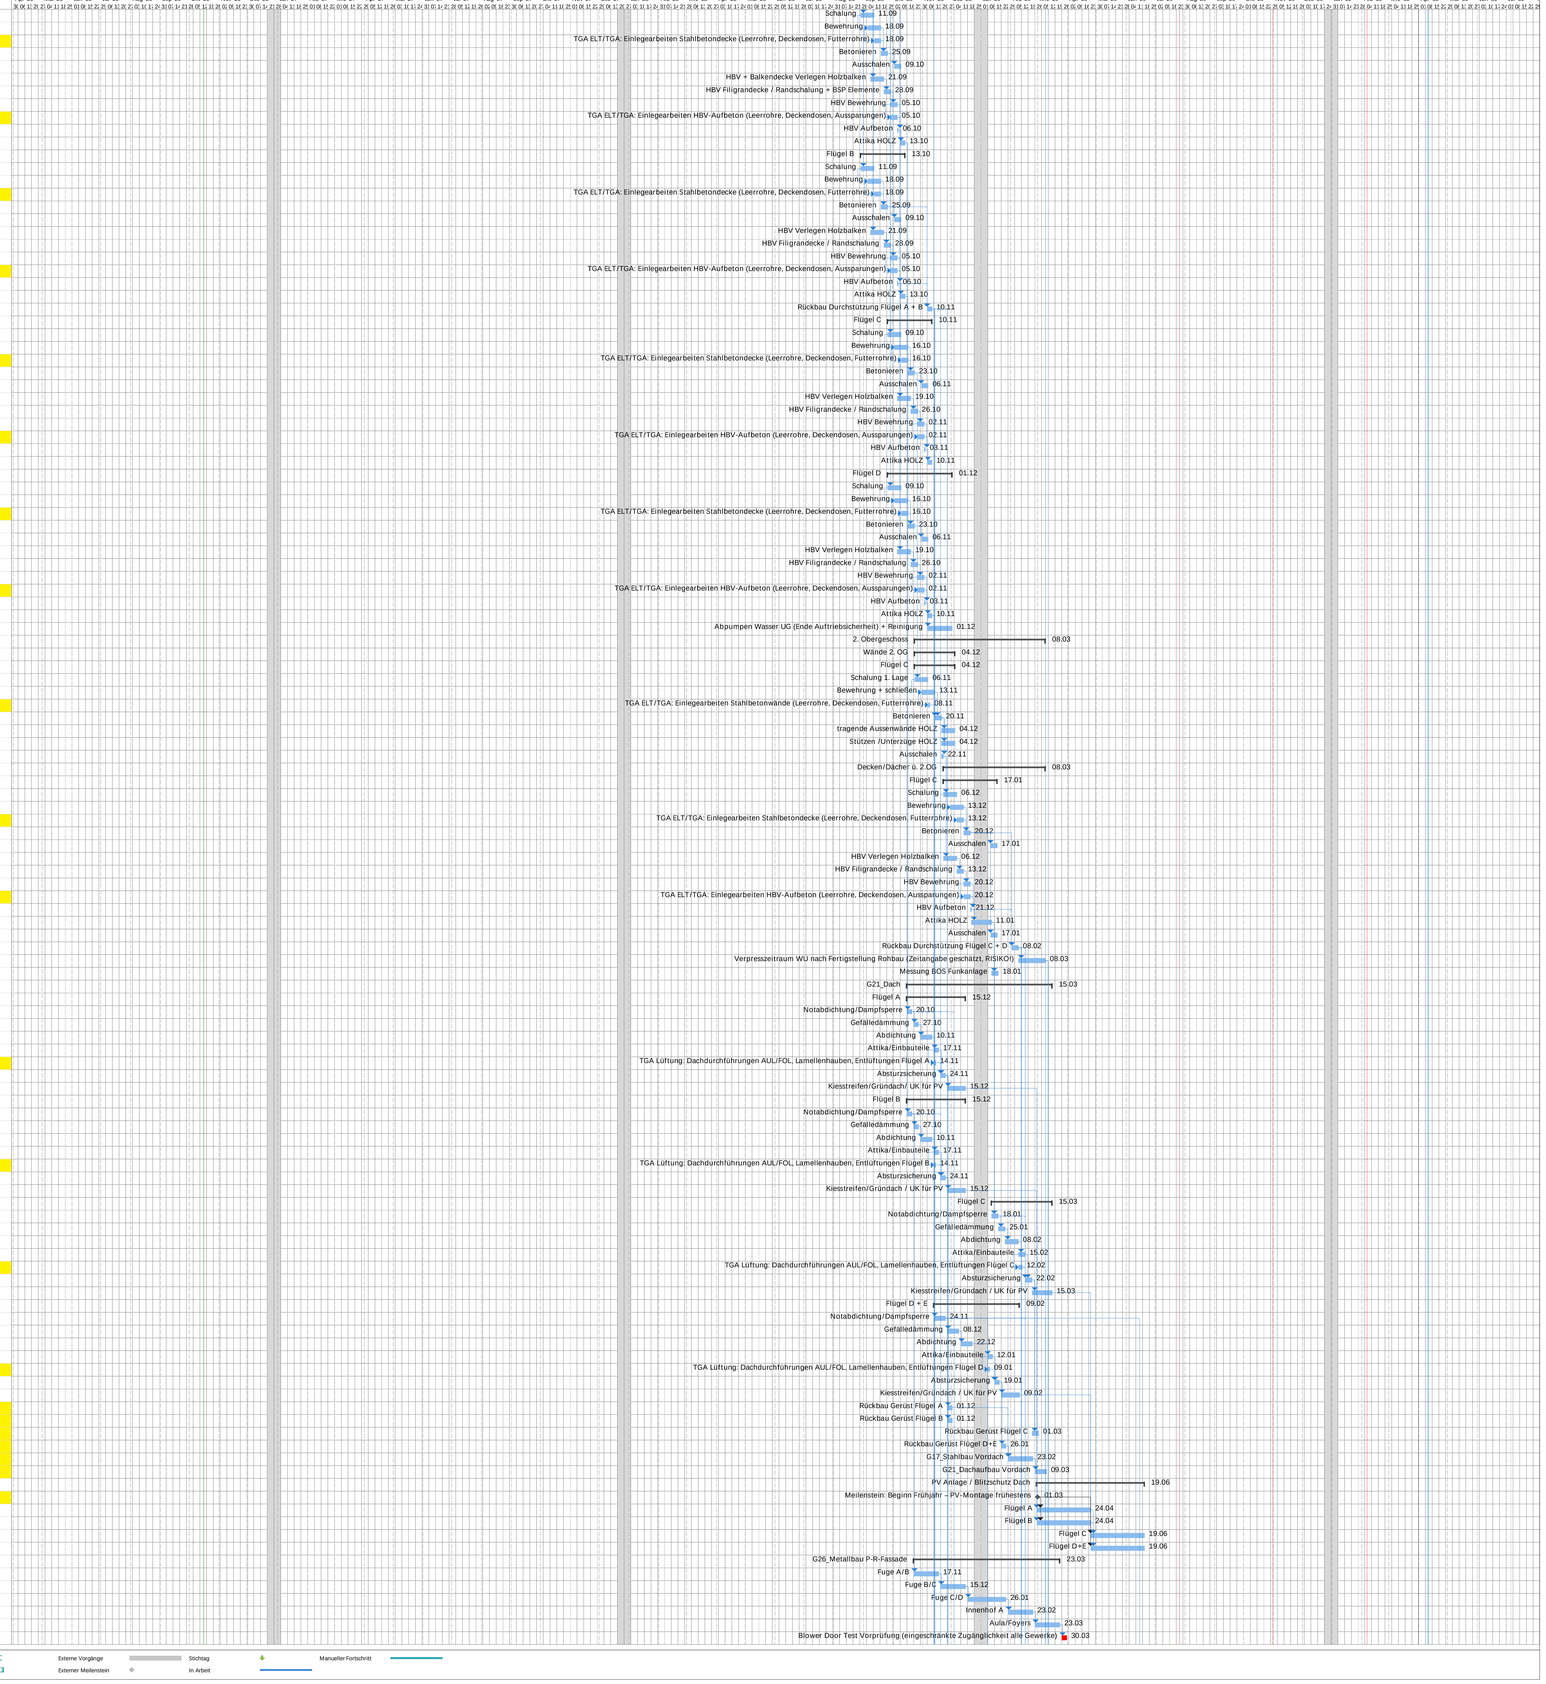

Förderschulzentrum Bielefeld

Terminplan LP 8

[redacted]

Nr.	Vo	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1416		**TGA-Gewerke UG**	**184 Tage**	**Mon 13.11.28**	**Don 09.08.29**		
1417		**Flügel A - UG TGA-Zentrale (Küche/Verwaltung)**	**75 Tage**	**Mon 13.11.28**	**Fre 09.03.29**		
1418		Rohinstallation UG - Zentrale UG Flügel A	8 Wochen	Mon 13.11.28	Fre 19.01.29	1259;391;422:550;1311;407	
1419		Geräteaufbau UG - Zentrale UG Flügel A	8 Wochen	Mon 27.11.28	Fre 02.02.29	1390;1033;1311	
1420		Feininstallation UG - Zentrale UG Flügel A	5 Wochen	Mon 05.02.29	Fre 09.03.29	1419;215;470;422;486;438;1033	
1421		**Flügel E (Haupttechnikzentrale UG)**	**110 Tage**	**Fre 09.03.29**	**Don 09.08.29**		
1422		Rohinstallation UG - Haupttechnikzentrale UG	14 Wochen	Fre 09.03.29	Don 14.06.29	1259;391;422:550;1362;407	
1423		Geräteaufbau UG - Haupttechnikzentrale UG	14 Wochen	Fre 09.03.29	Don 14.06.29	1390;1362;1033	
1424		Feininstallation UG - Haupttechnikzentrale UG	8 Wochen	Fre 15.06.29	Don 09.08.29	1423;215;470;422;486;438;1033	
1425		**TGA-Gewerke EG & OGs**	**294 Tage**	**Mon 13.11.28**	**Don 24.01.30**		
1426		**Flügel A**	**225 Tage**	**Mon 13.11.28**	**Fre 05.10.29**		
1427		**EG**	**215 Tage**	**Mon 13.11.28**	**Fre 21.09.29**		
1428		**Rohinstallation**	**50 Tage**	**Mon 13.11.28**	**Fre 02.02.29**		
1429		TGA: Tragkonstruktion im Flur	5 Tage	Mon 13.11.28	Fre 17.11.28	1311	
1430		TGA: Installation Lüftung	20 Tage	Mon 20.11.28	Fre 15.12.28	1429	G75
1431		TGA: Rohrgewerke (Heizung/Kälte, Sanitär)	25 Tage	Mon 20.11.28	Fre 22.12.28	1429	G40/G42
1432		TGA: Trassenbau ELT	5 Tage	Mon 08.01.29	Fre 12.01.29	1431	G53
1433		TGA: Kabelzug ELT	15 Tage	Mon 15.01.29	Fre 02.02.29	1432	G53
1434		Feininstallation	4 Wochen	Mon 18.06.29	Fre 13.07.29	1428;1585	
1435		Endinstallation	4 Wochen	Mon 27.08.29	Fre 21.09.29	1434;1689	
1436		**1. OG**	**225 Tage**	**Mon 13.11.28**	**Fre 05.10.29**		
1437		**Rohinstallation**	**50 Tage**	**Mon 13.11.28**	**Fre 02.02.29**		
1438		TGA: Tragkonstruktion im Flur	5 Tage	Mon 13.11.28	Fre 17.11.28	1311	
1439		TGA: Installation Lüftung	20 Tage	Mon 20.11.28	Fre 15.12.28	1438	G75
1440		TGA: Rohrgewerke (Heizung/Kälte, Sanitär)	25 Tage	Mon 20.11.28	Fre 22.12.28	1438	G40/G42
1441		TGA: Trassenbau ELT	5 Tage	Mon 08.01.29	Fre 12.01.29	1440	G53
1442		TGA: Kabelzug ELT	15 Tage	Mon 15.01.29	Fre 02.02.29	1441	G53
1443		Feininstallation	4 Wochen	Mon 09.07.29	Fre 03.08.29	1437;1592	
1444		Endinstallation	4 Wochen	Mon 10.09.29	Fre 05.10.29	1443;1690	
1445		**Flügel B**	**225 Tage**	**Mon 13.11.28**	**Fre 05.10.29**		
1446		**EG**	**210 Tage**	**Mon 13.11.28**	**Fre 14.09.29**		
1447		**Rohinstallation**	**50 Tage**	**Mon 13.11.28**	**Fre 02.02.29**		
1448		TGA: Tragkonstruktion im Flur	5 Tage	Mon 13.11.28	Fre 17.11.28	1311	
1449		TGA: Installation Lüftung	20 Tage	Mon 20.11.28	Fre 15.12.28	1448	G75
1450		TGA: Rohrgewerke (Heizung/Kälte, Sanitär)	25 Tage	Mon 20.11.28	Fre 22.12.28	1448	G40/G42
1451		TGA: Trassenbau ELT	5 Tage	Mon 08.01.29	Fre 12.01.29	1450	G53
1452		TGA: Kabelzug ELT	15 Tage	Mon 15.01.29	Fre 02.02.29	1451	G53
1453		Feininstallation	4 Wochen	Mon 18.06.29	Fre 13.07.29	1447;1600	
1454		Endinstallation	4 Wochen	Mon 20.08.29	Fre 14.09.29	1453;1692	
1455		**1. OG**	**225 Tage**	**Mon 13.11.28**	**Fre 05.10.29**		
1456		**Rohinstallation**	**50 Tage**	**Mon 13.11.28**	**Fre 02.02.29**		
1457		TGA: Tragkonstruktion im Flur	5 Tage	Mon 13.11.28	Fre 17.11.28	1311	
1458		TGA: Installation Lüftung	20 Tage	Mon 20.11.28	Fre 15.12.28	1457	G75
1459		TGA: Rohrgewerke (Heizung/Kälte, Sanitär)	25 Tage	Mon 20.11.28	Fre 22.12.28	1457	G40/G42
1460		TGA: Trassenbau ELT	5 Tage	Mon 08.01.29	Fre 12.01.29	1459	G53
1461		TGA: Kabelzug ELT	15 Tage	Mon 15.01.29	Fre 02.02.29	1460	G53
1462		Feininstallation	4 Wochen	Mon 09.07.29	Fre 03.08.29	1456;1607	
1463		Endinstallation	4 Wochen	Mon 10.09.29	Fre 05.10.29	1462;1693	
1464		**Flügel C**	**240 Tage**	**Fre 09.02.29**	**Don 24.01.30**		
1465		**EG**	**210 Tage**	**Fre 09.02.29**	**Don 29.11.29**		
1466		**Rohinstallation**	**50 Tage**	**Fre 09.02.29**	**Don 19.04.29**		
1467		TGA: Tragkonstruktion im Flur	5 Tage	Fre 09.02.29	Don 15.02.29	1361	
1468		TGA: Installation Lüftung	20 Tage	Fre 16.02.29	Don 15.03.29	1467	G75
1469		TGA: Rohrgewerke (Heizung/Kälte, Sanitär)	25 Tage	Fre 16.02.29	Don 22.03.29	1467	G40/G42
1470		TGA: Trassenbau ELT	5 Tage	Fre 23.03.29	Don 29.03.29	1469	G53
1471		TGA: Kabelzug ELT	15 Tage	Fre 30.03.29	Don 19.04.29	1470	G53
1472		Feininstallation	4 Wochen	Fre 31.08.29	Don 27.09.29	1466;1615	
1473		Endinstallation	4 Wochen	Fre 02.11.29	Don 29.11.29	1472;1695	
1474		**1. OG**	**225 Tage**	**Fre 09.02.29**	**Don 20.12.29**		
1475		**Rohinstallation**	**50 Tage**	**Fre 09.02.29**	**Don 19.04.29**		
1476		TGA: Tragkonstruktion im Flur	5 Tage	Fre 09.02.29	Don 15.02.29	1361	
1477		TGA: Installation Lüftung	20 Tage	Fre 16.02.29	Don 15.03.29	1476	G75
1478		TGA: Rohrgewerke (Heizung/Kälte, Sanitär)	25 Tage	Fre 16.02.29	Don 22.03.29	1476	G40/G42
1479		TGA: Trassenbau ELT	5 Tage	Fre 23.03.29	Don 29.03.29	1478	G53
1480		TGA: Kabelzug ELT	15 Tage	Fre 30.03.29	Don 19.04.29	1479	G53
1481		Feininstallation	4 Wochen	Fre 21.09.29	Don 18.10.29	1475;1622	
1482		Endinstallation	4 Wochen	Fre 23.11.29	Don 20.12.29	1481;1696	
1483		**2. OG**	**240 Tage**	**Fre 09.02.29**	**Don 24.01.30**		
1484		**Rohinstallation**	**50 Tage**	**Fre 09.02.29**	**Don 19.04.29**		
1485		TGA: Tragkonstruktion im Flur	5 Tage	Fre 09.02.29	Don 15.02.29	1361	
1486		TGA: Installation Lüftung	20 Tage	Fre 16.02.29	Don 15.03.29	1485	G75
1487		TGA: Rohrgewerke (Heizung/Kälte, Sanitär)	25 Tage	Fre 16.02.29	Don 22.03.29	1485	G40/G42
1488		TGA: Trassenbau ELT	5 Tage	Fre 23.03.29	Don 29.03.29	1487	G53
1489		TGA: Kabelzug ELT	15 Tage	Fre 30.03.29	Don 19.04.29	1488	G53
1490		Feininstallation	4 Wochen	Fre 12.10.29	Don 08.11.29	1484;1629	
1491		Endinstallation	4 Wochen	Fre 14.12.29	Don 24.01.30	1490;1697	
1492		**Flügel D+E**	**225 Tage**	**Fre 09.02.29**	**Don 20.12.29**		
1493		**EG**	**210 Tage**	**Fre 09.02.29**	**Don 29.11.29**		
1494		**Rohinstallation**	**50 Tage**	**Fre 09.02.29**	**Don 19.04.29**		
1495		TGA: Tragkonstruktion im Flur	5 Tage	Fre 09.02.29	Don 15.02.29	1361	
1496		TGA: Installation Lüftung	20 Tage	Fre 16.02.29	Don 15.03.29	1495	G75
1497		TGA: Rohrgewerke (Heizung/Kälte, Sanitär)	25 Tage	Fre 16.02.29	Don 22.03.29	1495	G40/G42
1498		TGA: Trassenbau ELT	5 Tage	Fre 23.03.29	Don 29.03.29	1497	G53
1499		TGA: Kabelzug ELT	15 Tage	Fre 30.03.29	Don 19.04.29	1498	G53
1500		Feininstallation	4 Wochen	Fre 31.08.29	Don 27.09.29	1494;1637	
1501		Endinstallation	4 Wochen	Fre 02.11.29	Don 29.11.29	1500;1699	
1502		**1. OG**	**225 Tage**	**Fre 09.02.29**	**Don 20.12.29**		
1503		**Rohinstallation**	**50 Tage**	**Fre 09.02.29**	**Don 19.04.29**		
1504		TGA: Tragkonstruktion im Flur	5 Tage	Fre 09.02.29	Don 15.02.29	1361	
1505		TGA: Installation Lüftung	20 Tage	Fre 16.02.29	Don 15.03.29	1504	G75
1506		TGA: Rohrgewerke (Heizung/Kälte, Sanitär)	25 Tage	Fre 16.02.29	Don 22.03.29	1504	G40/G42
1507		TGA: Trassenbau ELT	5 Tage	Fre 23.03.29	Don 29.03.29	1506	G53
1508		TGA: Kabelzug ELT	15 Tage	Fre 30.03.29	Don 19.04.29	1507	G53
1509		Feininstallation	4 Wochen	Fre 21.09.29	Don 18.10.29	1503;1644	
1510		Endinstallation	4 Wochen	Fre 23.11.29	Don 20.12.29	1509;1700	
1511		**Aufzugsanlagen**	24 Wochen	Fre 15.06.29	Don 29.11.29	1390;295;1418;1422	
1512		**G69.1 Förderanlagen (Deckenlifte an Massivbaudecken)**	4 Wochen	Mon 08.01.29	Fre 02.02.29	327;1390;1517	
1513		**G39_Trockenbau auf Rohdecke**	**119 Tage**	**Mon 20.11.28**	**Don 17.05.29**		
1514		**Flügel A**	**55 Tage**	**Mon 20.11.28**	**Fre 16.02.29**		
1515		**EG**	**45 Tage**	**Mon 20.11.28**	**Fre 02.02.29**		
1516		Wände 1. Seite	10 Tage	Mon 20.11.28	Fre 01.12.28	1366;678;1311;1429	
1517		TGA Installation in Wänden	15 Tage	Mon 04.12.28	Fre 22.12.28	1516	
1518		Wände 2. Seite	10 Tage	Mon 08.01.29	Fre 19.01.29	1517;1521	
1519		Spachteln Wand	10 Tage	Mon 22.01.29	Fre 02.02.29	1518	
1520		**1. OG**	**45 Tage**	**Mon 04.12.28**	**Fre 16.02.29**		
1521		Wände 1. Seite	10 Tage	Mon 04.12.28	Fre 15.12.28	1366;1516;1438	
1522		TGA Installation in Wänden	15 Tage	Mon 18.12.28	Fre 19.01.29	1521	
1523		Wände 2. Seite	10 Tage	Mon 22.01.29	Fre 02.02.29	1522	
1524		Spachteln Wand	10 Tage	Mon 05.02.29	Fre 16.02.29	1523	
1525		**Flügel B**	**55 Tage**	**Mon 20.11.28**	**Fre 16.02.29**		
1526		**EG**	**45 Tage**	**Mon 20.11.28**	**Fre 02.02.29**		
1527		Wände 1. Seite	10 Tage	Mon 20.11.28	Fre 01.12.28	1374;1311;1448	
1528		TGA Installation in Wänden	15 Tage	Mon 04.12.28	Fre 22.12.28	1527	
1529		Wände 2. Seite	10 Tage	Mon 08.01.29	Fre 19.01.29	1528	
1530		Spachteln Wand	10 Tage	Mon 22.01.29	Fre 02.02.29	1529	
1531		**1. OG**	**45 Tage**	**Mon 04.12.28**	**Fre 16.02.29**		
1532		Wände 1. Seite	10 Tage	Mon 04.12.28	Fre 15.12.28	1527;1457	
1533		TGA Installation in Wänden	15 Tage	Mon 18.12.28	Fre 19.01.29	1532	
1534		Wände 2. Seite	10 Tage	Mon 22.01.29	Fre 02.02.29	1533	
1535		Spachteln Wand	10 Tage	Mon 05.02.29	Fre 16.02.29	1534	
1536		**Flügel C**	**65 Tage**	**Fre 16.02.29**	**Don 17.05.29**		
1537		**EG**	**45 Tage**	**Fre 16.02.29**	**Don 19.04.29**		
1538		Wände 1. Seite	10 Tage	Fre 16.02.29	Don 01.03.29	1382;1361;1467	
1539		TGA Installation in Wänden	15 Tage	Fre 02.03.29	Don 22.03.29	1538	
1540		Wände 2. Seite	10 Tage	Fre 23.03.29	Don 05.04.29	1539	
1541		Spachteln Wand	10 Tage	Fre 06.04.29	Don 19.04.29	1540	
1542		**1. OG**	**45 Tage**	**Fre 02.03.29**	**Don 03.05.29**		
1543		Wände 1. Seite	10 Tage	Fre 02.03.29	Don 15.03.29	1538;1476	

Projekt: 208_T_01_008_202610
Datum: Fre 16.10.26

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag | Im Arbeit | Manueller Fortschritt

Terminplan LP 8

[redacted]

Nr.	Vo	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1544		TGA Installation in Wänden	15 Tage	Fre 16.03.29	Don 05.04.29	1543	
1545		Wände 2. Seite	10 Tage	Fre 06.04.29	Don 19.04.29	1544	
1546		Spachteln Wand	10 Tage	Fre 20.04.29	Don 03.05.29	1545	
1547		**2. OG**	**45 Tage**	**Fre 16.03.29**	**Don 17.05.29**		
1548		Wände 1. Seite	10 Tage	Fre 16.03.29	Don 29.03.29	1543;1485	
1549		TGA Installation in Wänden	15 Tage	Fre 30.03.29	Don 19.04.29	1548	
1550		Wände 2. Seite	10 Tage	Fre 20.04.29	Don 03.05.29	1549	
1551		Spachteln Wand	10 Tage	Fre 04.05.29	Don 17.05.29	1541;1550	
1552		**Flügel D+E**	**55 Tage**	**Fre 16.02.29**	**Don 03.05.29**		
1553		**EG**	**45 Tage**	**Fre 16.02.29**	**Don 19.04.29**		
1554		Wände 1. Seite	10 Tage	Fre 16.02.29	Don 01.03.29	1390;1361;1495	
1555		TGA Installation in Wänden	15 Tage	Fre 02.03.29	Don 22.03.29	1554	
1556		Wände 2. Seite	10 Tage	Fre 23.03.29	Don 05.04.29	1555	
1557		Spachteln Wand	10 Tage	Fre 06.04.29	Don 19.04.29	1556	
1558		**1. OG**	**45 Tage**	**Fre 02.03.29**	**Don 03.05.29**		
1559		Wände 1. Seite	10 Tage	Fre 02.03.29	Don 15.03.29	1554;1504	
1560		TGA Installation in Wänden	15 Tage	Fre 16.03.29	Don 05.04.29	1559	
1561		Wände 2. Seite	10 Tage	Fre 06.04.29	Don 19.04.29	1560	
1562		Spachteln Wand	10 Tage	Fre 20.04.29	Don 03.05.29	1557;1561	
1563		**G25_Estrich (Heizestrich inkl. Verlegung Fußbodenheizung)**	**104 Tage**	**Mon 05.02.29**	**Don 28.06.29**		
1564		**Flügel A**	**35 Tage**	**Mon 05.02.29**	**Fre 23.03.29**		
1565		EG	20 Tage	Mon 05.02.29	Fre 02.03.29	1519;758	
1566		1.OG	20 Tage	Mon 26.02.29	Fre 23.03.29	1565EA-1 Woche;1524	
1567		**Flügel B**	**35 Tage**	**Mon 05.02.29**	**Fre 23.03.29**		
1568		EG	20 Tage	Mon 05.02.29	Fre 02.03.29	1530	
1569		1.OG	20 Tage	Mon 26.02.29	Fre 23.03.29	1568EA-1 Woche;1535	
1570		**Flügel C**	**50 Tage**	**Fre 20.04.29**	**Don 28.06.29**		
1571		EG	20 Tage	Fre 20.04.29	Don 17.05.29	1541;1566	
1572		1.OG	20 Tage	Fre 11.05.29	Don 07.06.29	1571EA-1 Woche;1546	
1573		2.OG	20 Tage	Fre 01.06.29	Don 28.06.29	1572EA-1 Woche;1551	
1574		**Flügel D+E**	**35 Tage**	**Fre 20.04.29**	**Don 07.06.29**		
1575		EG	20 Tage	Fre 20.04.29	Don 17.05.29	1557;1569	
1576		1.OG	20 Tage	Fre 11.05.29	Don 07.06.29	1575EA-1 Woche;1562	
1577		**G39_Trockenbau inkl. Abhangdecken**	**159 Tage**	**Mon 05.03.29**	**Don 11.10.29**		
1578		**Flügel A**	**90 Tage**	**Mon 05.03.29**	**Fre 06.07.29**		
1579		**EG**	**75 Tage**	**Mon 05.03.29**	**Fre 15.06.29**		
1580		Wände 1. Seite	10 Tage	Mon 05.03.29	Fre 16.03.29	1565	
1581		TGA Installation in Wänden	10 Tage	Mon 19.03.29	Fre 30.03.29	1580	
1582		Wände 2. Seite	10 Tage	Mon 02.04.29	Fre 13.04.29	1581	
1583		Decke GK	25 Tage	Mon 16.04.29	Fre 18.05.29	1582	
1584		Spachteln Wand + Decke	10 Tage	Mon 21.05.29	Fre 01.06.29	1583	
1585		Decke Mineralfaser/Akustik	10 Tage	Mon 04.06.29	Fre 15.06.29	1584	
1586		**1. OG**	**75 Tage**	**Mon 26.03.29**	**Fre 06.07.29**		
1587		Wände 1. Seite	10 Tage	Mon 26.03.29	Fre 06.04.29	1566	
1588		TGA Installation in Wänden	10 Tage	Mon 09.04.29	Fre 20.04.29	1587	
1589		Wände 2. Seite	10 Tage	Mon 23.04.29	Fre 04.05.29	1588	
1590		Decke GK	25 Tage	Mon 07.05.29	Fre 08.06.29	1589	
1591		Spachteln Wand + Decke	10 Tage	Mon 11.06.29	Fre 22.06.29	1590	
1592		Decke Mineralfaser/Akustik	10 Tage	Mon 25.06.29	Fre 06.07.29	1591	
1593		**Flügel B**	**90 Tage**	**Mon 05.03.29**	**Fre 06.07.29**		
1594		**EG**	**75 Tage**	**Mon 05.03.29**	**Fre 15.06.29**		
1595		Wände 1. Seite	10 Tage	Mon 05.03.29	Fre 16.03.29	1568	
1596		TGA Installation in Wänden	10 Tage	Mon 19.03.29	Fre 30.03.29	1595	
1597		Wände 2. Seite	10 Tage	Mon 02.04.29	Fre 13.04.29	1596	
1598		Decke GK	25 Tage	Mon 16.04.29	Fre 18.05.29	1597	
1599		Spachteln Wand + Decke	10 Tage	Mon 21.05.29	Fre 01.06.29	1598	
1600		Decke Mineralfaser/Akustik	10 Tage	Mon 04.06.29	Fre 15.06.29	1599	
1601		**1. OG**	**75 Tage**	**Mon 26.03.29**	**Fre 06.07.29**		
1602		Wände 1. Seite	10 Tage	Mon 26.03.29	Fre 06.04.29	1569	
1603		TGA Installation in Wänden	10 Tage	Mon 09.04.29	Fre 20.04.29	1602	
1604		Wände 2. Seite	10 Tage	Mon 23.04.29	Fre 04.05.29	1603	
1605		Decke GK	25 Tage	Mon 07.05.29	Fre 08.06.29	1604	
1606		Spachteln Wand + Decke	10 Tage	Mon 11.06.29	Fre 22.06.29	1605	
1607		Decke Mineralfaser/Akustik	10 Tage	Mon 25.06.29	Fre 06.07.29	1606	
1608		**Flügel C**	**105 Tage**	**Fre 18.05.29**	**Don 11.10.29**		
1609		**EG**	**75 Tage**	**Fre 18.05.29**	**Don 30.08.29**		
1610		Wände 1. Seite	10 Tage	Fre 18.05.29	Don 31.05.29	1571	
1611		TGA Installation in Wänden	10 Tage	Fre 01.06.29	Don 14.06.29	1610	
1612		Wände 2. Seite	10 Tage	Fre 15.06.29	Don 28.06.29	1611	
1613		Decke GK	25 Tage	Fre 29.06.29	Don 02.08.29	1612	
1614		Spachteln Wand + Decke	10 Tage	Fre 03.08.29	Don 16.08.29	1613	
1615		Decke Mineralfaser/Akustik	10 Tage	Fre 17.08.29	Don 30.08.29	1614	
1616		**1. OG**	**75 Tage**	**Fre 08.06.29**	**Don 20.09.29**		
1617		Wände 1. Seite	10 Tage	Fre 08.06.29	Don 21.06.29	1572	
1618		TGA Installation in Wänden	10 Tage	Fre 22.06.29	Don 05.07.29	1617	
1619		Wände 2. Seite	10 Tage	Fre 06.07.29	Don 19.07.29	1618	
1620		Decke GK	25 Tage	Fre 20.07.29	Don 23.08.29	1619	
1621		Spachteln Wand + Decke	10 Tage	Fre 24.08.29	Don 06.09.29	1620	
1622		Decke Mineralfaser/Akustik	10 Tage	Fre 07.09.29	Don 20.09.29	1621	
1623		**2. OG**	**75 Tage**	**Fre 29.06.29**	**Don 11.10.29**		
1624		Wände 1. Seite	10 Tage	Fre 29.06.29	Don 12.07.29	1573	
1625		TGA Installation in Wänden	10 Tage	Fre 13.07.29	Don 26.07.29	1624	
1626		Wände 2. Seite	10 Tage	Fre 27.07.29	Don 09.08.29	1625	
1627		Decke GK	25 Tage	Fre 10.08.29	Don 13.09.29	1626	
1628		Spachteln Wand + Decke	10 Tage	Fre 14.09.29	Don 27.09.29	1627	
1629		Decke Mineralfaser/Akustik	10 Tage	Fre 28.09.29	Don 11.10.29	1628	
1630		**Flügel D+E**	**90 Tage**	**Fre 18.05.29**	**Don 20.09.29**		
1631		**EG**	**75 Tage**	**Fre 18.05.29**	**Don 30.08.29**		
1632		Wände 1. Seite	10 Tage	Fre 18.05.29	Don 31.05.29	1575	
1633		TGA Installation in Wänden	10 Tage	Fre 01.06.29	Don 14.06.29	1632	
1634		Wände 2. Seite	10 Tage	Fre 15.06.29	Don 28.06.29	1633	
1635		Decke GK	25 Tage	Fre 29.06.29	Don 02.08.29	1634	
1636		Spachteln Wand + Decke	10 Tage	Fre 03.08.29	Don 16.08.29	1635	
1637		Decke Mineralfaser/Akustik	10 Tage	Fre 17.08.29	Don 30.08.29	1636	
1638		**1. OG**	**75 Tage**	**Fre 08.06.29**	**Don 20.09.29**		
1639		Wände 1. Seite	10 Tage	Fre 08.06.29	Don 21.06.29	1576	
1640		TGA Installation in Wänden	10 Tage	Fre 22.06.29	Don 05.07.29	1639	
1641		Wände 2. Seite	10 Tage	Fre 06.07.29	Don 19.07.29	1640	
1642		Decke GK	25 Tage	Fre 20.07.29	Don 23.08.29	1641	
1643		Spachteln Wand + Decke	10 Tage	Fre 24.08.29	Don 06.09.29	1642	
1644		Decke Mineralfaser/Akustik	10 Tage	Fre 07.09.29	Don 20.09.29	1643	
1645		**Rückbau Gerüstaufzug A-B**	1 Woche	Mon 09.07.29	Fre 13.07.29	1607	
1646		**Rückbau Baustraße A-B (Erdbau) / Start Freianlagen**	1 Woche	Mon 16.07.29	Fre 20.07.29	1645	
1647		**Rückbau Baustraße B-C (Erdbau) / Start Freianlagen**	2 Wochen	Fre 12.10.29	Don 25.10.29	1629	
1648		**Rückbau Baustraße D-A (Erdbau) / Start Freianlagen**	2 Wochen	Fre 18.01.30	Don 31.01.30	1729	
1649		**Rückbau Baustraße Ost (Asphalt) / Start Freianlagen**	2 Wochen	Fre 01.02.30	Don 14.02.30	1648	
1650		TGA Lüftung: Erdkanal PPS DN 1400 (FOL/AIL) inkl. Anschluss Wanddurchführung, Fortluft-/Außenlufttürme	10 Tage	Mon 23.07.29	Fre 03.08.29	1646	G75
1651		**Ausführung Außenanlagen Neubau -> siehe separater Terminplan**	**234 Tage**	**Mon 23.07.29**	**Don 27.06.30**		
1652		Phase 1 GaLaBau: Anlieferung und Opticus	60 Tage	Mon 23.07.29	Fre 12.10.29	1646	
1653		Phase 2 GaLaBau: gem. Schulhof und Albatros	95 Tage	Fre 26.10.29	Don 21.03.30	1647	
1654		Phase 3 GaLaBau: Zufahrt Anger Nord	20 Tage	Fre 22.02.30	Don 21.03.30	1653EE	
1655		Rückbau Baustraße Ost	26 Tage	Fre 22.03.30	Fre 26.04.30	1654;1649	
1656		Phase 4 GaLaBau: Vegetationsarbeiten Schulhöfe und Anlieferung	35 Tage	Fre 01.02.30	Don 21.03.30	1652;1653EE	
1657		Phase 5 GaLaBau: Anger Nord	70 Tage	Fre 22.03.30	Don 27.06.30	1656	
1658		Phase 6: Restarbeiten und Mangelbeseitigung	6 Tage	Fre 28.06.30	Fre 05.07.30	1657	
1659		**G24_Fliesen**	**99 Tage**	**Mon 18.06.29**	**Don 01.11.29**		
1660		**Flügel A**	**30 Tage**	**Mon 18.06.29**	**Fre 27.07.29**		
1661		EG	20 Tage	Mon 18.06.29	Fre 13.07.29	1565EA+4 Wochen;1585;790	
1662		1.OG	15 Tage	Mon 09.07.29	Fre 27.07.29	1566EA+4 Wochen;1592	
1663		**Flügel B**	**30 Tage**	**Mon 18.06.29**	**Fre 27.07.29**		
1664		EG	15 Tage	Mon 18.06.29	Fre 06.07.29	1568EA+4 Wochen;1600	
1665		1.OG	15 Tage	Mon 09.07.29	Fre 27.07.29	1569EA+4 Wochen;1607	
1666		**Flügel C**	**45 Tage**	**Fre 31.08.29**	**Don 01.11.29**		
1667		EG	15 Tage	Fre 31.08.29	Don 20.09.29	1571EA+4 Wochen;1615	
1668		1.OG	15 Tage	Fre 21.09.29	Don 11.10.29	1572EA+4 Wochen;1622	
1669		2.OG	15 Tage	Fre 12.10.29	Don 01.11.29	1573EA+4 Wochen;1629	
1670		**Flügel D+E**	**30 Tage**	**Fre 31.08.29**	**Don 11.10.29**		
1671		EG	15 Tage	Fre 31.08.29	Don 20.09.29	1575EA+4 Wochen;1637	



Projekt: 208_T_01_008_202610
Datum: Fre 16.10.26


Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelrollup | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag | In Arbeit | Manueller Fortschritt

Förderschulzentrum Bielefeld

Terminplan LP 8

[redacted]

Nr.	Vo	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1672		1.OG	15 Tage	Fre 21.09.29	Don 11.10.29	1576EA+4 Wochen;1644	
1673		**G36_Bodenbeläge/ G14_Betonwerkstein, Sauberlaufmatten/ G28_Parkett/ G96_Sportboden, Prallwände**	**99 Tage**	**Mon 09.07.29**	**Don 22.11.29**		
1674		**Flügel A**	**25 Tage**	**Mon 16.07.29**	**Fre 17.08.29**		
1675		EG	15 Tage	Mon 16.07.29	Fre 03.08.29	1565EA+4 Wochen;1661;806;854;822;838	
1676		1.OG	15 Tage	Mon 30.07.29	Fre 17.08.29	1566EA+4 Wochen;1662	
1677		**Flügel B**	**30 Tage**	**Mon 09.07.29**	**Fre 17.08.29**		
1678		EG	15 Tage	Mon 09.07.29	Fre 27.07.29	1568EA+4 Wochen;1664	
1679		1.OG	15 Tage	Mon 30.07.29	Fre 17.08.29	1569EA+4 Wochen;1665	
1680		**Flügel C**	**45 Tage**	**Fre 21.09.29**	**Don 22.11.29**		
1681		EG	15 Tage	Fre 21.09.29	Don 11.10.29	1571EA+4 Wochen;1667	
1682		1.OG	15 Tage	Fre 12.10.29	Don 01.11.29	1572EA+4 Wochen;1668	
1683		2.OG	15 Tage	Fre 02.11.29	Don 22.11.29	1573EA+4 Wochen;1669	
1684		**Flügel D+E**	**30 Tage**	**Fre 21.09.29**	**Don 01.11.29**		
1685		EG	15 Tage	Fre 21.09.29	Don 11.10.29	1575EA+4 Wochen;1671	
1686		1.OG	15 Tage	Fre 12.10.29	Don 01.11.29	1576EA+4 Wochen;1672	
1687		**G34_Maler**	**99 Tage**	**Mon 30.07.29**	**Don 13.12.29**		
1688		**Flügel A**	**25 Tage**	**Mon 06.08.29**	**Fre 07.09.29**		
1689		EG	15 Tage	Mon 06.08.29	Fre 24.08.29	1675;902;1434	
1690		1.OG	15 Tage	Mon 20.08.29	Fre 07.09.29	1676;1443	
1691		**Flügel B**	**30 Tage**	**Mon 30.07.29**	**Fre 07.09.29**		
1692		EG	15 Tage	Mon 30.07.29	Fre 17.08.29	1678;1453	
1693		1.OG	15 Tage	Mon 20.08.29	Fre 07.09.29	1679;1462	
1694		**Flügel C**	**45 Tage**	**Fre 12.10.29**	**Don 13.12.29**		
1695		EG	15 Tage	Fre 12.10.29	Don 01.11.29	1681;1472	
1696		1.OG	15 Tage	Fre 02.11.29	Don 22.11.29	1682;1481	
1697		2.OG	15 Tage	Fre 23.11.29	Don 13.12.29	1683;1490	
1698		**Flügel D+E**	**30 Tage**	**Fre 12.10.29**	**Don 22.11.29**		
1699		EG	15 Tage	Fre 12.10.29	Don 01.11.29	1685;1500	
1700		1.OG	15 Tage	Fre 02.11.29	Don 22.11.29	1686;1509	
1701		**G69.1 Förderanlagen (Deckenliifte an HBV-Decken)**	4 Wochen	Fre 23.11.29	Don 20.12.29	1512;1700	
1702		**G26 Metallbau Türen/ G31 Schlosser (Geländer)/ G29.1_Innentüren/ G29.2_Sondertüren Aula/ G29.3_Innentüren Stahlblech**	**99 Tage**	**Mon 20.08.29**	**Don 17.01.30**		
1703		**Flügel A**	**25 Tage**	**Mon 27.08.29**	**Fre 28.09.29**		
1704		EG + Türen Technikgebäude	15 Tage	Mon 27.08.29	Fre 14.09.29	1689;742;630;646;710;918;934;950	
1705		1.OG	15 Tage	Mon 10.09.29	Fre 28.09.29	1690	
1706		**Flügel B**	**30 Tage**	**Mon 20.08.29**	**Fre 28.09.29**		
1707		EG	15 Tage	Mon 20.08.29	Fre 07.09.29	1692	
1708		1.OG	15 Tage	Mon 10.09.29	Fre 28.09.29	1693	
1709		**Flügel C**	**45 Tage**	**Fre 02.11.29**	**Don 17.01.30**		
1710		EG	15 Tage	Fre 02.11.29	Don 22.11.29	1695	
1711		1.OG	15 Tage	Fre 23.11.29	Don 13.12.29	1696	
1712		2.OG	15 Tage	Fre 14.12.29	Don 17.01.30	1697	
1713		**Flügel D+E**	**30 Tage**	**Fre 02.11.29**	**Don 13.12.29**		
1714		EG	15 Tage	Fre 02.11.29	Don 22.11.29	1699	
1715		1.OG	15 Tage	Fre 23.11.29	Don 13.12.29	1700	
1716		**Innenausbau / feste Möblierung / Leitsystem / Ausstattung Gymnastikhalle**	**99 Tage**	**Mon 10.09.29**	**Don 07.02.30**		
1717		**Flügel A**	**25 Tage**	**Mon 17.09.29**	**Fre 19.10.29**		
1718		EG	15 Tage	Mon 17.09.29	Fre 05.10.29	1704;886;998;870	
1719		1.OG	15 Tage	Mon 01.10.29	Fre 19.10.29	1705	
1720		**Flügel B**	**30 Tage**	**Mon 10.09.29**	**Fre 19.10.29**		
1721		EG	15 Tage	Mon 10.09.29	Fre 28.09.29	1707	
1722		1.OG	15 Tage	Mon 01.10.29	Fre 19.10.29	1708	
1723		**Flügel C**	**45 Tage**	**Fre 23.11.29**	**Don 07.02.30**		
1724		EG	15 Tage	Fre 23.11.29	Don 13.12.29	1710	
1725		1.OG	15 Tage	Fre 14.12.29	Don 17.01.30	1711	
1726		2.OG	15 Tage	Fre 18.01.30	Don 07.02.30	1712	
1727		**Flügel D+E**	**30 Tage**	**Fre 23.11.29**	**Don 17.01.30**		
1728		EG	15 Tage	Fre 23.11.29	Don 13.12.29	1714	
1729		1.OG	15 Tage	Fre 14.12.29	Don 17.01.30	1715	
1730		**Restarbeiten alle Gewerke (Türblätter, Schließanlage, Restarb. Maler, Beschilderung, Feuerlöscher ...)**	**99 Tage**	**Mon 01.10.29**	**Don 28.02.30**		
1731		**Flügel A**	**25 Tage**	**Mon 08.10.29**	**Fre 09.11.29**		
1732		EG	15 Tage	Mon 08.10.29	Fre 26.10.29	1718;982;966;502	
1733		1.OG	15 Tage	Mon 22.10.29	Fre 09.11.29	1719	
1734		**Flügel B**	**30 Tage**	**Mon 01.10.29**	**Fre 09.11.29**		
1735		EG	15 Tage	Mon 01.10.29	Fre 19.10.29	1721	
1736		1.OG	15 Tage	Mon 22.10.29	Fre 09.11.29	1722	
1737		**Flügel C**	**45 Tage**	**Fre 14.12.29**	**Don 28.02.30**		
1738		EG	15 Tage	Fre 14.12.29	Don 17.01.30	1724	
1739		1.OG	15 Tage	Fre 18.01.30	Don 07.02.30	1725	
1740		2.OG	15 Tage	Fre 08.02.30	Don 28.02.30	1726	
1741		**Flügel D+E**	**30 Tage**	**Fre 14.12.29**	**Don 07.02.30**		
1742		EG	15 Tage	Fre 14.12.29	Don 17.01.30	1728	
1743		1.OG	15 Tage	Fre 18.01.30	Don 07.02.30	1729	
1744		Blower Door Feinmessung (eingeschränkter Zugang alle Gewerke)	1 Woche	Fre 08.02.30	Don 14.02.30	1743	
1745		**Reinigung**	**89 Tage**	**Mon 22.10.29**	**Don 07.03.30**		
1746		**Flügel A**	**15 Tage**	**Mon 29.10.29**	**Fre 16.11.29**		
1747		EG	5 Tage	Mon 29.10.29	Fre 02.11.29	1718;1732;1014;1435	
1748		1.OG	5 Tage	Mon 12.11.29	Fre 16.11.29	1719;1733;1444	
1749		**Flügel B**	**20 Tage**	**Mon 22.10.29**	**Fre 16.11.29**		
1750		EG	5 Tage	Mon 22.10.29	Fre 26.10.29	1721;1735;1454	
1751		1.OG	5 Tage	Mon 12.11.29	Fre 16.11.29	1722;1736;1463	
1752		**Flügel C**	**35 Tage**	**Fre 18.01.30**	**Don 07.03.30**		
1753		EG	5 Tage	Fre 18.01.30	Don 24.01.30	1724;1738;1473	
1754		1.OG	5 Tage	Fre 08.02.30	Don 14.02.30	1725;1739;1482	
1755		2.OG	5 Tage	Fre 01.03.30	Don 07.03.30	1726;1740;1491	
1756		**Flügel D+E**	**25 Tage**	**Fre 18.01.30**	**Don 21.02.30**		
1757		EG	5 Tage	Fre 18.01.30	Don 24.01.30	1728;1742;1501	
1758		1.OG	5 Tage	Fre 15.02.30	Don 21.02.30	1729;1743;1744;1510	
1759		Abnahmebegehungen/ Mängelbeseitigung	**99 Tage**	**Mon 29.10.29**	**Don 28.03.30**		
1760		**Flügel A**	**25 Tage**	**Mon 05.11.29**	**Fre 07.12.29**		
1761		EG	15 Tage	Mon 05.11.29	Fre 23.11.29	1747	
1762		1.OG	15 Tage	Mon 19.11.29	Fre 07.12.29	1748	
1763		**Flügel B**	**30 Tage**	**Mon 29.10.29**	**Fre 07.12.29**		
1764		EG	15 Tage	Mon 29.10.29	Fre 16.11.29	1750	
1765		1.OG	15 Tage	Mon 19.11.29	Fre 07.12.29	1751	
1766		**Flügel C**	**45 Tage**	**Fre 25.01.30**	**Don 28.03.30**		
1767		EG (Verlängerung wg. Blower-Door)	20 Tage	Fre 25.01.30	Don 21.02.30	1753	
1768		1.OG	15 Tage	Fre 15.02.30	Don 07.03.30	1754	
1769		2.OG	15 Tage	Fre 08.03.30	Don 28.03.30	1755	
1770		**Flügel D+E**	**35 Tage**	**Fre 25.01.30**	**Don 14.03.30**		
1771		EG (Verlängerung wg. Blower-Door)	20 Tage	Fre 25.01.30	Don 21.02.30	1757	
1772		1.OG	15 Tage	Fre 22.02.30	Don 14.03.30	1758	
1773		**Technische Inbetriebnahmen – IBN-Terminplan G2597 (Vorabzug 20.01.2026) -> siehe separater Terminplan**	**265 Tage**	**Mon 05.03.29**	**Fre 22.03.30**		
1774		Meilenstein: TGA-Installationen fertiggestellt (Zentralen UG A/E)	0 Tage	Don 09.08.29	Don 09.08.29	1420;1424	
1775		IBN Lüftung (G75)	117 Tage	Don 09.08.29	Fre 01.02.30	1774EA-1 Tag	
1776		IBN Heizung/Kälte (G40)	21 Tage	Don 09.08.29	Don 06.09.29	1774EA-1 Tag	
1777		IBN Sanitär (G42)	21 Tage	Don 09.08.29	Don 06.09.29	1774EA-1 Tag	
1778		IBN MSR / Gebäudeautomation (G70)	157 Tage	Don 14.06.29	Fre 01.02.30	1774AA-41 Tage	
1779		Probebetrieb und Abschluss (alle Gewerke)	35 Tage	Mon 04.02.30	Fre 22.03.30	1775,1776,1778	
1780		IBN BMA / Brandmeldeanlage (G53)	90 Tage	Mon 15.10.29	Fre 01.03.30	1695AA+1 Tag	
1781		IBN Sibe / Sicherheitsbeleuchtungsanlage (G53)	90 Tage	Mon 15.10.29	Fre 01.03.30	1695AA+1 Tag	
1782		IBN Förderanlagen (G69)	102 Tage	Mon 27.08.29	Die 29.01.30		
1783		IBN Förderanlagen (G69.1 Deckenlifte)	15 Tage	Mon 14.01.30	Fre 01.02.30		
1784		IBN Elektro (G53)	55 Tage	Mon 02.04.29	Fre 15.06.29		
1785		IBN 10kV Technikgebäude (G53)	15 Tage	Mon 05.03.29	Fre 23.03.29		
1786		SV-Abnahme Gesundheitsamt Küche	1 Tag	Fre 29.03.30	Fre 29.03.30	1759	
1787		**Behördliche Abnahme (Bauordnungsamt) Bauwerk**	**2 Tage**	**Fre 29.03.30**	**Mon 01.04.30**	**1759;1773**	
1788		formale Abnahmen Bauherr (TGA + Ausbau)	2 Wochen	Mon 01.04.30	Fre 12.04.30	1759;1787EA-1 Tag;1773	
1789		Feinreinigung Gesamt	10 Tage	Mon 25.03.30	Fre 05.04.30	1773	
1790		Übergabe an Bauherr	0 Tage	Fre 12.04.30	Fre 12.04.30	1789;1788	
1791		VOC Messung (DGNB)	1 Woche	Mon 06.05.30	Fre 10.05.30	1789EA+4 Wochen	
1792		Behördliche Endabnahme inkl. Außenanlagen	0 Tage	Don 04.07.30	Don 04.07.30	1787;1651EA+1 Woche	B01_Bauaufsicht
1793		**Möblierung durch Bauherr**	**8 Wochen**	**Mon 13.05.30**	**Fre 05.07.30**	1791	H01_LWL
1794		**Start Nutzung**	**0 Tage**	**Fre 05.07.30**	**Fre 05.07.30**	**1793;1787;1792;1658**	**N01_Nutzer**

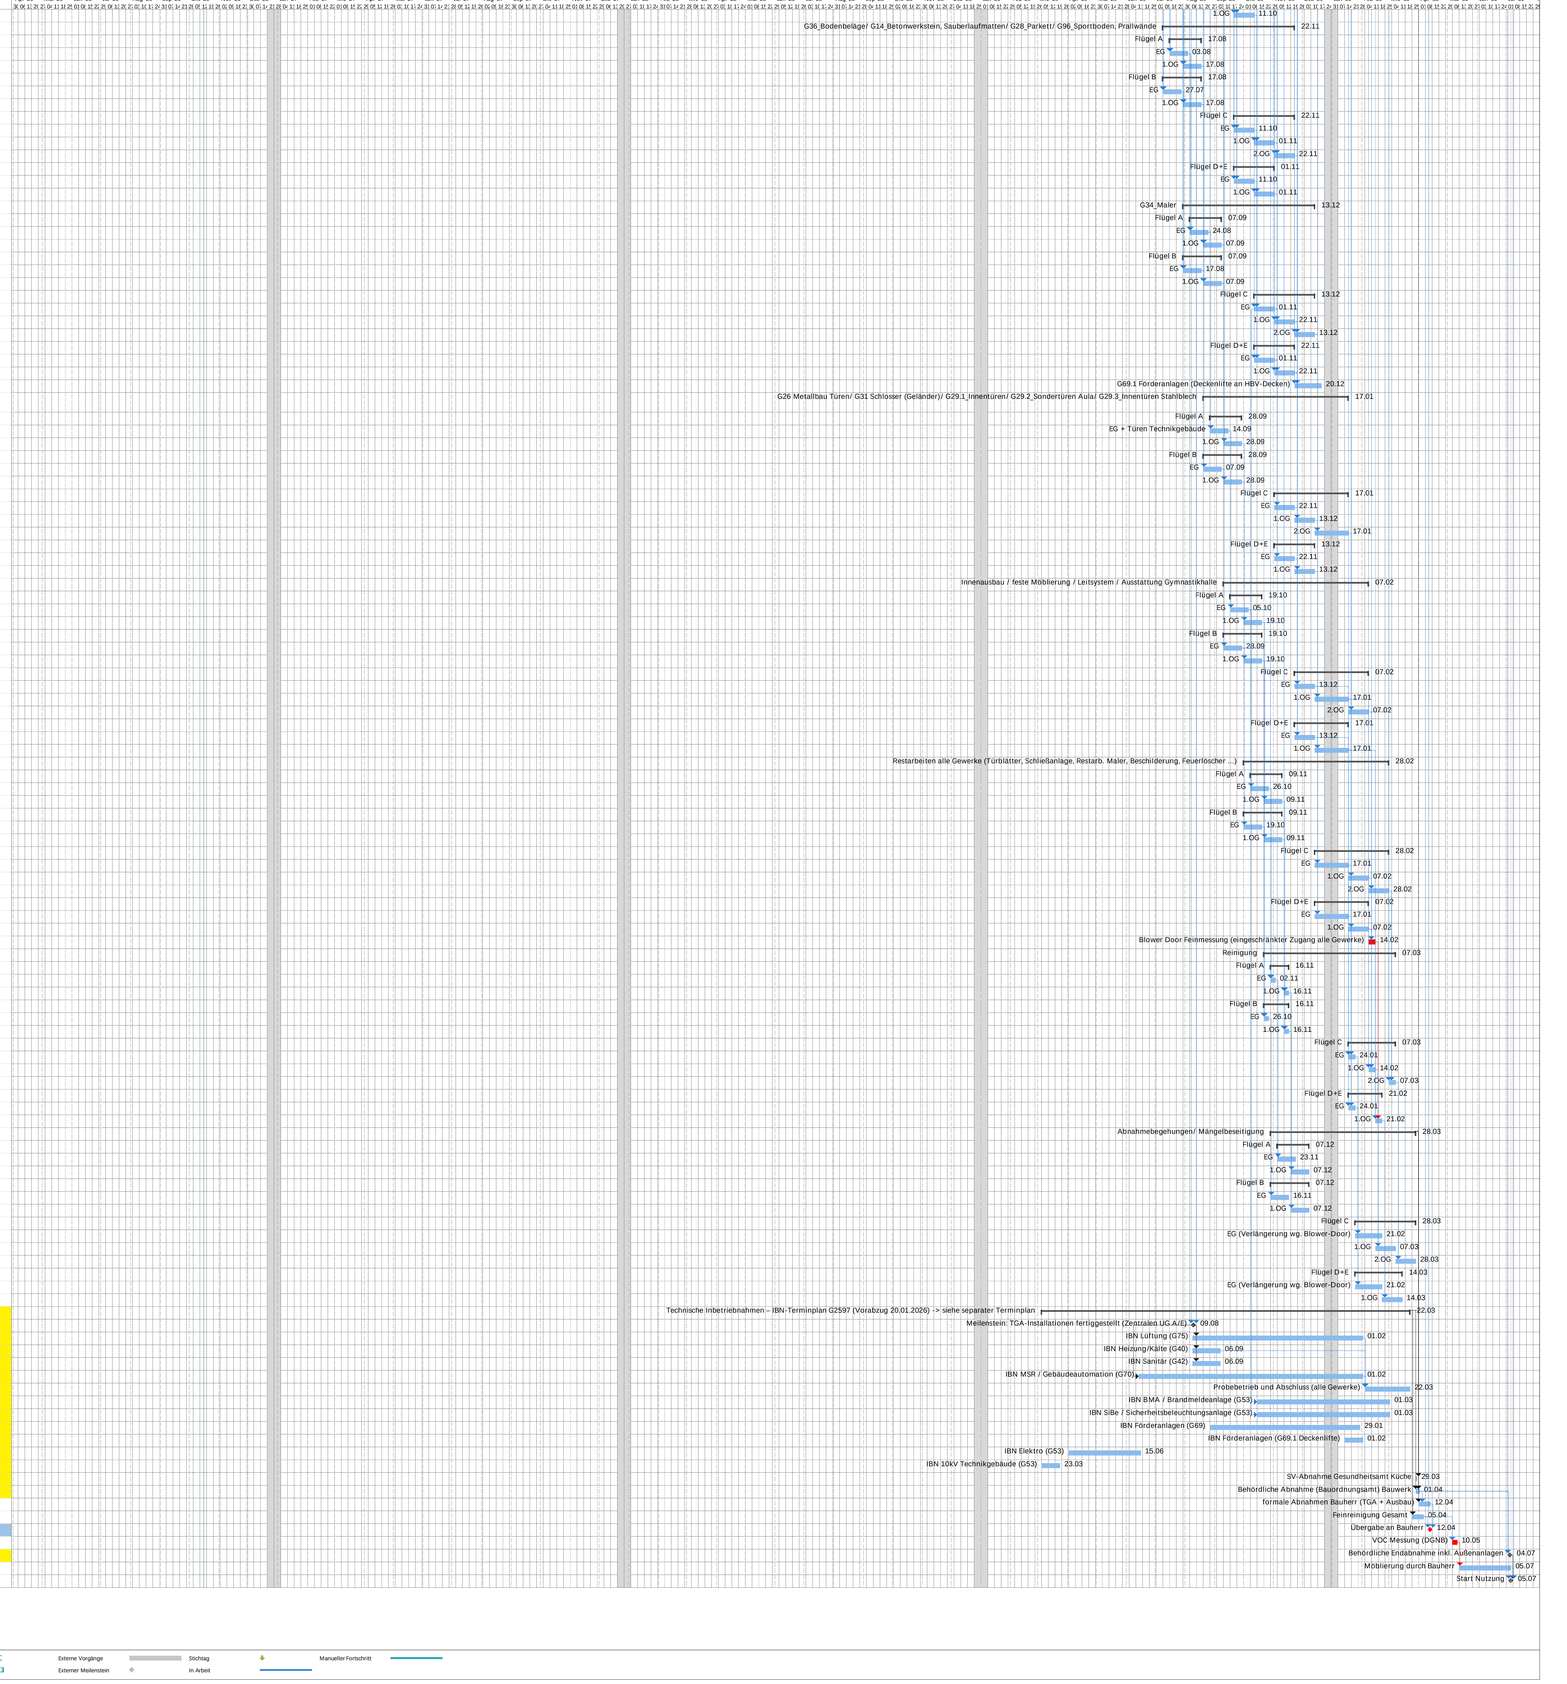

Projekt: 208_T_01_008_202610
Datum: Fre 16.10.26

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelrollup | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag | In Arbeit | Manueller Fortschritt
