KiGa 09; BT A

Hauptplan

Manuel Maier
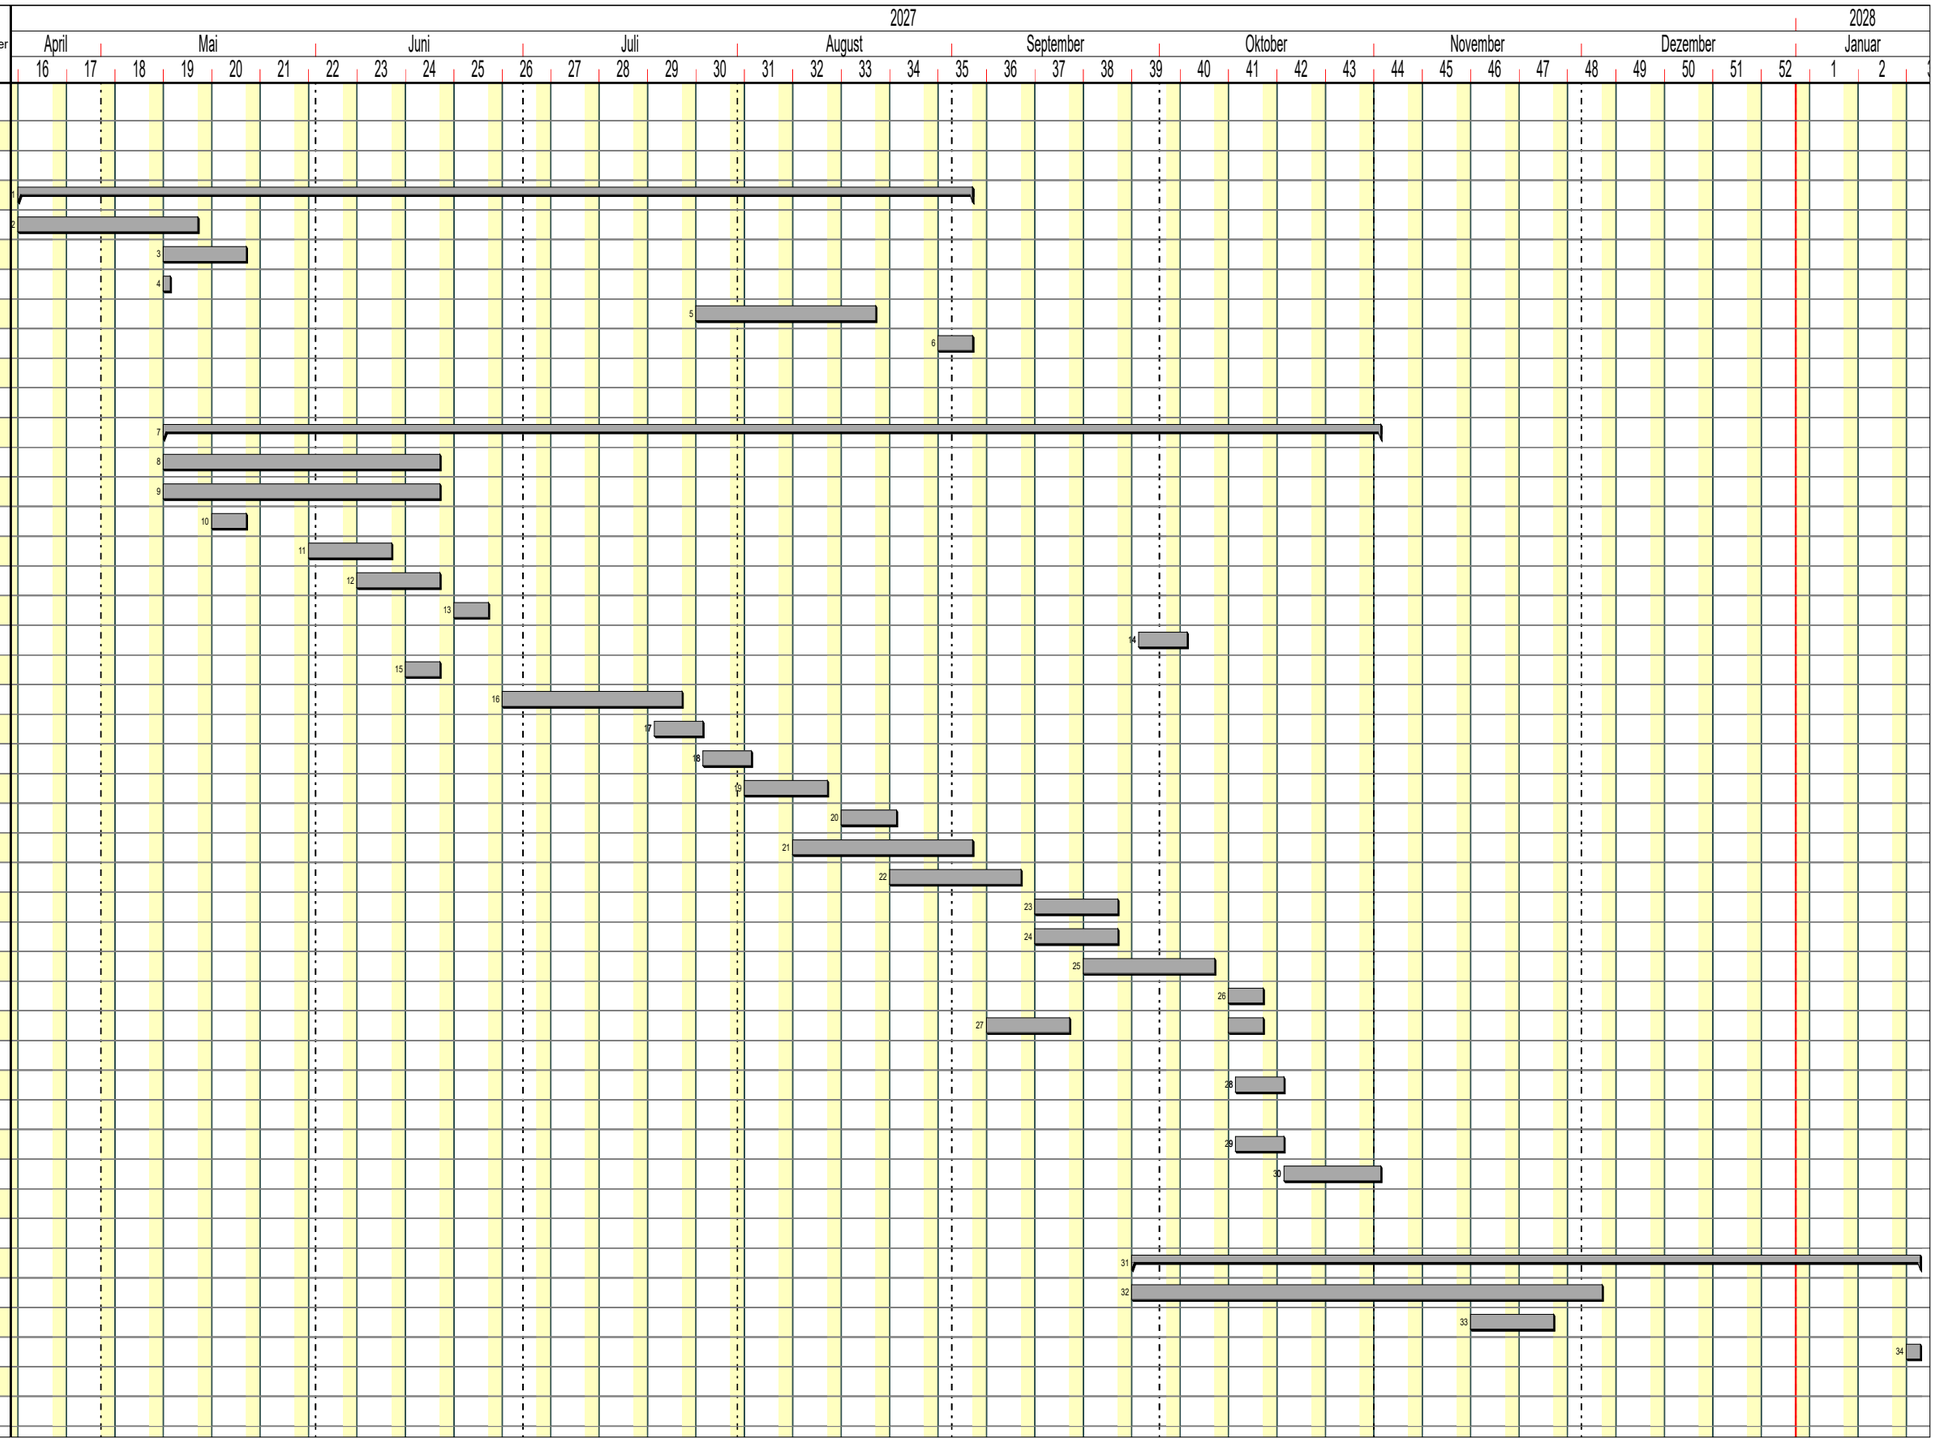
Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende	Vorgänger	Nachfolger
1	**Gebäudehülle**	**19.04.2027**	**100t**	**03.09.2027**		
2	Verblendmauerwerk	19.04.2027	20t	14.05.2027		
3	Kunststofffenster	10.05.2027	10t	21.05.2027		
4	Alu-Elemente	10.05.2027	1t	10.05.2027		
5	WDVS	26.07.2027	20t	20.08.2027		
6	Balkone	30.08.2027	5t	03.09.2027		
7	**Innenausbau**	**10.05.2027**	**126t**	**01.11.2027**		
8	Heizung/Sanitär grob	10.05.2027	30t	18.06.2027		
9	Elektro grob	10.05.2027	30t	18.06.2027		
10	Montage Zargen	17.05.2027	5t	21.05.2027		
11	Trockenbau Unterkonstruktion	31.05.2027	10t	11.06.2027		
12	Montage Kunststofffenster	07.06.2027	10t	18.06.2027		
13	Fensterbänke	21.06.2027	5t	25.06.2027		
14	Montage Treppengeländer	28.09.2027	5t	04.10.2027		
15	Trockenbau Beplankung	14.06.2027	5t	18.06.2027		
16	Innenputz	28.06.2027	20t	23.07.2027		
17	Dämmung Estrich	20.07.2027	5t	26.07.2027		
18	Verrohrung Fußbodenheizung	27.07.2027	5t	02.08.2027		
19	Estrich	02.08.2027	10t	13.08.2027		
20	Start Fußbodenheizung	16.08.2027	6t	23.08.2027		
21	Maler	09.08.2027	20t	03.09.2027		
22	Fliesen	23.08.2027	15t	10.09.2027		
23	Heizung-San. fein	13.09.2027	10t	24.09.2027		
24	Elektro, fein	13.09.2027	10t	24.09.2027		
25	Bodenbelag	20.09.2027	15t	08.10.2027		
26	Kellertrennwände	11.10.2027	5t	15.10.2027		
27	Natursteinarbeiten TRH	06.09.2027	15t	15.10.2027		
	Innentüren					
28	Schließanlage	12.10.2027	5t	18.10.2027		
29	Rauchwarnmelder	12.10.2027	5t	18.10.2027		
30	Endreinigung	19.10.2027	10t	01.11.2027		
31	**Außenanlagen**	**27.09.2027**	**82t**	**18.01.2028**		
32	Plasterarbeiten	27.09.2027	50t	03.12.2027		
33	Pflanzarbeiten	15.11.2027	10t	26.11.2027		
34	Beschilderung	17.01.2028	2t	18.01.2028
