KiGa 09; BT A

Hauptplan

Manuel Maier
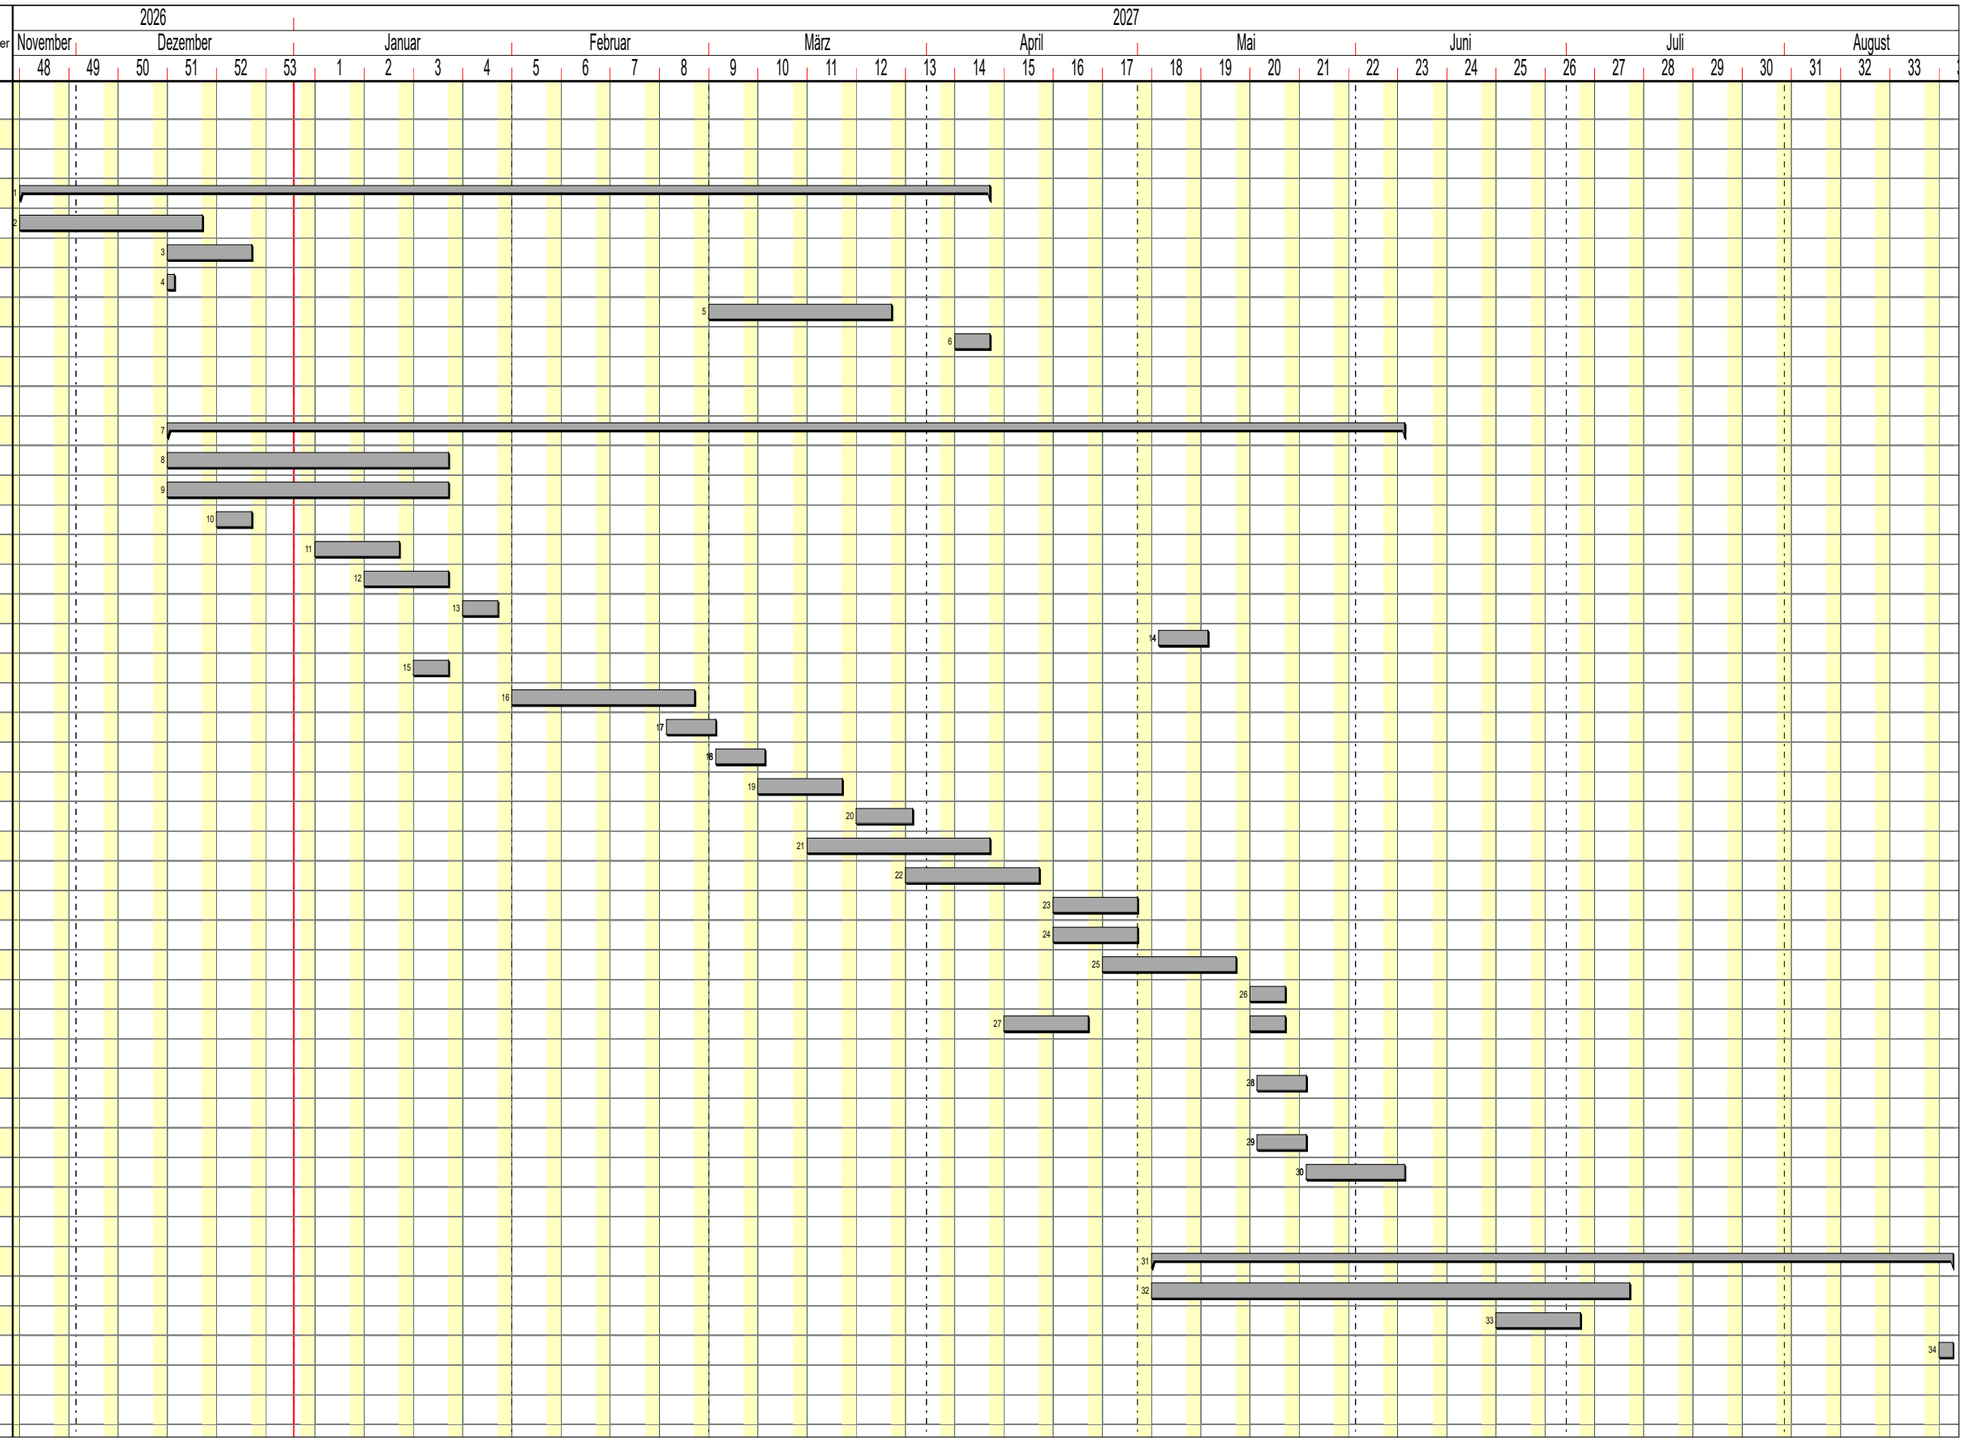
Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende	Vorgänger	Nachfolger
1	**Gebäudehülle**	**23.11.2026**	**100t**	**09.04.2027**		
2	Verblendmauerwerk	23.11.2026	20t	18.12.2026		
3	Kunststofffenster	14.12.2026	10t	25.12.2026		
4	Alu-Elemente	14.12.2026	1t	14.12.2026		
5	WDVS	01.03.2027	20t	26.03.2027		
6	Balkone	05.04.2027	5t	09.04.2027		
7	**Innenausbau**	**14.12.2026**	**126t**	**07.06.2027**		
8	Heizung/Sanitär grob	14.12.2026	30t	22.01.2027		
9	Elektro grob	14.12.2026	30t	22.01.2027		
10	Montage Zargen	21.12.2026	5t	25.12.2026		
11	Trockenbau Unterkonstruktion	04.01.2027	10t	15.01.2027		
12	Montage Kunststofffenster	11.01.2027	10t	22.01.2027		
13	Fensterbänke	25.01.2027	5t	29.01.2027		
14	Montage Treppengeländer	04.05.2027	5t	10.05.2027		
15	Trockenbau Beplankung	18.01.2027	5t	22.01.2027		
16	Innenputz	01.02.2027	20t	26.02.2027		
17	Dämmung Estrich	23.02.2027	5t	01.03.2027		
18	Verrohrung Fußbodenheizung	02.03.2027	5t	08.03.2027		
19	Estrich	08.03.2027	10t	19.03.2027		
20	Start Fußbodenheizung	22.03.2027	6t	29.03.2027		
21	Maler	15.03.2027	20t	09.04.2027		
22	Fliesen	29.03.2027	15t	16.04.2027		
23	Heizung-San. fein	19.04.2027	10t	30.04.2027		
24	Elektro, fein	19.04.2027	10t	30.04.2027		
25	Bodenbelag	26.04.2027	15t	14.05.2027		
26	Kellertrennwände	17.05.2027	5t	21.05.2027		
27	Natursteinarbeiten TRH	12.04.2027	15t	21.05.2027		
	Innentüren					
28	Schließanlage	18.05.2027	5t	24.05.2027		
29	Rauchwarnmelder	18.05.2027	5t	24.05.2027		
30	Endreinigung	25.05.2027	10t	07.06.2027		
31	**Außenanlagen**	**03.05.2027**	**82t**	**24.08.2027**		
32	Plasterarbeiten	03.05.2027	50t	09.07.2027		
33	Pflanzarbeiten	21.06.2027	10t	02.07.2027		
34	Beschilderung	23.08.2027	2t	24.08.2027
