KiGa 09; BT B

Hauptplan

Manuel Maier
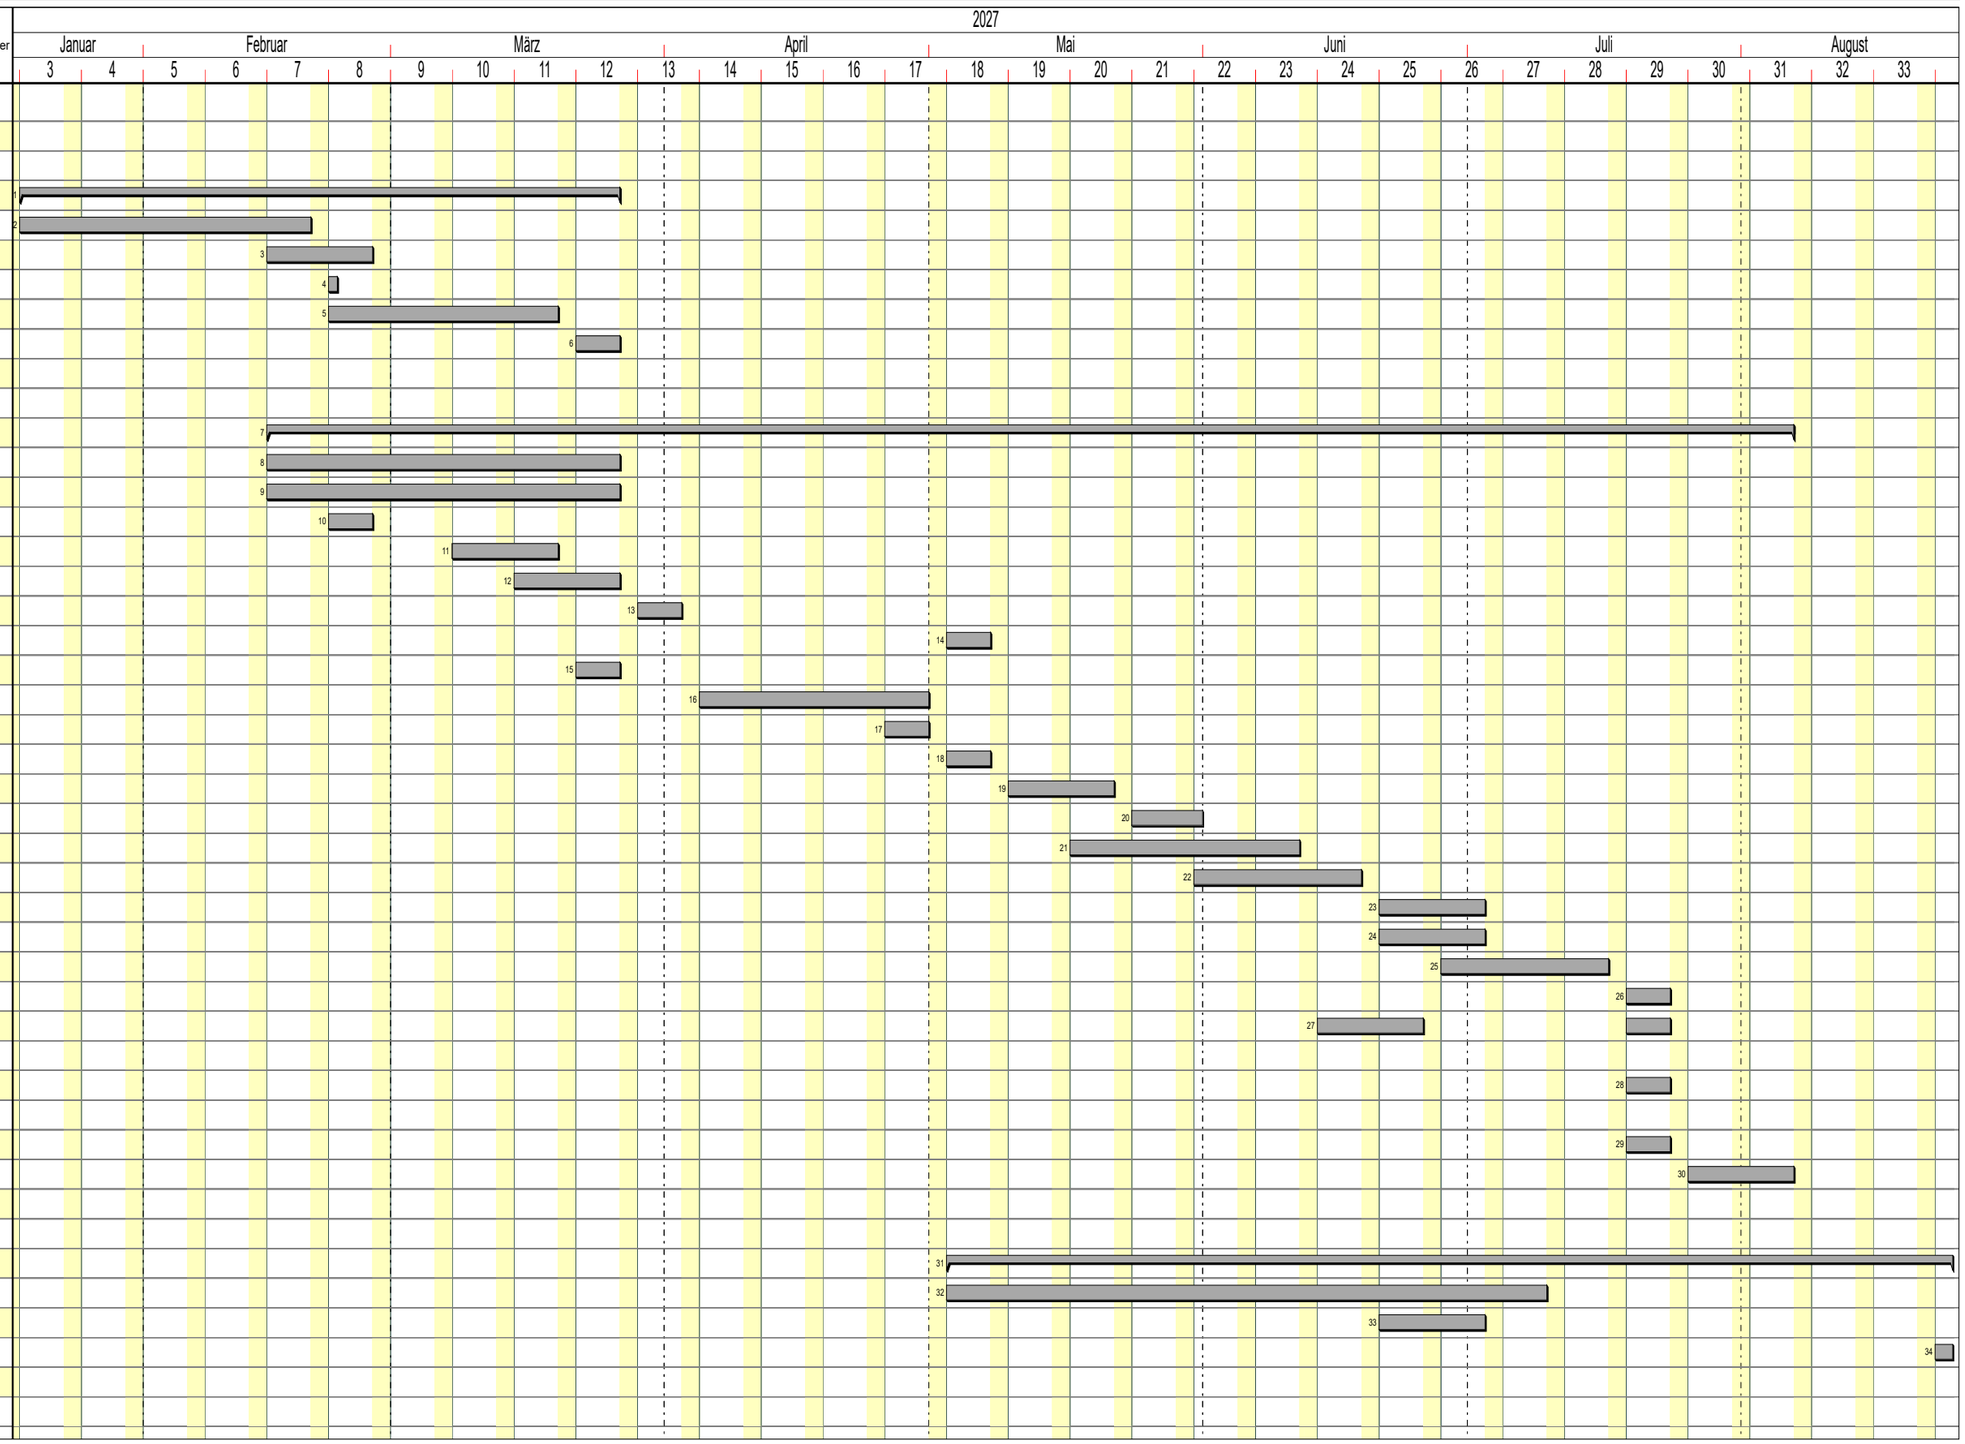
Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende	Vorgänger	Nachfolger
1	**Gebäudehülle**	**18.01.2027**	**50t**	**26.03.2027**		
2	Verblendmauerwerk	18.01.2027	25t	19.02.2027		
3	Kunststofffenster	15.02.2027	10t	26.02.2027		
4	Alu-Elemente	22.02.2027	1t	22.02.2027		
5	WDVS	22.02.2027	20t	19.03.2027		
6	Balkone	22.03.2027	5t	26.03.2027		
7	**Innenausbau**	**15.02.2027**	**125t**	**06.08.2027**		
8	Heizung/Sanitär grob	15.02.2027	30t	26.03.2027		
9	Elektro grob	15.02.2027	30t	26.03.2027		
10	Montage Zargen	22.02.2027	5t	26.02.2027		
11	Trockenbau Unterkonstruktion	08.03.2027	10t	19.03.2027		
12	Montage Kunststofffenster	15.03.2027	10t	26.03.2027		
13	Fensterbänke	29.03.2027	5t	02.04.2027		
14	Montage Treppengeländer	03.05.2027	5t	07.05.2027		
15	Trockenbau Beplankung	22.03.2027	5t	26.03.2027		
16	Innenputz	05.04.2027	20t	30.04.2027		
17	Dämmung Estrich	26.04.2027	5t	30.04.2027		
18	Verrohrung Fußbodenheizung	03.05.2027	5t	07.05.2027		
19	Estrich	10.05.2027	10t	21.05.2027		
20	Start Fußbodenheizung	24.05.2027	6t	31.05.2027		
21	Maler	17.05.2027	20t	11.06.2027		
22	Fliesen	31.05.2027	15t	18.06.2027		
23	Heizung-San. fein	21.06.2027	10t	02.07.2027		
24	Elektro, fein	21.06.2027	10t	02.07.2027		
25	Bodenbelag	28.06.2027	15t	16.07.2027		
26	Kellertrennwände	19.07.2027	5t	23.07.2027		
27	Natursteinarbeiten TRH	14.06.2027	15t	23.07.2027		
	Innentüren					
28	Schließanlage	19.07.2027	5t	23.07.2027		
29	Rauchwarnmelder	19.07.2027	5t	23.07.2027		
30	Endreinigung	26.07.2027	10t	06.08.2027		
31	**Außenanlagen**	**03.05.2027**	**82t**	**24.08.2027**		
32	Plasterarbeiten	03.05.2027	50t	09.07.2027		
33	Pflanzarbeiten	21.06.2027	10t	02.07.2027		
34	Beschilderung	23.08.2027	2t	24.08.2027
