KiGa 09; BT C

Hauptplan

Manuel Maier
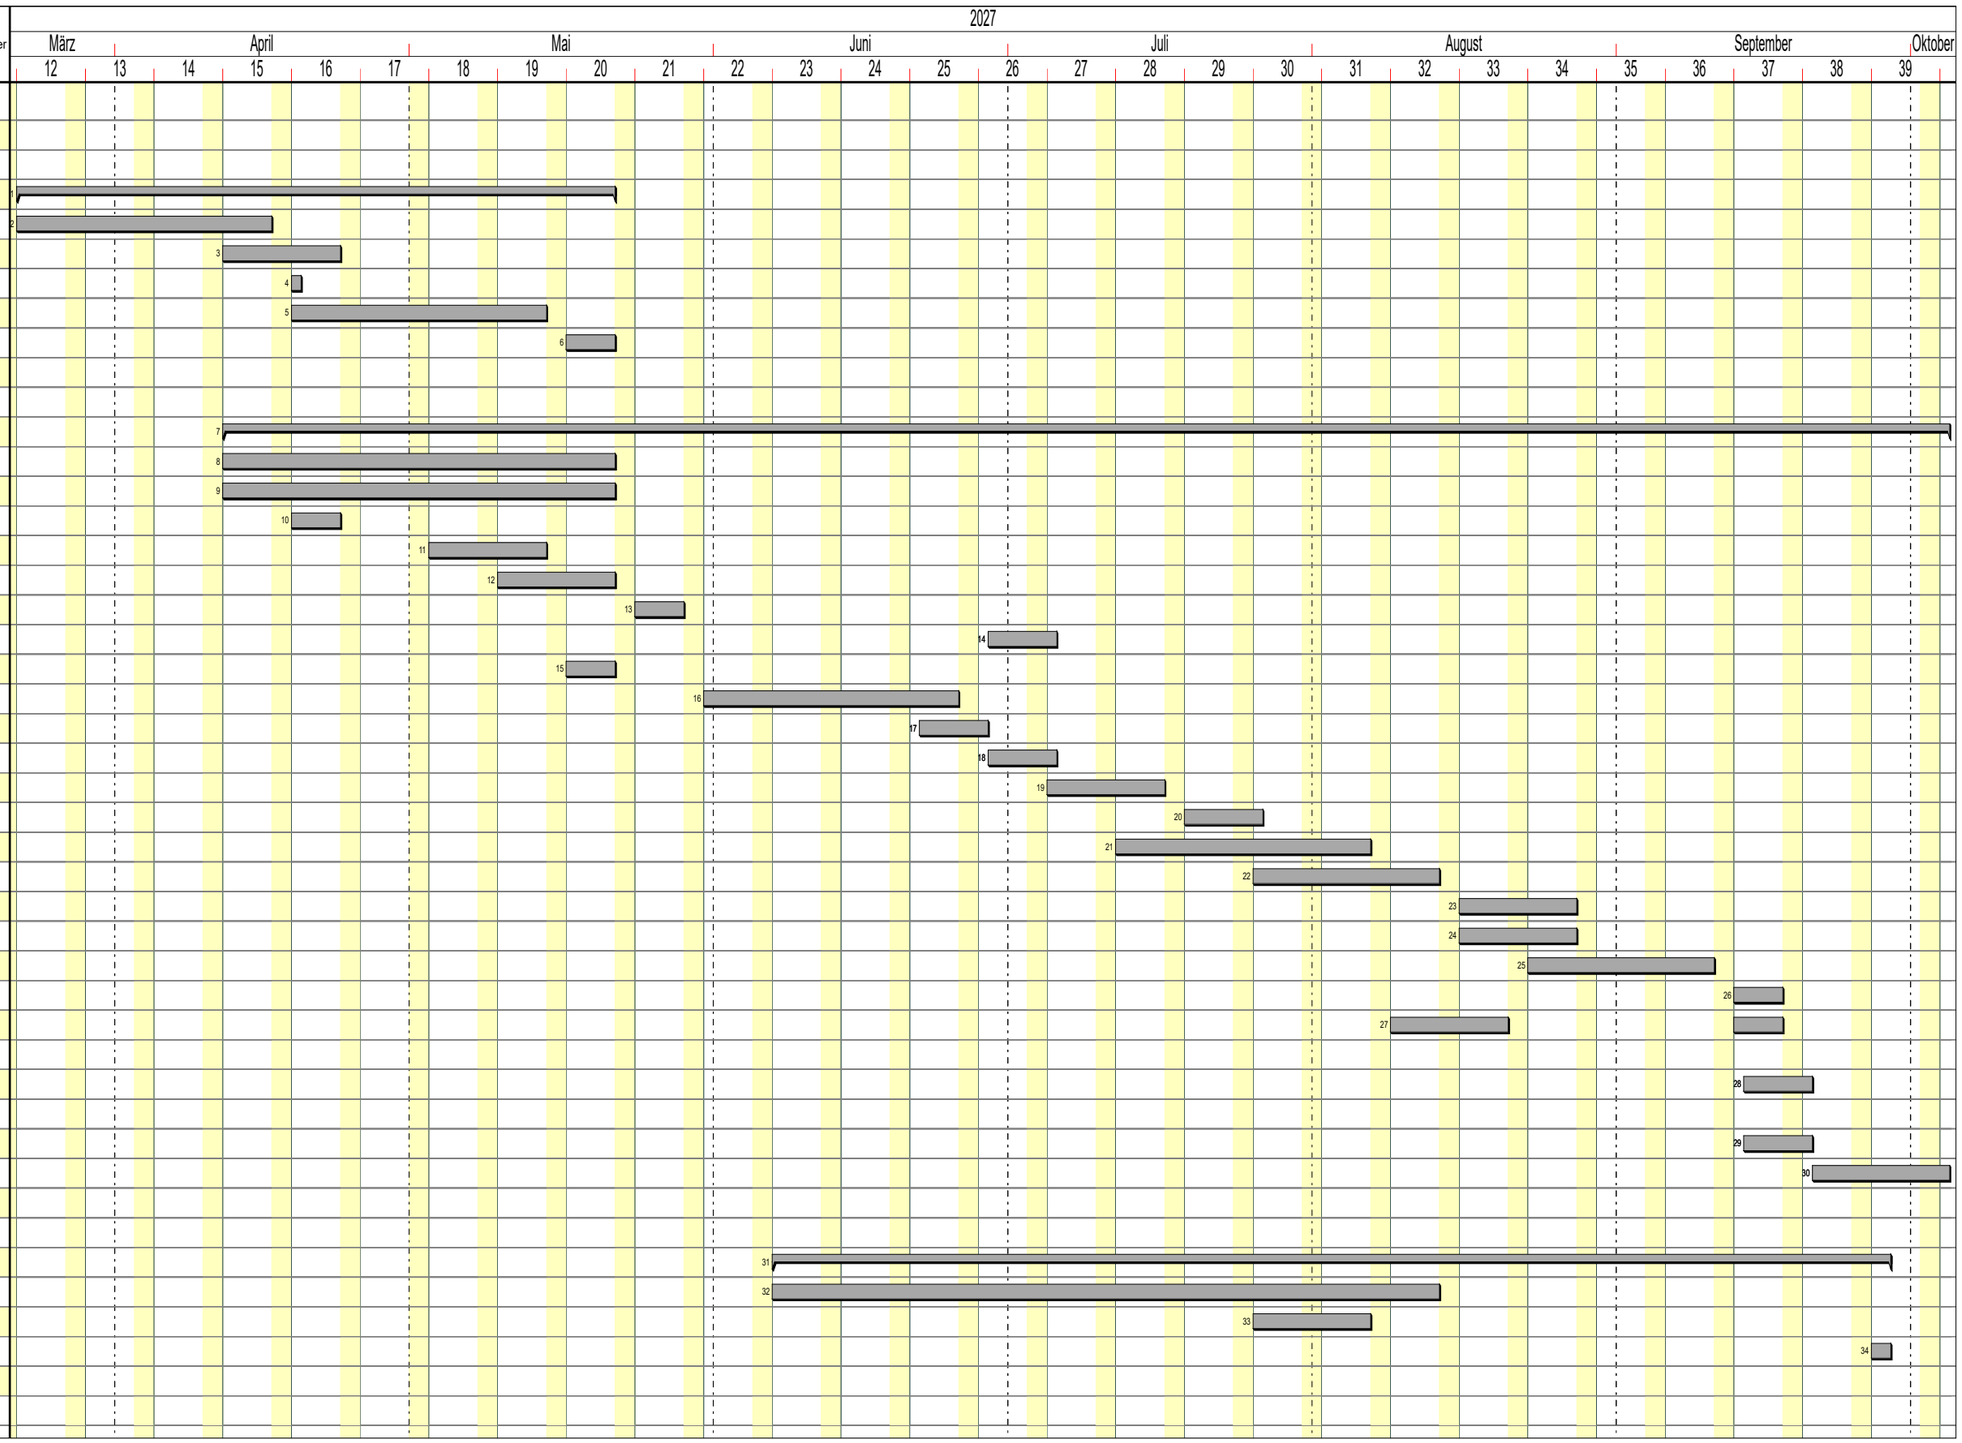
Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende	Vorgänger	Nachfolger
1	**Gebäudehülle**	**22.03.2027**	**45t**	**21.05.2027**		
2	Verblendmauerwerk	22.03.2027	20t	16.04.2027		
3	Kunststofffenster	12.04.2027	10t	23.04.2027		
4	Alu-Elemente	19.04.2027	1t	19.04.2027		
5	WDVS	19.04.2027	20t	14.05.2027		
6	Balkone	17.05.2027	5t	21.05.2027		
7	**Innenausbau**	**12.04.2027**	**126t**	**04.10.2027**		
8	Heizung/Sanitär grob	12.04.2027	30t	21.05.2027		
9	Elektro grob	12.04.2027	30t	21.05.2027		
10	Montage Zargen	19.04.2027	5t	23.04.2027		
11	Trockenbau Unterkonstruktion	03.05.2027	10t	14.05.2027		
12	Montage Kunststofffenster	10.05.2027	10t	21.05.2027		
13	Fensterbänke	24.05.2027	5t	28.05.2027		
14	Montage Treppengeländer	29.06.2027	5t	05.07.2027		
15	Trockenbau Beplankung	17.05.2027	5t	21.05.2027		
16	Innenputz	31.05.2027	20t	25.06.2027		
17	Dämmung Estrich	22.06.2027	5t	28.06.2027		
18	Verrohrung Fußbodenheizung	29.06.2027	5t	05.07.2027		
19	Estrich	05.07.2027	10t	16.07.2027		
20	Start Fußbodenheizung	19.07.2027	6t	26.07.2027		
21	Maler	12.07.2027	20t	06.08.2027		
22	Fliesen	26.07.2027	15t	13.08.2027		
23	Heizung-San. fein	16.08.2027	10t	27.08.2027		
24	Elektro, fein	16.08.2027	10t	27.08.2027		
25	Bodenbelag	23.08.2027	15t	10.09.2027		
26	Kellertrennwände	13.09.2027	5t	17.09.2027		
27	Natursteinarbeiten TRH	09.08.2027	15t	17.09.2027		
	Innentüren					
28	Schließanlage	14.09.2027	5t	20.09.2027		
29	Rauchwarnmelder	14.09.2027	5t	20.09.2027		
30	Endreinigung	21.09.2027	10t	04.10.2027		
31	**Außenanlagen**	**07.06.2027**	**82t**	**28.09.2027**		
32	Plasterarbeiten	07.06.2027	50t	13.08.2027		
33	Pflanzarbeiten	26.07.2027	10t	06.08.2027		
34	Beschilderung	27.09.2027	2t	28.09.2027
