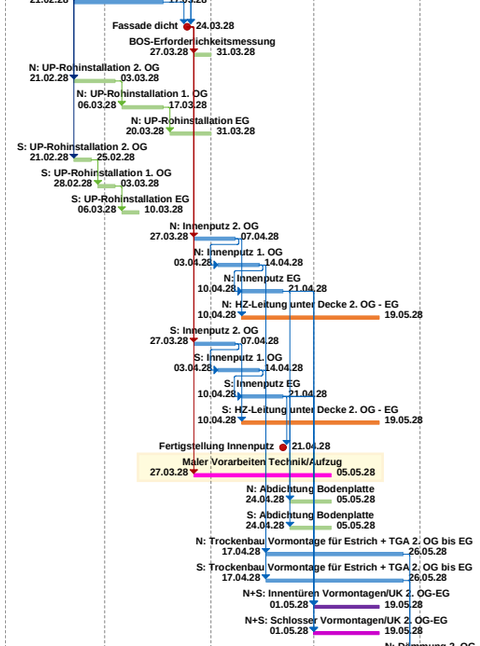91	Fassade dicht	0 Wochen	Fre 24.03.28	Fre 24.03.28
92	BOS-Erforderlichkeitsmessung	5 Tage	Mon 27.03.28	Fre 31.03.28
93	N: UP-Rohinstallation 2. OG	10 Tage	Mon 21.02.28	Fre 03.03.28
94	N: UP-Rohinstallation 1. OG	10 Tage	Mon 06.03.28	Fre 17.03.28
95	N: UP-Rohinstallation EG	10 Tage	Mon 20.03.28	Fre 31.03.28
96	S: UP-Rohinstallation 2. OG	5 Tage	Mon 21.02.28	Fre 25.02.28
97	S: UP-Rohinstallation 1. OG	5 Tage	Mon 28.02.28	Fre 03.03.28
98	S: UP-Rohinstallation EG	5 Tage	Mon 06.03.28	Fre 10.03.28
99	N: Innenputz 2. OG	10 Tage	Mon 27.03.28	Fre 07.04.28
100	N: Innenputz 1. OG	10 Tage	Mon 03.04.28	Fre 14.04.28
101	N: Innenputz EG	10 Tage	Mon 10.04.28	Fre 21.04.28
102	N: HZ-Leitung unter Decke 2. OG - EG	30 Tage	Mon 10.04.28	Fre 19.05.28
103	S: Innenputz 2. OG	10 Tage	Mon 27.03.28	Fre 07.04.28
104	S: Innenputz 1. OG	10 Tage	Mon 03.04.28	Fre 14.04.28
105	S: Innenputz EG	10 Tage	Mon 10.04.28	Fre 21.04.28
106	S: HZ-Leitung unter Decke 2. OG - EG	30 Tage	Mon 10.04.28	Fre 19.05.28
107	Fertigstellung Innenputz	0 Wochen	Fre 21.04.28	Fre 21.04.28
108	Maler Vorarbeiten Technik/Aufzug	30 Tage	Mon 27.03.28	Fre 05.05.28
109	N: Abdichtung Bodenplatte	10 Tage	Mon 24.04.28	Fre 05.05.28
110	S: Abdichtung Bodenplatte	10 Tage	Mon 24.04.28	Fre 05.05.28
111	N: Trockenbau Vormontage für Estrich + TGA 2. OG bis EG	30 Tage	Mon 17.04.28	Fre 26.05.28
112	S: Trockenbau Vormontage für Estrich + TGA 2. OG bis EG	30 Tage	Mon 17.04.28	Fre 26.05.28
113	N+S: Innentüren Vormontagen/UK 2. OG-EG	15 Tage	Mon 01.05.28	Fre 19.05.28
114	N+S: Schlosser Vormontagen/UK 2. OG-EG	15 Tage	Mon 01.05.28	Fre 19.05.28
115	N: Dämmung 2. OG	10 Tage	Mon 29.05.28	Fre 09.06.28
