01 - Forstbetriebshof
- Bauzeitenplan vom 07.05.2026

COSOBA
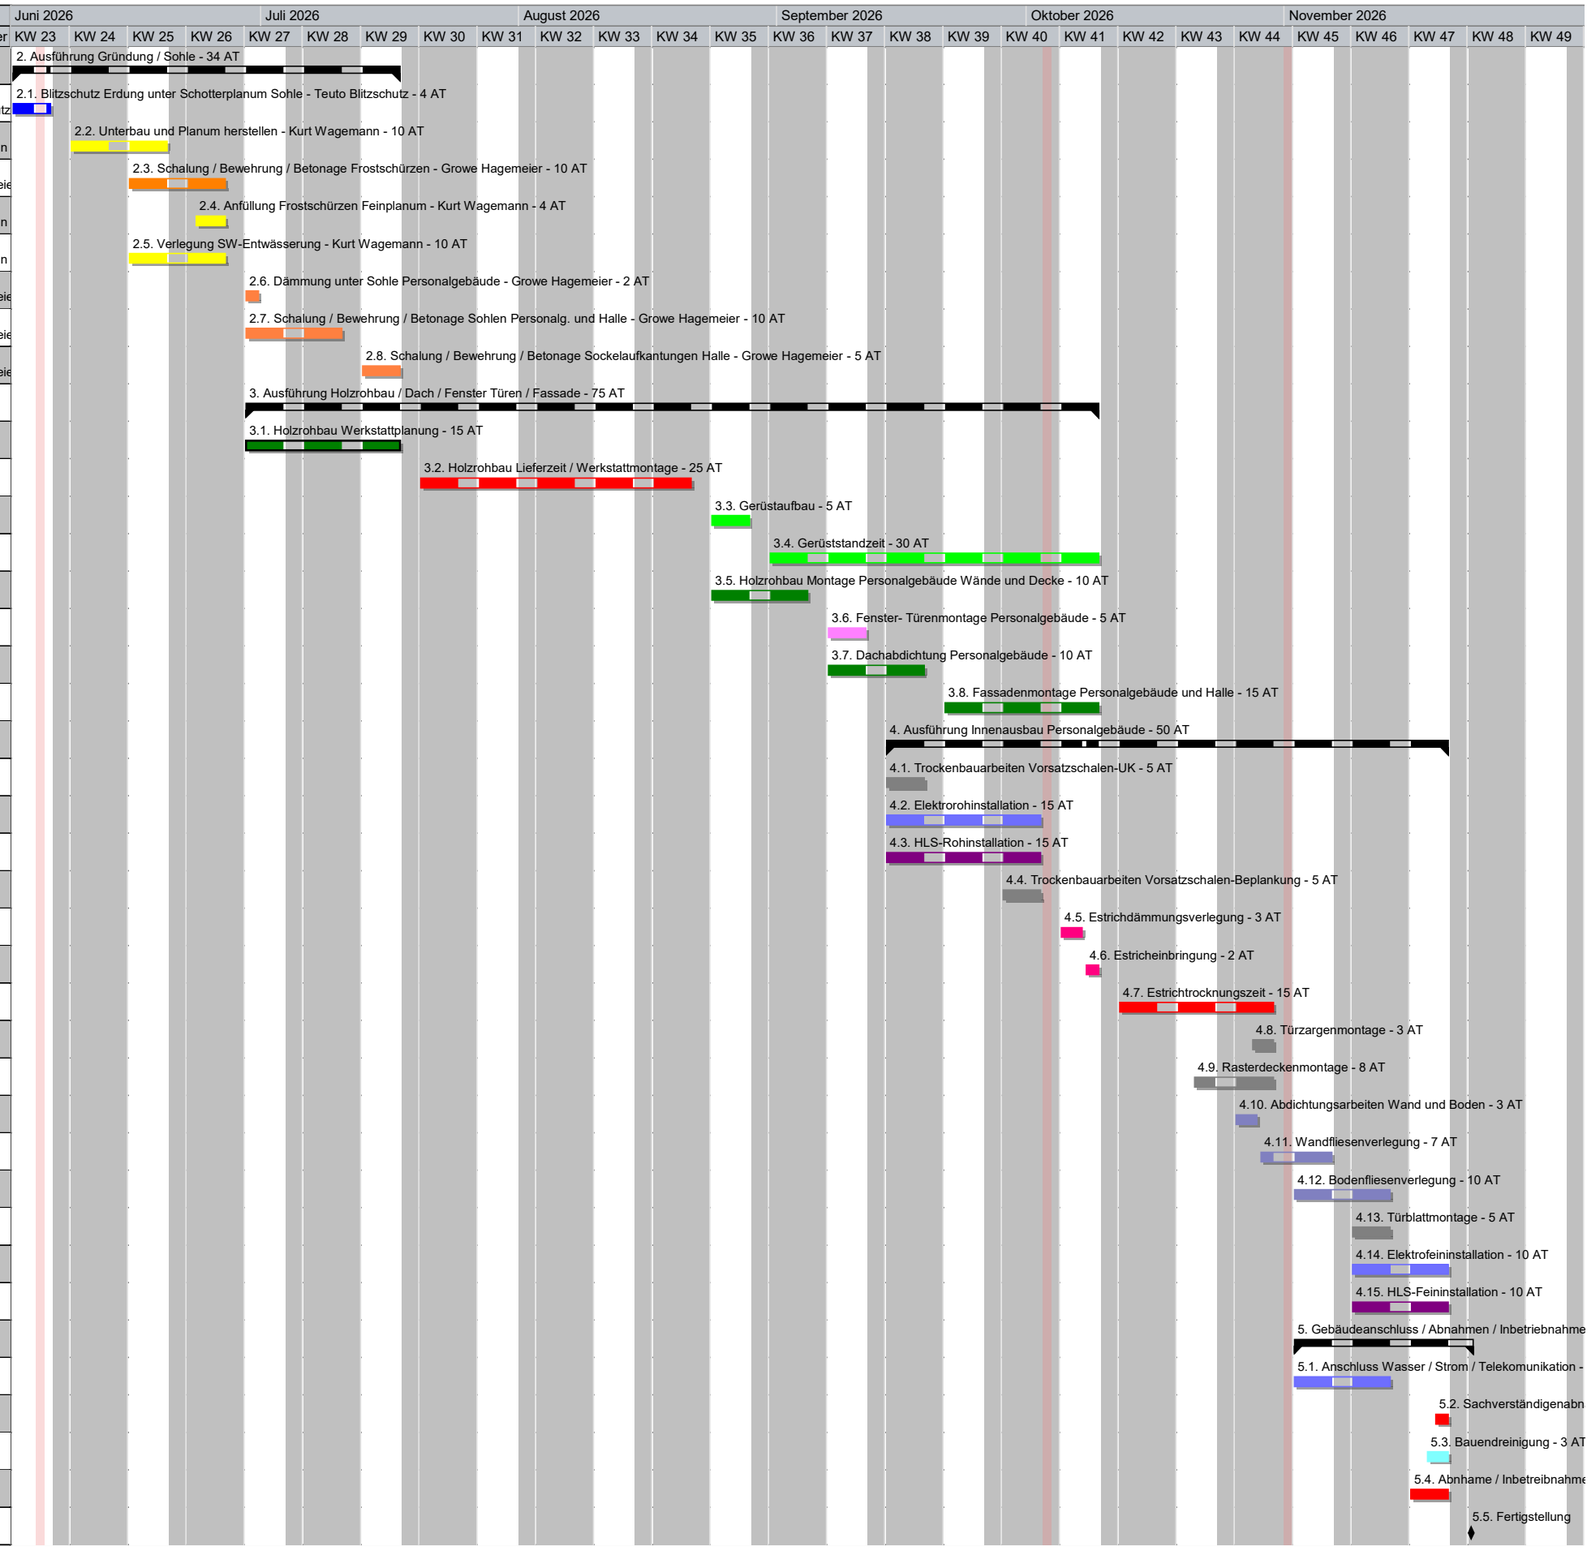
Phase/Vorgang/Meilenstein	von	bis	Dauer	Auftragnehmer
2. Ausführung Gründung / Sohle	01.06.2026	17.07.2026	34	
2.1. Blitzschutz Erdung unter Schotterplanum Sohle	01.06.2026	05.06.2026	4	Teuto Blitzschutz
2.2. Unterbau und Planum herstellen	08.06.2026	19.06.2026	10	Kurt Wagemann
2.3. Schalung / Bewehrung / Betonage Frostschürzen	15.06.2026	26.06.2026	10	Growe Hagemeie
2.4. Anfüllung Frostschürzen Feinplanum	23.06.2026	26.06.2026	4	Kurt Wagemann
2.5. Verlegung SW-Entwässerung	15.06.2026	26.06.2026	10	Kurt Wagemann
2.6. Dämmung unter Sohle Personalgebäude	29.06.2026	30.06.2026	2	Growe Hagemeie
2.7. Schalung / Bewehrung / Betonage Sohlen Perso	29.06.2026	10.07.2026	10	Growe Hagemeie
2.8. Schalung / Bewehrung / Betonage Sockelaufkant	13.07.2026	17.07.2026	5	Growe Hagemeie
3. Ausführung Holzrohbau / Dach / Fenster Türen / I	29.06.2026	09.10.2026	75	
3.1. Holzrohbau Werkstattplanung	29.06.2026	17.07.2026	15	
3.2. Holzrohbau Lieferzeit / Werkstattmontage	20.07.2026	21.08.2026	25	
3.3. Gerüstaufbau	24.08.2026	28.08.2026	5	
3.4. Geräuststandzeit	31.08.2026	09.10.2026	30	
3.5. Holzrohbau Montage Personalgebäude Wände u	24.08.2026	04.09.2026	10	
3.6. Fenster- Türenmontage Personalgebäude	07.09.2026	11.09.2026	5	
3.7. Dachabdichtung Personalgebäude	07.09.2026	18.09.2026	10	
3.8. Fassadenmontage Personalgebäude und Halle	21.09.2026	09.10.2026	15	
4. Ausführung Innenausbau Personalgebäude	14.09.2026	20.11.2026	50	
4.1. Trockenbauarbeiten Vorsatzschalen-UK	14.09.2026	18.09.2026	5	
4.2. Elektrorohinstallation	14.09.2026	02.10.2026	15	
4.3. HLS-Rohinstallation	14.09.2026	02.10.2026	15	
4.4. Trockenbauarbeiten Vorsatzschalen-Beplankung	28.09.2026	02.10.2026	5	
4.5. Estrichdämmungsverlegung	05.10.2026	07.10.2026	3	
4.6. Estricheinbringung	08.10.2026	09.10.2026	2	
4.7. Estrichtrocknungszeit	12.10.2026	30.10.2026	15	
4.8. Türzargenmontage	28.10.2026	30.10.2026	3	
4.9. Rasterdeckenmontage	21.10.2026	30.10.2026	8	
4.10. Abdichtungsarbeiten Wand und Boden	26.10.2026	28.10.2026	3	
4.11. Wandfliesenverlegung	29.10.2026	06.11.2026	7	
4.12. Bodenfliesenverlegung	02.11.2026	13.11.2026	10	
4.13. Türblattmontage	09.11.2026	13.11.2026	5	
4.14. Elektrofeininstallation	09.11.2026	20.11.2026	10	
4.15. HLS-Feininstallation	09.11.2026	20.11.2026	10	
5. Gebäudeanschluss / Abnahmen / Inbetriebnahme	02.11.2026	23.11.2026	16	
5.1. Anschluss Wasser / Strom / Telekomunikation	02.11.2026	13.11.2026	10	
5.2. Sachverständigenabnahmen	19.11.2026	20.11.2026	2	
5.3. Bauendreinigung	18.11.2026	20.11.2026	3	
5.4. Abnhame / Inbetreibnahme	16.11.2026	20.11.2026	5	
5.5. Fertigstellung	23.11.2026	23.11.2026	0
