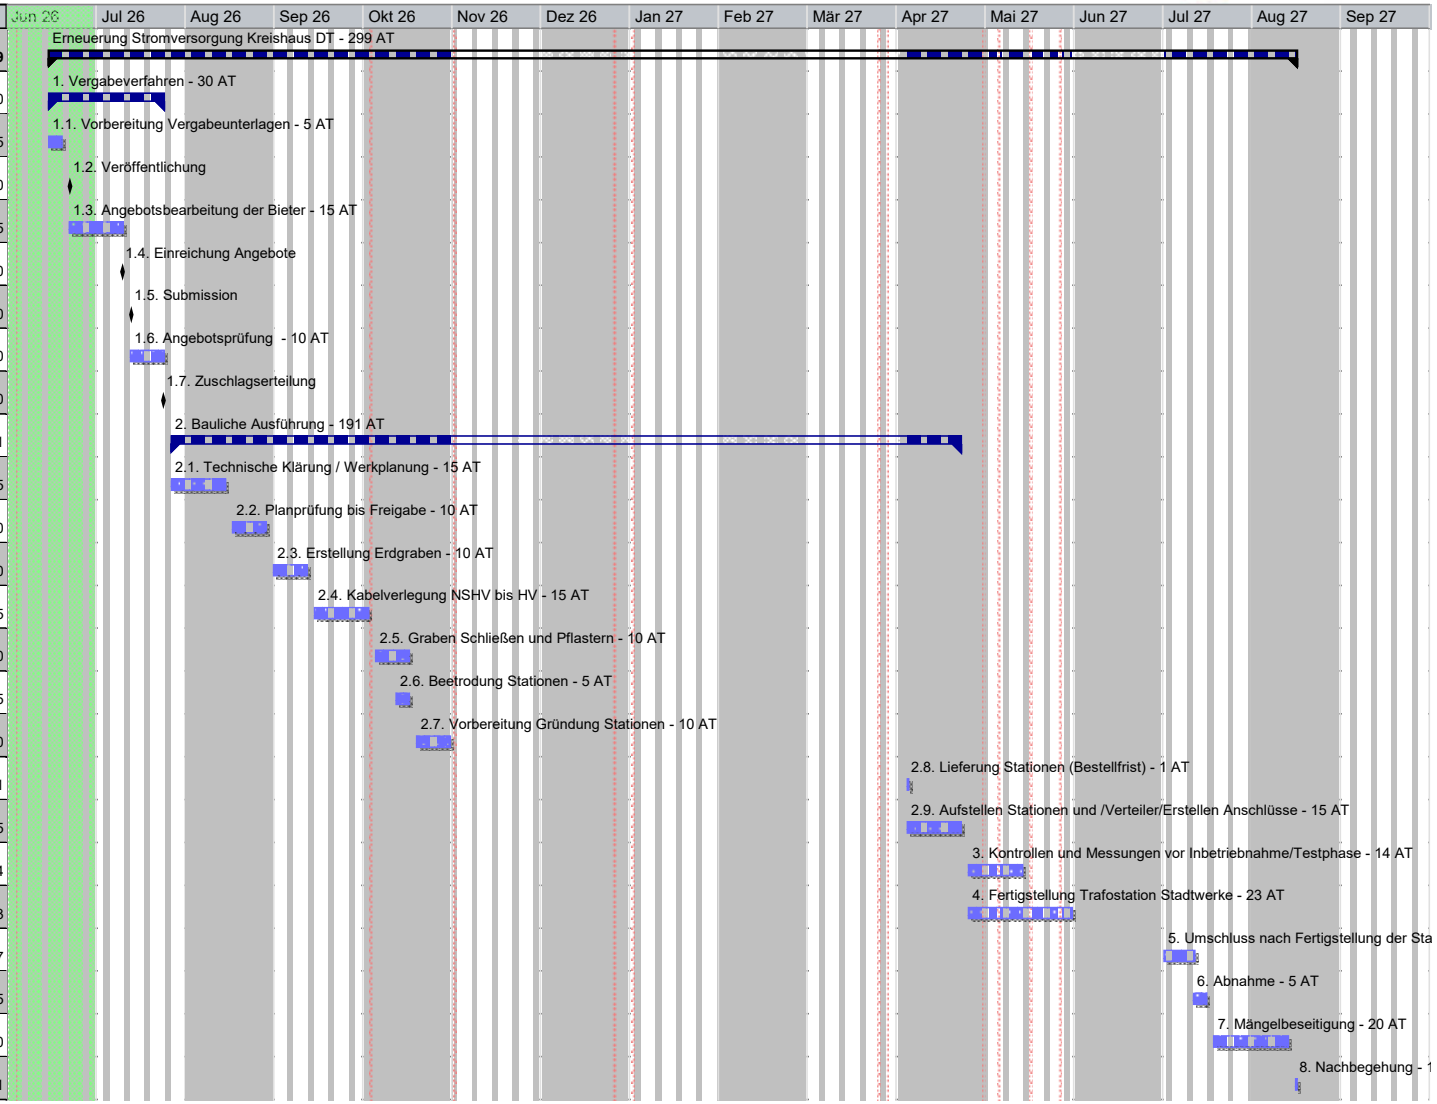Phase/Vorgang/Meilenstein	von	bis	Dauer
Erneuerung Stromversorgung Kreishaus DT	**15.06.2026**	**16.08.2027**	**299**
1. Vergabeverfahren	15.06.2026	24.07.2026	30
1.1. Vorbereitung Vergabeunterlagen	15.06.2026	19.06.2026	5
1.2. Veröffentlichung	22.06.2026	22.06.2026	0
1.3. Angebotsbearbeitung der Bieter	22.06.2026	10.07.2026	15
1.4. Einreichung Angebote	10.07.2026	10.07.2026	0
1.5. Submission	13.07.2026	13.07.2026	0
1.6. Angebotsprüfung	13.07.2026	24.07.2026	10
1.7. Zuschlagserteilung	24.07.2026	24.07.2026	0
2. Bauliche Ausführung	27.07.2026	23.04.2027	191
2.1. Technische Klärung / Werkplanung	27.07.2026	14.08.2026	15
2.2. Planprüfung bis Freigabe	17.08.2026	28.08.2026	10
2.3. Erstellung Erdgraben	31.08.2026	11.09.2026	10
2.4. Kabelverlegung NSHV bis HV	14.09.2026	02.10.2026	15
2.5. Graben Schließen und Pflastern	05.10.2026	16.10.2026	10
2.6. Beetrodung Stationen	12.10.2026	16.10.2026	5
2.7. Vorbereitung Gründung Stationen	19.10.2026	30.10.2026	10
2.8. Lieferung Stationen (Bestellfrist)	05.04.2027	05.04.2027	1
2.9. Aufstellen Stationen und /Verteiler/Erstellen Ans	05.04.2027	23.04.2027	15
3. Kontrollen und Messungen vor Inbetriebnahme/Tes	26.04.2027	14.05.2027	14
4. Fertigstellung Trafostation Stadtwerke	26.04.2027	31.05.2027	23
5. Umschluss nach Fertigstellung der Stadtwerke	02.07.2027	12.07.2027	7
6. Abnahme	12.07.2027	16.07.2027	5
7. Mängelbeseitigung	19.07.2027	13.08.2027	20
8. Nachbegehung	16.08.2027	16.08.2027	1
