
123061 H21_Wiederaufbauplan der Stadt Hemer

Steuerungsterminplan

Stand: 19.10.2026

Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende	Vorgänger	Nachfolger
1	**BW 4-01 Erneuerung Brücke "Unter dem Naumberg"**	**11.08.2026**	**623t**	**24.01.2029**		
2	**Vergabe**	**11.08.2026**	**76t**	**24.11.2026**		
3	**LPH 1**	**25.11.2026**	**31t**	**08.01.2027**		
4	Grundlagenermittlung	25.11.2026	10t	08.12.2026	n.s.	5
5	Abgabe Grundlagenermittlung	09.12.2026	1t	09.12.2026	4	6
6	Prüfung CON	10.12.2026	10t	23.12.2026	5	7
7	Freigabe Bauherr	24.12.2026	10t	08.01.2027	6	9
8	**LPH 2**	**11.01.2027**	**80t**	**04.05.2027**		
9	Erstellen Vorplanung	11.01.2027	59t	05.04.2027	7	10
10	Abgabe Vorplanung	06.04.2027	1t	06.04.2027	9	11
11	Prüfung CON	07.04.2027	10t	20.04.2027	10	12
12	Freigabe Bauherr	21.04.2027	10t	04.05.2027	11	14
13	**LPH 3**	**05.05.2027**	**80t**	**27.08.2027**		
14	Erstellen Entwurfsplanung	05.05.2027	59t	29.07.2027	12	15
15	Abgabe Entwurfsplanung	30.07.2027	1t	30.07.2027	14	16
16	Prüfung CON	02.08.2027	10t	13.08.2027	15	17
17	Freigabe Bauherr	16.08.2027	10t	27.08.2027	16	19
18	**LPH 4**	**30.08.2027**	**115t**	**07.02.2028**		
19	Ämter Vorabstimmungen der Fachplanungen	30.08.2027	14t	16.09.2027	17	20
20	Zusammenstellung aller Unterlagen für die Baueingabe	17.09.2027	14t	06.10.2027	19	21
21	Einreichung Bauantrag	07.10.2027	1t	07.10.2027	20	22
22	Genehmigungsverfahren	08.10.2027	85t	04.02.2028	21	23
23	Vorlage der Baugenehmigung	07.02.2028	1t	07.02.2028	22	25
24	**LPH 5**	**08.02.2028**	**67t**	**15.05.2028**		
25	Planung	08.02.2028	46t	11.04.2028	23	26
26	Abgabe LPH5	12.04.2028	1t	12.04.2028	25	27
27	Prüfen CON	13.04.2028	10t	28.04.2028	26	28
28	Freigabe Bauherr	02.05.2028	10t	15.05.2028	27	30; 31
29	**LPH 6**	**16.05.2028**	**46t**	**21.07.2028**		
30	Erstellen des Vergabeterminplans	16.05.2028	15t	07.06.2028	28	32
31	Mengenermittlung	16.05.2028	16t	08.06.2028	28	32
32	Erstellen LVs	09.06.2028	10t	23.06.2028	30; 31	33
33	Prüfen CON	26.06.2028	10t	07.07.2028	32	34
34	Freigabe Bauherr	10.07.2028	10t	21.07.2028	33	36
35	**LPH 7**	**24.07.2028**	**27t**	**29.08.2028**		
36	Mitwirken bei der Vergabe	24.07.2028	26t	28.08.2028	34	37
37	Vergabe	29.08.2028	1t	29.08.2028	36	39
38	**LPH 8**	**30.08.2028**	**101t**	**24.01.2029**		
39	Ausführung	30.08.2028	100t	23.01.2029	37	40
40	Abnahme	24.01.2029	1t	24.01.2029	39	

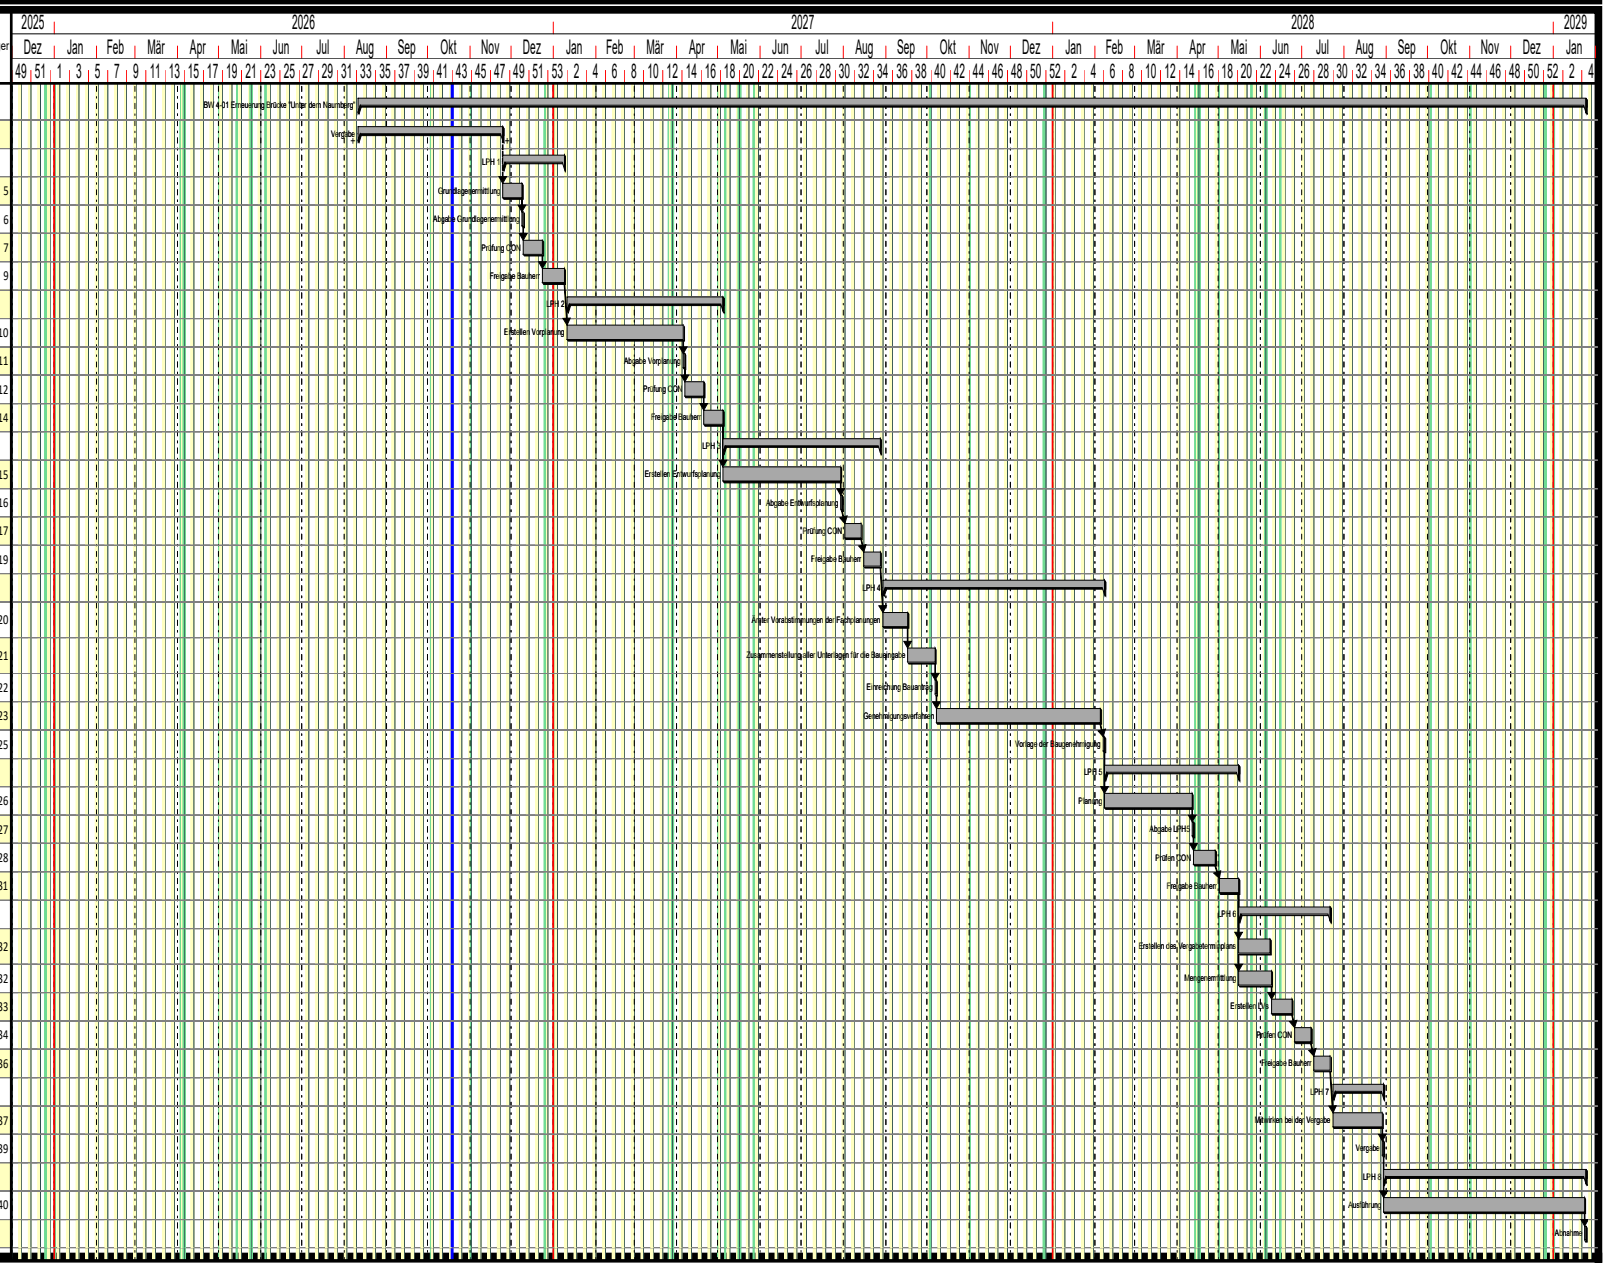

Asta Powerproject
