Vorläufiger Umzugsablaufplan Stadt Ahlen, Planstand 23.02.2026

monatsgenaue Zeichnung | Zeichnungsdatum
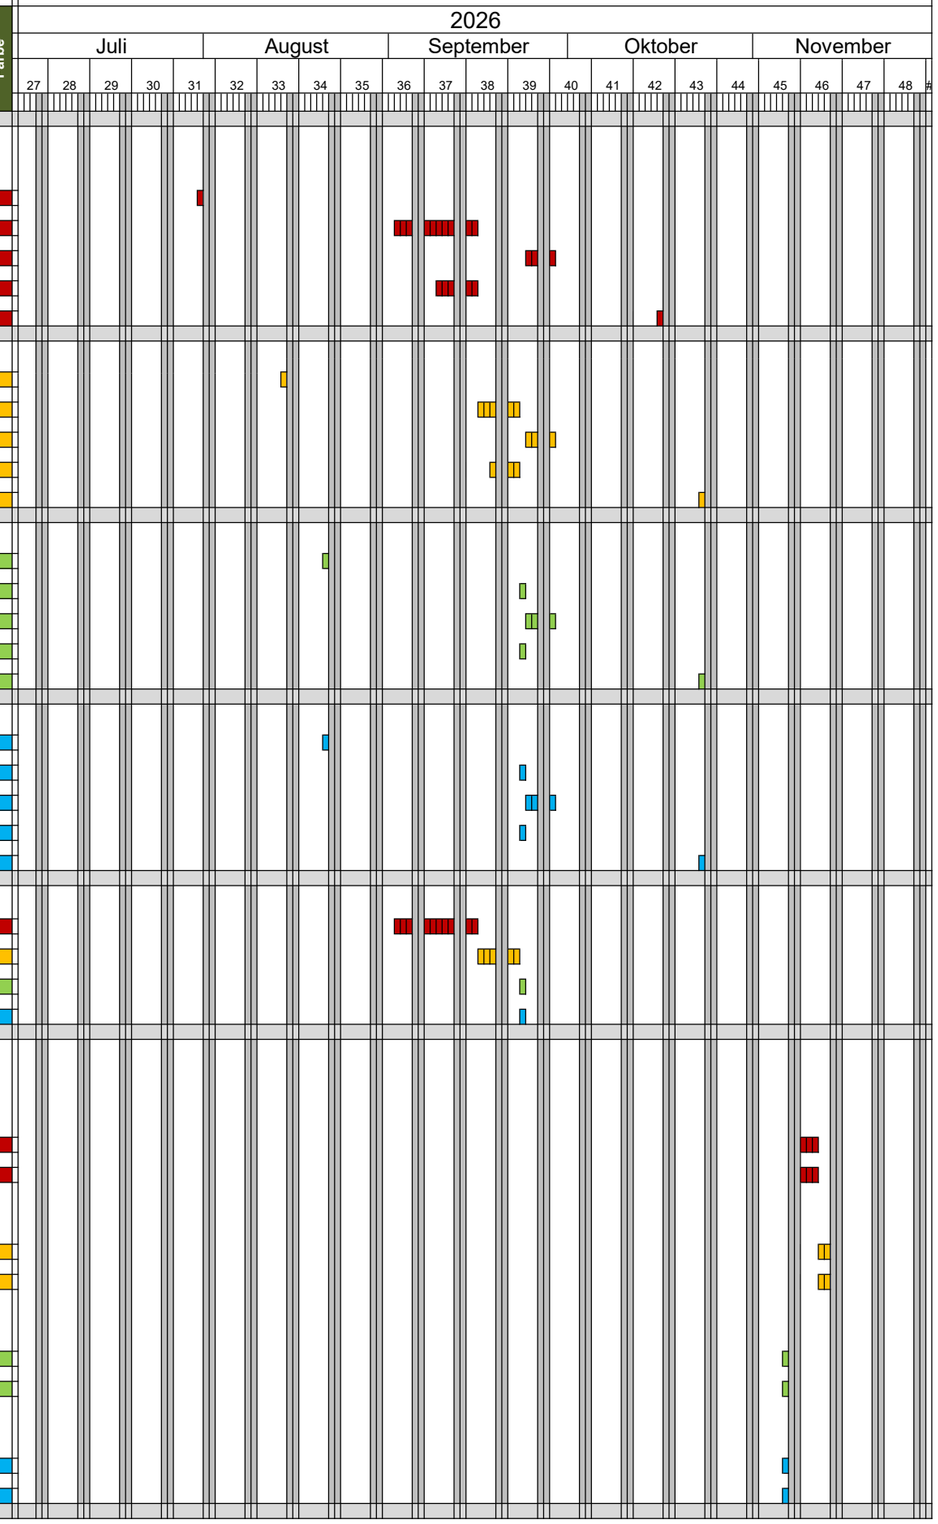
LFN	Vorgang	Startdatum	Enddatum	Werktage	Progress	Farbe
		Lösung	Lösung	Lösung	Lösung	
	Pos. 1: Umzugsdurchführung					
	Pos. 1.1: Umzugsdurchführung Bestandsliegenschaft 1 (Rathaus)					
1.1.1	Packmittelanlieferung	31.07.2026	31.07.2026	1	0%	
1.1.2	Verwaltungs-/Büroumzug	02.09.2026	15.09.2026	10	0%	
1.1.3	Umzugsnacharbeiten	24.09.2026	28.09.2026	3	0%	
1.1.4	Abnahme der Umzugsleistungen	09.09.2026	15.09.2026	5	0%	
1.1.5	Packmittelabholung	16.10.2026	16.10.2026	1	0%	
	Pos. 1.2: Umzugsdurchführung Bestandsliegenschaft 2 (Baudezernat)					
1.2.1	Packmittelanlieferung	14.08.2026	14.08.2026	1	0%	
1.2.2	Verwaltungs-/Büroumzug	16.09.2026	22.09.2026	5	0%	
1.2.3	Umzugsnacharbeiten	24.09.2026	28.09.2026	3	0%	
1.2.4	Abnahme der Umzugsleistungen	18.09.2026	22.09.2026	3	0%	
1.2.5	Packmittelabholung	23.10.2026	23.10.2026	1	0%	
	Pos. 1.3: Umzugsdurchführung Bestandsliegenschaft 3 (Kirchplatz 3)					
1.3.1	Packmittelanlieferung	21.08.2026	21.08.2026	1	0%	
1.3.2	Verwaltungs-/Büroumzug	23.09.2026	23.09.2026	1	0%	
1.3.3	Umzugsnacharbeiten	24.09.2026	28.09.2026	3	0%	
1.3.4	Abnahme der Umzugsleistungen	23.09.2026	23.09.2026	1	0%	
1.3.5	Packmittelabholung	23.10.2026	23.10.2026	1	0%	
	Pos. 1.4: Umzugsdurchführung Bestandsliegenschaft 4 (Görlitzer Str. 1)					
1.4.1	Packmittelanlieferung	21.08.2026	21.08.2026	1	0%	
1.4.2	Verwaltungs-/Büroumzug	23.09.2026	23.09.2026	1	0%	
1.4.3	Umzugsnacharbeiten	24.09.2026	28.09.2026	3	0%	
1.4.4	Abnahme der Umzugsleistungen	23.09.2026	23.09.2026	1	0%	
1.4.5	Packmittelabholung	23.10.2026	23.10.2026	1	0%	
	Pos. 2: Deinstallation und Transport der IT					
2.1	Deinstallation und Transport der IT-Komponenten aus Bestandsliegenschaft 1 (Rathaus)	02.09.2026	15.09.2026	10	0%	
2.2	Deinstallation und Transport der IT-Komponenten aus Bestandsliegenschaft 2 (Baudezernat)	16.09.2026	22.09.2026	5	0%	
2.3	Deinstallation und Transport der IT-Komponenten aus Bestandsliegenschaft 3 (Kirchplatz 3)	23.09.2026	23.09.2026	1	0%	
2.4	Deinstallation und Transport der IT-Komponenten aus Bestandsliegenschaft 4 (Görlitzer Str. 1)	23.09.2026	23.09.2026	1	0%	
	Pos. 3: Entsorgungsleistungen und besenreine Übergabe der Ausgangsgebäudeflächen					
	Pos. 3.1: Entsorgungsleistungen und besenreine Übergabe der Ausgangsgebäudeflächen Bestandsliegenschaft 1 (Rathaus)					
3.1.1	Entsorgungsarbeiten	09.11.2026	11.11.2026	3	0%	
3.1.2	Besenreine Übergabe der Ausgangsliegenschaften	09.11.2026	11.11.2026	3	0%	
	Pos. 3.2: Entsorgungsleistungen und besenreine Übergabe der Ausgangsgebäudeflächen Bestandsliegenschaft 2 (Baudezernat)					
3.2.1	Entsorgungsarbeiten	12.11.2026	13.11.2026	2	0%	
3.2.2	Besenreine Übergabe der Ausgangsliegenschaften	12.11.2026	13.11.2026	2	0%	
	Pos. 3.3: Entsorgungsleistungen und besenreine Übergabe der Ausgangsgebäudeflächen Bestandsliegenschaft 3 (Kirchplatz 3)					
3.3.1	Entsorgungsarbeiten	06.11.2026	06.11.2026	1	0%	
3.3.2	Besenreine Übergabe der Ausgangsliegenschaften	06.11.2026	06.11.2026	1	0%	
	Pos. 3.4: Entsorgungsleistungen und besenreine Übergabe der Ausgangsgebäudeflächen Bestandsliegenschaft 4 (Görlitzer Str. 1)					
3.4.1	Entsorgungsarbeiten	06.11.2026	06.11.2026	1	0%	
3.4.2	Besenreine Übergabe der Ausgangsliegenschaften	06.11.2026	06.11.2026	1	0%
