Projektnummer: 23-001

Bauzeitenplan

Erweiterung FRZ Meschede

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	Rückbau Bestands-Außenanlagen	20at	Do, 23.07.26	Mi, 19.08.26
2	Achtung Rückbau Hydrant			
3	Erdarbeiten	20at	Mi, 19.08.26	Di, 15.09.26
4	EntwässerungKanalarbeiten	10at	Di, 08.09.26	Mo, 21.09.26
5	Baustelleneinrichtung	5at	Di, 08.09.26	Mo, 14.09.26
6	Betonarbeiten	10at	Di, 15.09.26	Mo, 28.09.26
7	Betonkernaktivierung	6at	Di, 29.09.26	Di, 06.10.26
8	Betonarbeiten	15at	Mi, 07.10.26	Di, 27.10.26
9	Stahlbetonfertigteile	5at	Mi, 25.11.26	Di, 01.12.26
10	Stahlbauarbeiten	20at	Mi, 28.10.26	Di, 24.11.26
11	Fangnetze	2at	Mi, 25.11.26	Do, 26.11.26
12	Dach-Trapezbleche	5at	Fr, 27.11.26	Do, 03.12.26
13	Fassadenverkleidung	15at	Do, 03.12.26	Mi, 23.12.26
14	RWA-Anlagen/Lichtkuppeln/Shed	5at	Mi, 02.12.26	Di, 08.12.26
15	Dachabdichtung	20at	Mi, 09.12.26	Do, 07.01.27
16	Tore	2at	Mo, 04.01.27	Di, 05.01.27
17	Metallbauarbeiten	10at	Fr, 08.01.27	Do, 21.01.27

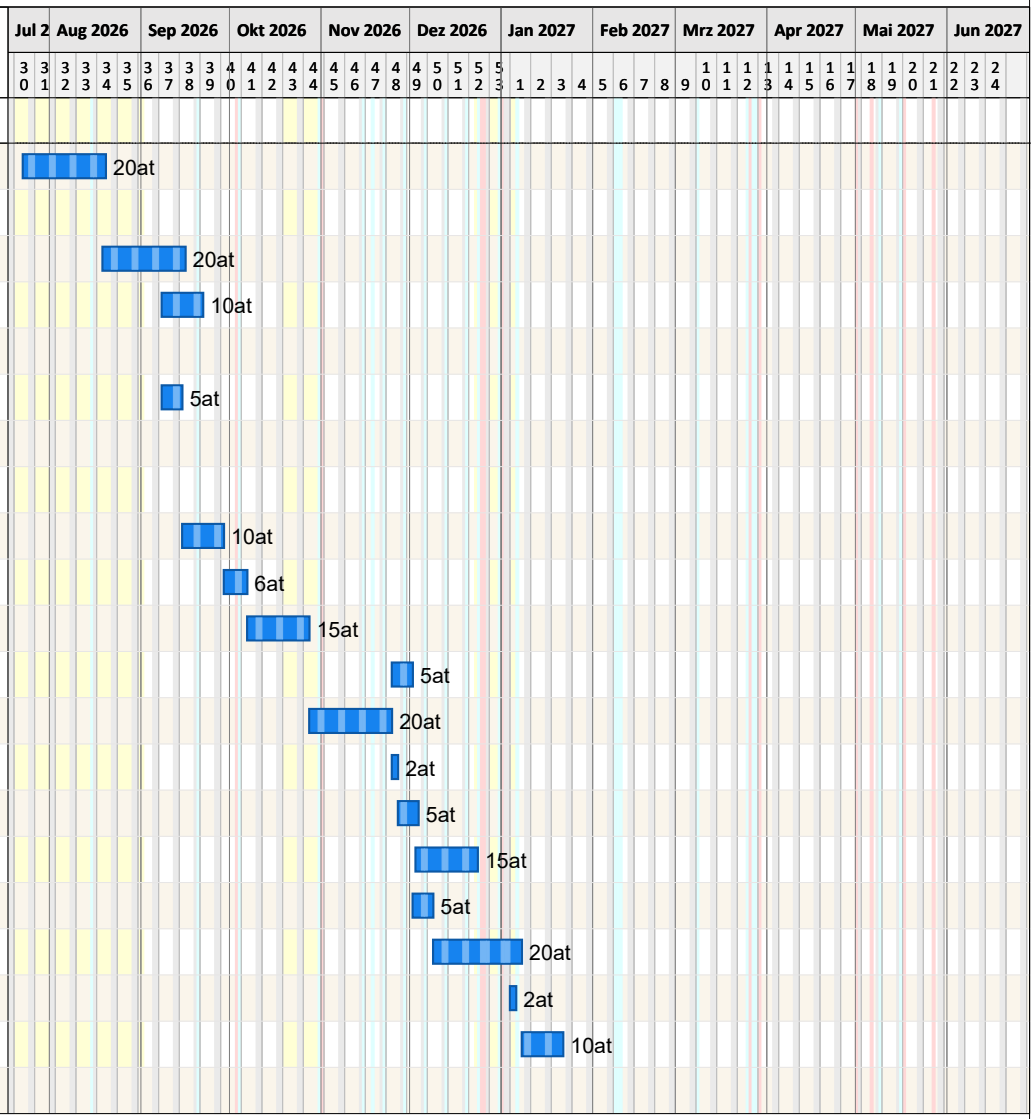

Projektzeitrahmen von Mi, 01.07.26 bis Mo, 15.10.29
Kalender: Nordrhein-Westfalen (eingebettet)
Druckdatum: 13.05.2026 15:03
Filter:
Bearbeiter: U.Huckschlag

DERWALD
DER DENKT. DER PLANT. DER LEISTET.

erstellt mit pro-Plan 2025 (pro-Plan 2025) Serien Nr.: PPL25-C8B4FE4FFD14 Lizenz für Derwald GmbH & Co. KG Bauunternehmen, Dortmund

Projektnummer: 23-001

Bauzeitenplan

Erweiterung FRZ Meschede

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
18	Rüttelboden	15at	Fr, 22.01.27	Do, 11.02.27
19	Trocknung Boden/ Puffer	13at	Fr, 12.02.27	Di, 02.03.27
20	Heizung			
21	Sanitär			
22	Grob Druckluftanlage	3at	Mi, 03.03.27	Fr, 05.03.27
23	Fein Druckluftanlage	2at	Di, 30.03.27	Mi, 31.03.27
24	Heizung			
25	Roh Heizung	4at	Mi, 03.03.27	Mo, 08.03.27
26	Fein Heizung	2at	Di, 30.03.27	Mi, 31.03.27
27	Lüftung			
28	Rohmontage Absauganlage	5at	Mi, 03.03.27	Di, 09.03.27
29	Fein/Inbetriebnahme	2at	Di, 30.03.27	Mi, 31.03.27
30	Elektro	15at	Fr, 05.03.27	Do, 25.03.27
31	Blitzschutz			
32	Außenanlagen	30at	Di, 06.04.27	Mi, 19.05.27
33	Endreinigung	3at	Do, 20.05.27	Mo, 24.05.27
34	Mängelbeseitigung	15at	Di, 25.05.27	Di, 15.06.27
35	Übergabe	1at	Di, 22.06.27	Di, 22.06.27

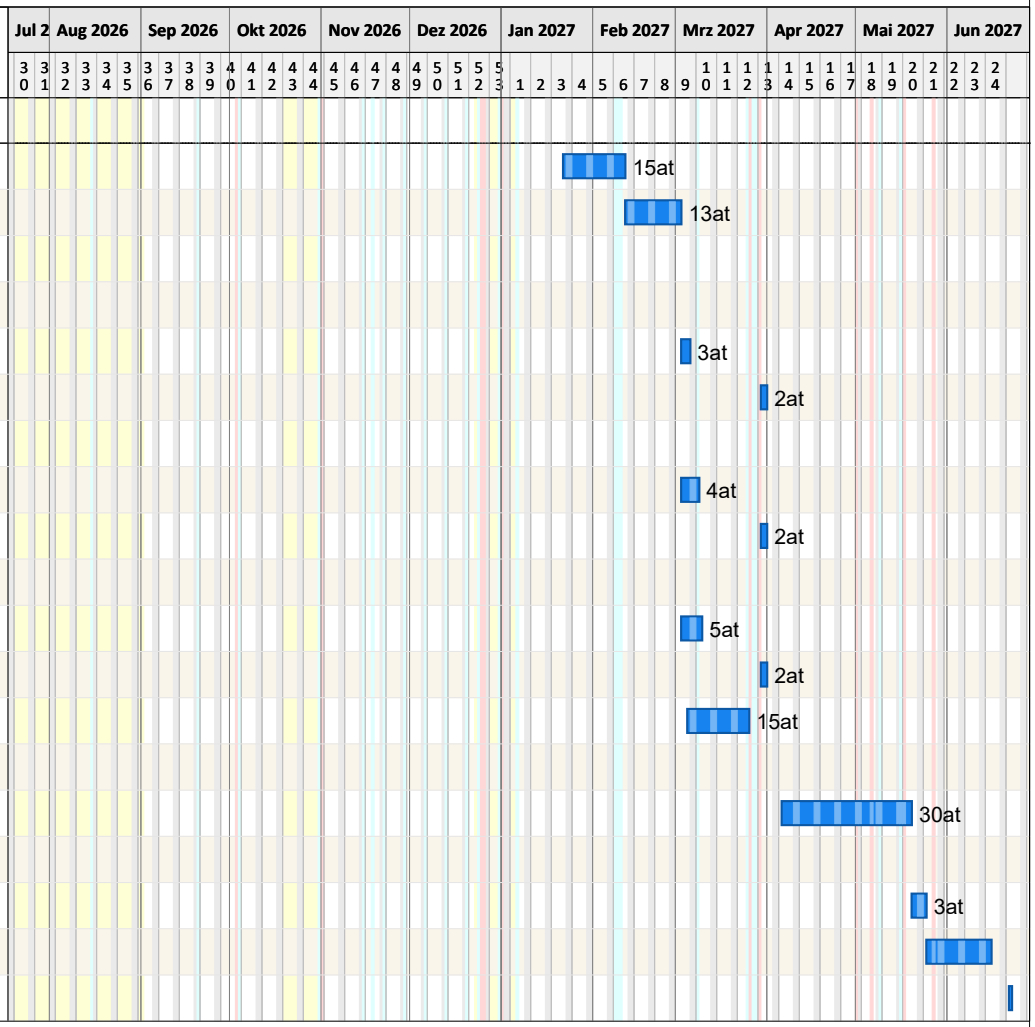

Projektzeitrahmen von Mi, 01.07.26 bis Mo, 15.10.29
Kalender: Nordrhein-Westfalen (eingebettet)
Druckdatum: 13.05.2026 15:03
Filter:
Bearbeiter: U.Huckschlag

DERWALD
DER DENKT. DER PLANT. DER LEISTET.

erstellt mit pro-Plan 2025 (pro-Plan 2025) Serien Nr.: PPL25-C8B4FE4FFD14 Lizenz für Derwald GmbH & Co. KG Bauunternehmen, Dortmund
